

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
МОНТАЖНИК
ОБЪЕДИНЕНИЕ


АО «ВМЗ»

Трубопрокатный цех



Фундаменты оборудования	3
Ситуационный план	4
График производства работ	5
Целевые задачи	6
Текущий статус реализации	7-11

ФУНДАМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

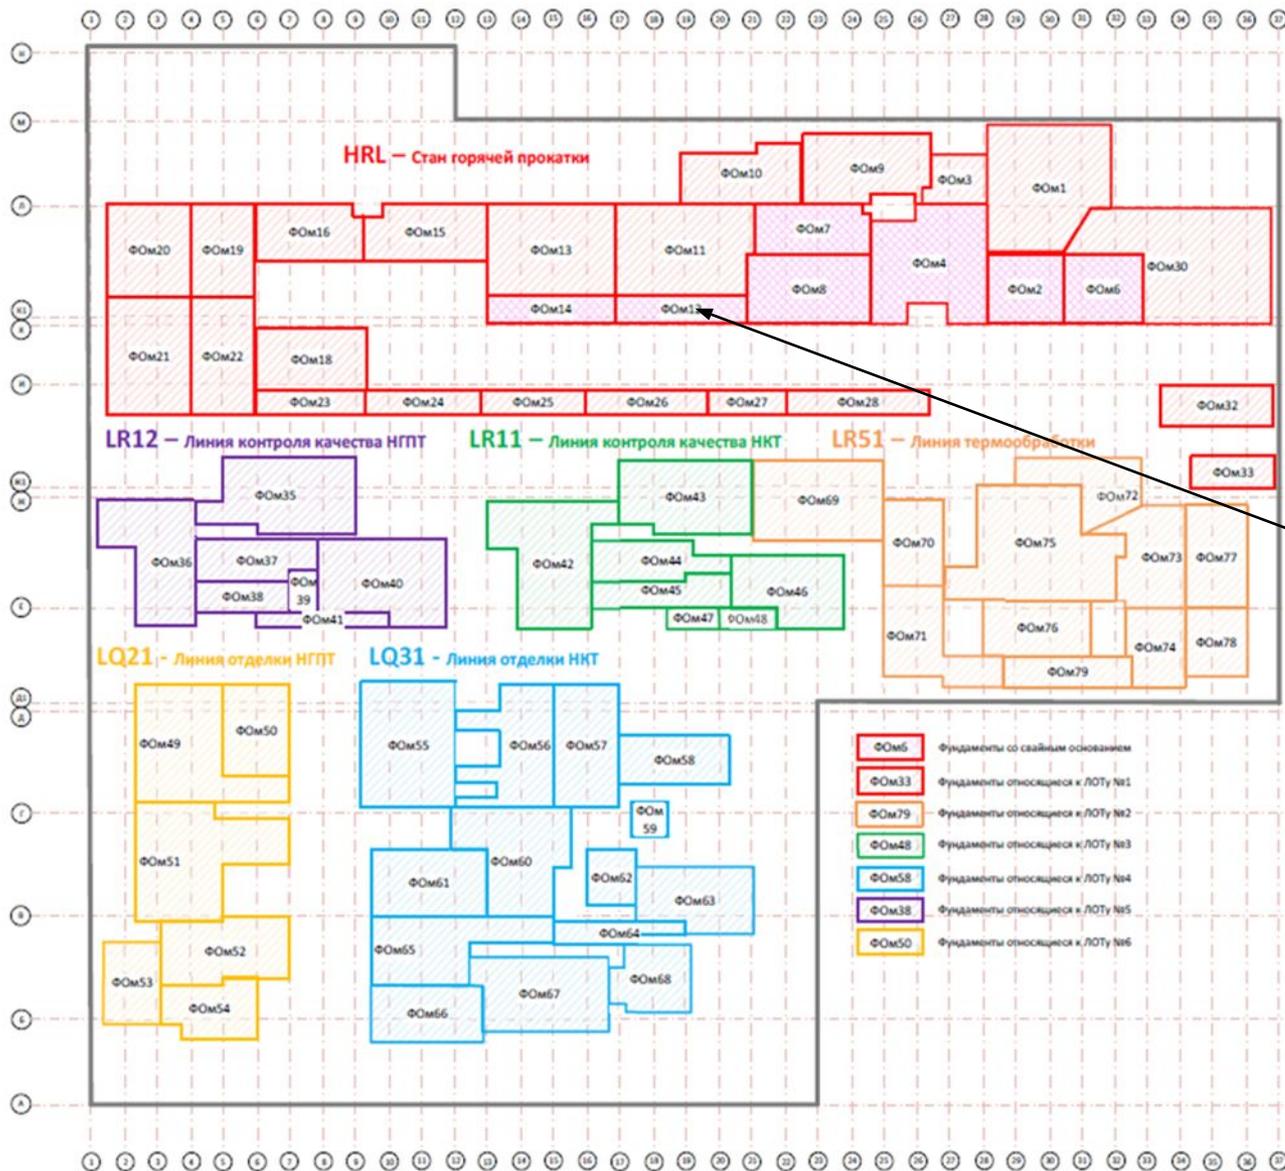

Фундаменты
оборудования ряд М-И
осях 1-37

График производства работ



Наименование работ	Ед. изм.	Срок, день	Фев.20			Март.20			Апрель.20			Май.20			Июнь.20			Июль.20		
			I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
М39929.01.01-КЖ34;39																				
Разработка грунта-42992	м куб.	180	3500			9000			7623			7623			7623			7623		
<i>экскаватор Hyundai ZX220 1,1 м3</i>	шт./смен у		1	1	1	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<i>самосвал Shacman 6*4</i>	шт./смен у		5	5	5	9	9		9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Погружение шпунта из трубы-3600	м/п.	180	2300			1300			0			0			0			0		
<i>Механизмы для погружения</i>	шт./смен у		1	1	1	2	2		2											
<i>Газорезчики для заготовки трубы</i>	чел/смен у		4	4	4	4	4		4											
Устройство геомембраны-47940	м.кв	180				7990			7990			7990			7990			7990		
<i>бетонщики</i>	чел/смен у					2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Замещение грунта (обратная засыпка)-41098	м куб.	180				6849			6849			6849			6849			6849		
<i>бетонщики</i>	чел/смен у					4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<i>самосвал Shacman 6*4</i>	шт./смен у					6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Этап-А М39929.01.01-КЖ15;16																				
Бетонирование фундаментов ФОМ15;16-1700	м куб.	90	225			1000			700											
<i>бетонщики</i>	чел/смен у		66	55	55	66	66		66	23	23	23	23	23	23	23	23			
<i>автобетоносмеситель на базе КАМАЗа 4М3, 5М3</i>	шт./смен у		1	1	1	3	3		3	1	1	1	1	1	1	1	1			
Этап-Б М39929.01.01-КЖ19;22;20;21																				
Бетонирование фундаментов ФОМ19;22;20;21-1757	м куб.	100				800			800			157								
<i>автобетоносмеситель на базе КАМАЗа 4М3, 5М3</i>	шт./смен у					2	2		2	2	2	2	1	1	1					
<i>бетонщики</i>	чел/смен у					46	46		46	46	46	46	20	20	20					
Этап-В М39929.01.01-КЖ1;2;3;4;6;7;8;9;10;30																				
Бетонирование фундаментов ФОМ1;2;3;4;6;7;8;9;10;30-30000	м куб.	300				400			2150			4150			5150			4200		
<i>автобетоносмеситель на базе КАМАЗа 4М3, 5М3</i>	шт./смен у					1	1		1	4	4	4	5	5	5	6	6	6	5	5
<i>бетонщики</i>	чел/смен у					30	30		30	143	143	143	270	270	270	340	340	340	250	250
Этап-Г М39929.01.01-КЖ24;25;26;27;28																				
Бетонирование фундаментов ФОМ24;25;26;27;28-30000	м куб.	300				300			300			400								


Целевые задачи

№	Задача	Исполнитель	Статус
1	Разработка грунта	Участок №5	Выполняется
2	Погружение шпунта из трубы	Участок №5	Выполняется
3	Армирование стен Фом 16	Участок №5	Выполняется
4	Бетонирование Фом 15	Участок №5	Выполняется


ТЕКУЩИЙ СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ

Текущий статус реализации (1/4)

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ В МАРТЕ БЕЗ НДС,
ТЫС. РУБ.

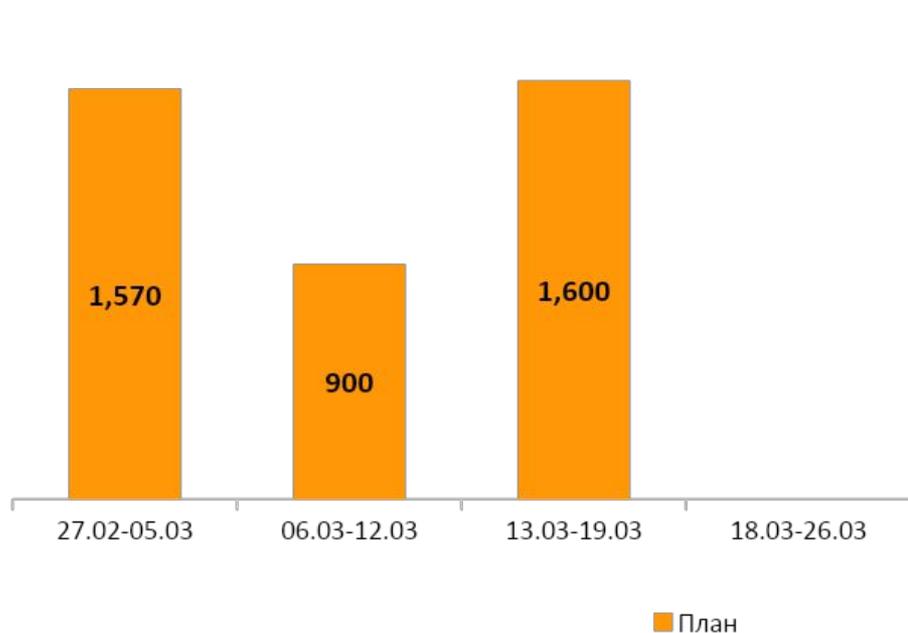

ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ В МАРТЕ, ЧЕЛ.

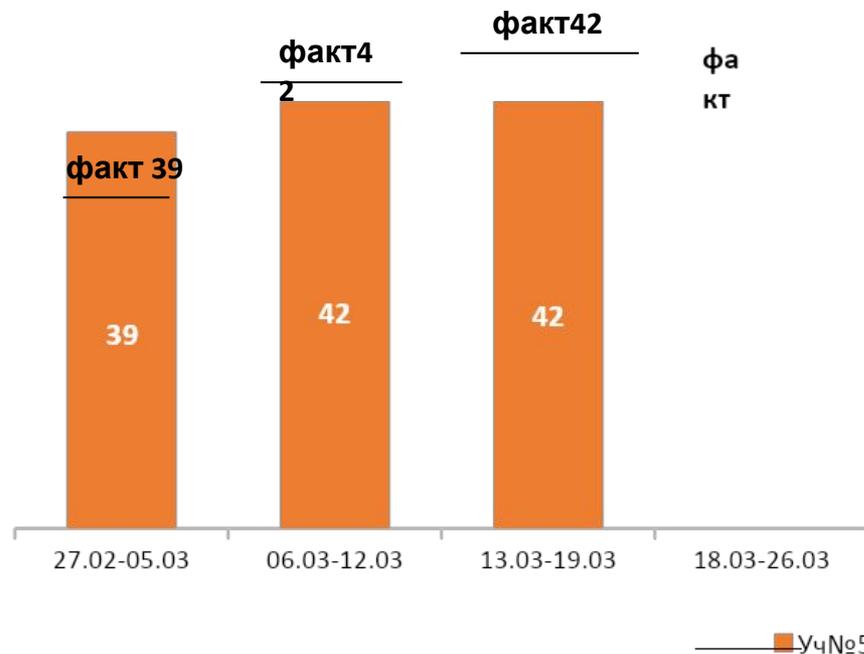


- В марте планируется выполнение работ в размере 12000 тыс. руб. без НДС, планируемое подписание – 6000 тыс. руб.

Текущий статус реализации (2/4)

Проблемы	Пути решения
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Поставка и монтаж вагон городка из г. Магнитогорска скомплектованной мебелью, аптечками, системой пожаротушения и т.д согласно требованиям АО «ВМЗ» 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Изготовить и организовать перевозку вагон-городка (Осталось 10 вагон-бытовок)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Обеспечить соблюдение и сроки требований в области ОТ и ТБ на площадке АО «ВМЗ» 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Установить ОПС. Укомплектовать Бытовки ИТР Офисной мебелью
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заключение договора <ul style="list-style-type: none"> – на аренду компрессора для рубки свай – Поставка песка на площадку ВМЗ – Контейнер 12 фут для склада – Общежитие АО «ВМЗ» 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заключение договора
<p>Отсутствует оборудование и материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Поставка арматуры на площадку согласно заявкам -- Поставка бетона на площадку от СТМ -- Оплата ИП Бобров-поставка воды -- Оплата ООО Ритм -- Оплата биотуалетов и их очистку (обещают увезти за неоплату) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Своевременно оплатить указанные счета, т.к. происходит увеличение накладных расходов
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Согласование и привлечение субподрядной(ых) организаций для работы на площадке АО «ВМЗ» 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заключение договора с подрядными организациями
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Задержки платежей по командировочным расходам 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Своевременно оплатить текущие платежи
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Подписание дополнительного соглашения к рамочному договору для подписания выполнения Марта и получения технического аванса 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Согласование цен отделом снабжения и объемов техническим отделом АО «ПО Монтажник»
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Монтаж трубных блоков на Фом 19,20 с 19.03.20 ▪ Поставка закладных на площадку на ФОМ16 согласно проекта ▪ Рассмотреть возможность поставки закладных деталей местными изготовителями 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Скомплектовать и поставить материал на строительную площадку. А так же обеспечить присутствие ИТР от электромонтажного управления. ▪ Рассмотреть предложение об изготовлении и поставке закладных деталей



Армирование стен
ФОМ16

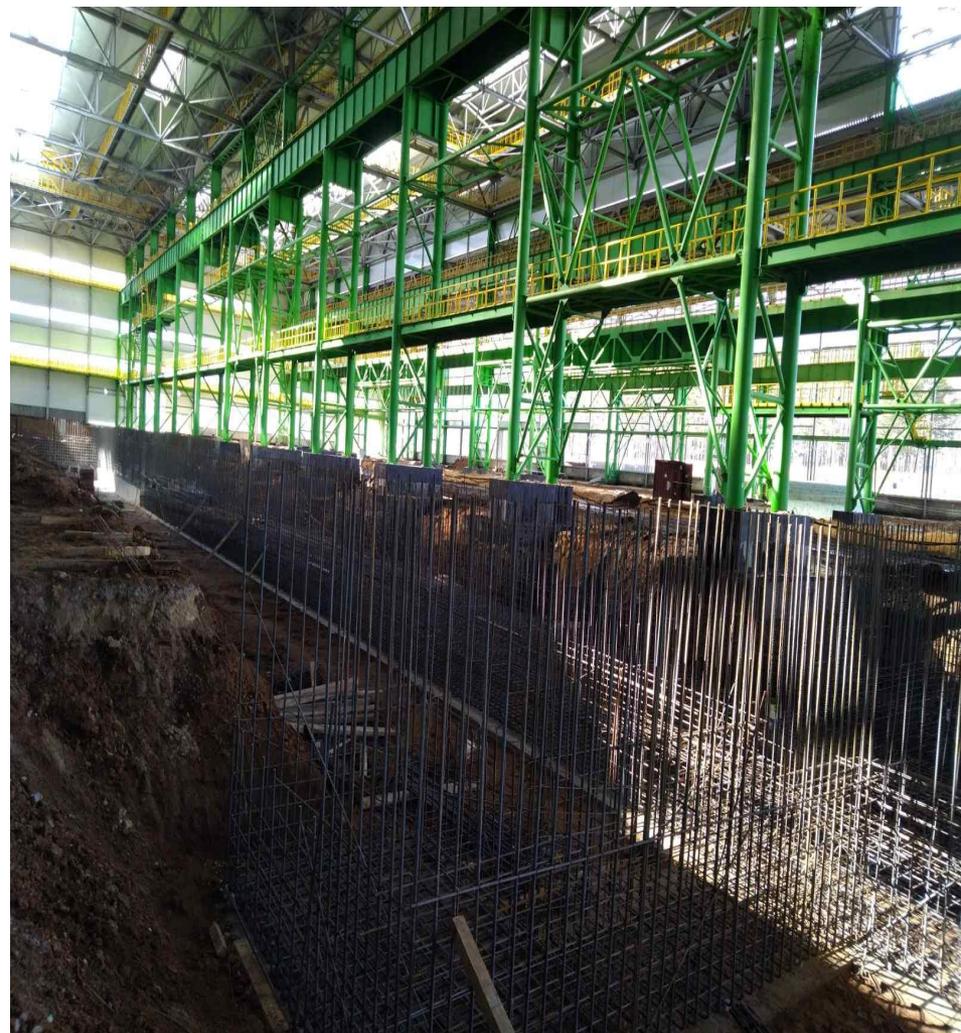

Армирование
ФОМ15



Разработка
грунта



**Организация
городка**
