


Генеральный подрядчик: ОАО «Азеркорпу»

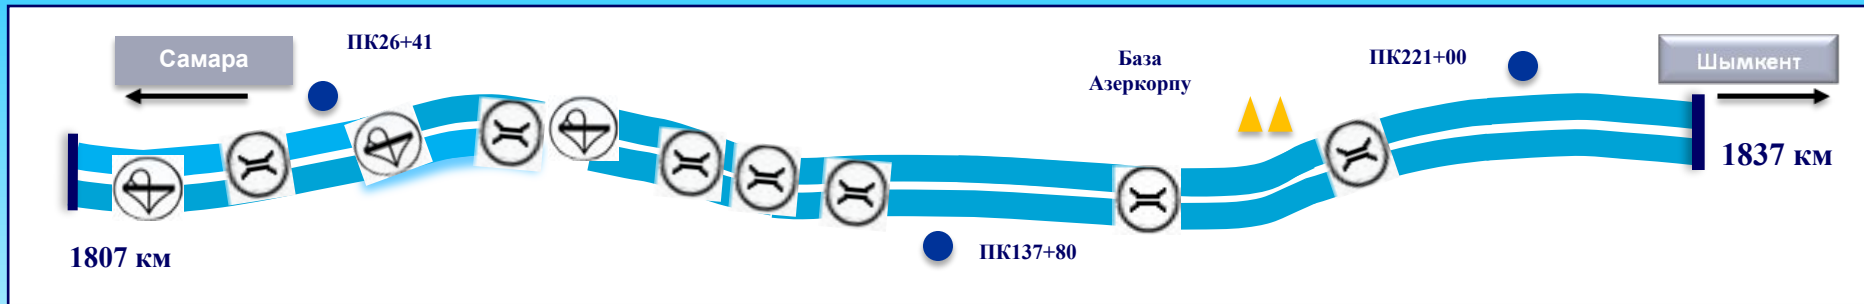

Основные показатели

Наименование	Показатели
Стоимость контракта	8 722 млн. тенге
Протяженность дороги	28,4 км
План на текущий год из а/б	18,6 км
Срок сдачи объекта	Август 2013г.
Мобилизовано дорожно-строительной техники	215 ед.
Мобилизация персонала	1161 чел.

График производства работ

Наименование работ	Ед. изм.	План по проекту	Выполнено до 2012г.	План на 2012 г.
Покрытие из ЩМА	км	28,4	0	2
Покрытие из а/б	км	28,4	0	18,6
Основание из а/б	км	28,4	2,2	16,7
Основание из ЩПС	км	28,4	7,0	15,0
Подстилающий слой	км	28,4	7,3	14,5
Земляные работы	млн. м ³	3,7	1,07	2,0
Водопропускные трубы	шт.	14	2	12
Мосты и путепроводы	шт.	11	0,5	10,5

Заготовка материалов	Ед.изм.	План на 2012г.	Факт. на текущ.дату	%
Щебень	тыс.м ³	228	104,6	46
ПГС	тыс.м ³	75	27,9	37
