

Информация о проделанной работе по Жамбылской области

Работы ведутся на 263 км

По 217 км подрядчики будут определены в октябре т.г.



АО «К-Дорстрой» км 536-593 (58 км) ИБР	км 483-536 (60 км) ИБР, II-транш (октябрь)	СП «КСС/ Жамбылжол курьлыс» км 443-483 (40 км) АБР	ТОО «Казхдорстрой» км 404-443 (41 км) АБР	км 383-404 (20 км) АБР, III-транш (октябрь)	ТОО «Казхдор- строй» км 358-389 (31 км) АБР, II-транш	Компания КСС км 310-358 (48 км) АБР, II-транш	км 261-310 (45 км) ИБР, II-транш (октябрь)	км 162-260 (76 км) АБР, III-транш (октябрь)
--	--	---	---	---	--	---	--	---

Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	480 км
I - техническая категория (ц/б)	283 км
II - техническая категория (а/б)	197 км
План на текущий год (в одном направлении)	85 км
Количество мостов	12 шт.
Количество обходов населенных пунктов	9 шт.

Мобилизация техники

Наименование работ	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Землеройная техника	203	221	109 %
Укладочная техника	89	89	100 %
Автотранспорт	533	532	100 %
ЦБЗ; АБЗ	2	2	100 %
ДСУ	8	8	100 %
Прочая техника	232	232	100 %
Итого	1 067	1 084	100 %

Мобилизация персонала

Наименование работ	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Всего в т.ч.	чел.	4 240	4 257	100 %
иностраннный персонал	чел.	27	27	
персонал из регионов Казахстана	чел.	-	1 904	
местный персонал	чел.	-	2 326	

График производства работ на 2010 год (одно направление)

Наименование работ	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Земляные работы	тыс.м³	1 722	1 801	104 %
Основание	км	14,9	14,9	100 %
Мосты и путепроводы	шт.	0,8	0,8	100 %
Водопрпускные трубы	шт.	31	32	103%
Заготовка материалов				
Щебень	тыс.м³	134,2	134,7	100 %
ПГС	тыс.тн	418	538,4	129 %

Реконструкция участка коридора Западная Европа-Западный Китай

Генеральный подрядчик: АО «К - Дорстрой»



Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	58 км
I Б - техническая категория (ц/б)	44 км
II - техническая категория (а/б)	14 км
План на текущий год (ц/б в одном направлении)	30 км
Количество мостов	3 шт.
Количество обходов населенных пунктов	2 шт.

Мобилизация техники

Наименование работ	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Землеройная техника	66	69	100 %
Укладочная техника	24	32	100 %
Автотранспорт	160	172	100 %
ДСЗ 70-100 тн/час	3	3	100 %
Прочие	73	99	100 %
Итого	326	375	100 %


Мобилизация персонала

Наименование	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Всего в т.ч.	чел.	1 130	1 135	100 %
иностраннный персонал	чел.	4	4	
персонал из регионов Казахстана	чел.		509	
местный персонал	чел.		622	

График производства работ на 2010 год (одно направление)

Наименование работ	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Земляные работы	тыс.м ³	615	658	107 %
Мосты и путепроводы	шт.	0,1	0,1	100 %
Водопропускные трубы	шт.	6	6	100 %
Заготовка материалов				
Щебень	тыс.м ³	83,6	83,8	100 №
ПГС	тыс.тн	221	283,5	128 %
Ж/б изделия	тыс.м ³	6,3	6,5	103 %

Реконструкция участка коридора Западная Европа-Западный Китай Генеральный подрядчик: ТОО «Ақмола Қурылыс Материалдары»

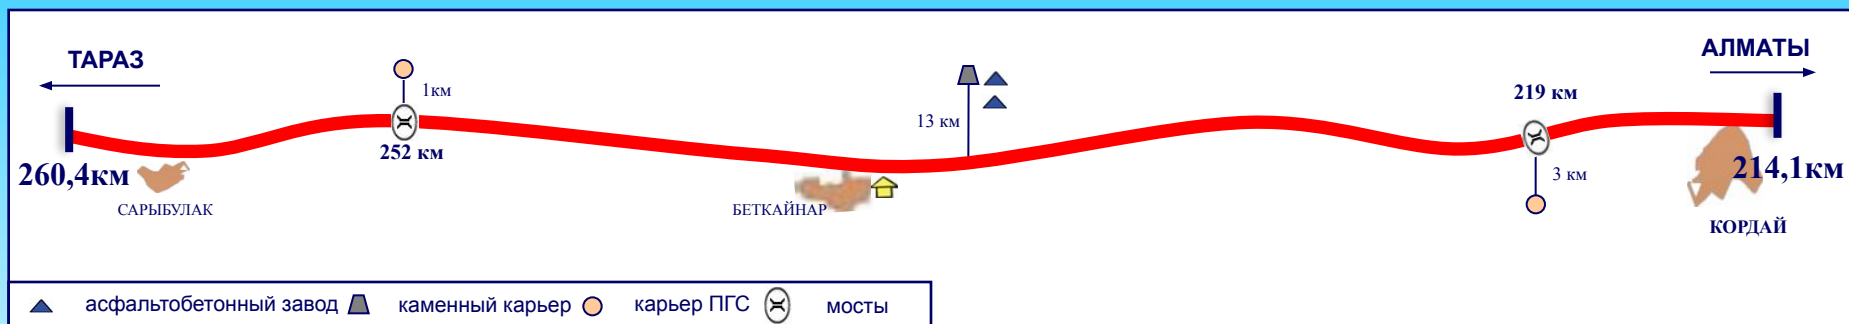

Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	45,3 км
II - техническая категория (а/б)	45,3 км
План на текущий год (а/б в одном направлении)	15 км
Количество мостов	2 шт.

Мобилизация техники

Наименование работ	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Землеройная техника	27	27	100 %
Укладочная техника	11	13	100 %
Автотранспорт	47	46	98 %
АБЗ 120-160 тн/час	1	1	100 %
ДСУ 70-100 тн/час	2	2	100 %
Прочие	29	34	100 %
Итого	117	123	100 %

Мобилизация персонала

Наименование	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Всего в т.ч.	чел.	608	611	100 %
персонал из регионов Казахстана	чел.		275	
местный персонал	чел.		336	

График производства работ на 2010 год (одно направление)

Наименование работ	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Земляные работы	тыс.м ³	26,3	27,7	105 %
Основание	км	9,1	9,1	100 %
Водопропускные трубы	шт.	10	10	100 %
Заготовка материалов				
Щебень	тыс.м ³	23,5	23,8	101 %
ПГС	тыс.тн	35,9	45,6	127%

Реконструкция участка коридора Западная Европа-Западный Китай Генеральный подрядчик: ТОО «Казахдорстрой»



Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	40,7 км
I Б - техническая категория (ц/б)	40,7 км
План на текущий год (в одном направлении)	23 км
Количество мостов	4 шт.
Количество обходов населенных пунктов	2 шт.

Мобилизация техники

Наименование работ	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Землеройная техника	62	63	100 %
Укладочная техника	24	25	100 %
Автотранспорт	182	182	100 %
ЦБЗ 60-160 м ³ /час	1	1	100 %
ДСУ 70-100 тн/час	2	2	100 %
Прочие	56	58	100 %
Итого	327	331	100 %

Мобилизация персонала


Наименование	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Всего в т.ч.	чел.	1 670	1 675	100 %
иностраннный персонал	чел.	6	6	
персонал из регионов Казахстана	чел.		751	
местный персонал	чел.		918	

График производства работ на 2010 год

(одно направление)

Наименование работ	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Земляные работы	тыс. м ³	709	780	110 %
Основание	км	5,8	5,8	100 %
Мосты и путепроводы	шт.	0,5	0,5	100 %
Водопропускные трубы	шт.	10	11	113 %
Заготовка материалов:				
Щебень	тыс. м ³	16,1	16,1	100 %
ПГС	тыс. тн	149	194	130 %
Ж/б изделия	тыс. м ³	1,07	1,1	103 %

**Реконструкция участка коридора Западная Европа-Западный Китай
Генеральный подрядчик: ТОО «KCC E&C/Zhambyl Zhol Kurylys»**

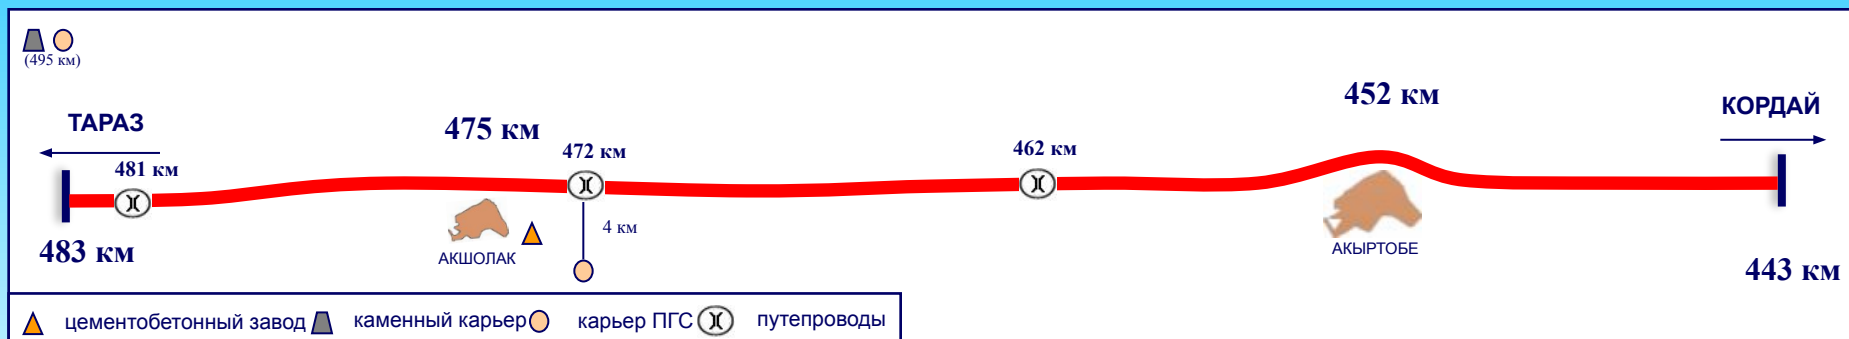

Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	40,4 км
I Б - техническая категория (ц/б)	40,4 км
План на текущий год (ц/б в одном направлении)	17 км
Количество мостов	3 шт.

Мобилизация персонала

Наименование	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Всего в т.ч.	чел.	832	836	100 %
иностраннный персонал	чел.	17	17	
персонал из регионов Казахстана	чел.		369	
местный персонал	чел.		450	

График производства работ на 2010 год (одно направление)

График мобилизации техники на 2010 год

Наименование работ	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Землеройная техника	60	62	100 %
Укладочная техника	19	18	95 %
Автосамосвалы	132	132	100 %
ДСУ 200 тн/час	1	1	100 %
Прочая техника	42	42	100 %
Итого	254	255	100 %

Наименование работ	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Земляные работы	тыс. м ³	372	335	90 %
Мосты и путепроводы	шт.	0,2	0,2	100 %
Водопропускные трубы	шт.	5	5	100 %
Заготовка материалов				
Щебень	тыс. м ³	11	11	100 %
ПГС	тыс. тн	12,1	15,3	126 %
Ж/б изделия	тыс. м ³	0,8	0,8	100 %

Информация о проделанной работе по Кызылординской области



Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	787 км
I - техническая категория (а/б)	220 км
II - техническая категория (а/б)	567 км
План на текущий год (в одном направлении)	150 км
Количество мостов	32 шт.
Количество обходов населенных пунктов	9 шт.

Мобилизация техники

Наименование работ	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Землеройная техника	351	353	101 %
Укладочная техника	177	173	98 %
Автотранспорт	672	685	102 %
АБЗ	13	12	92 %
ДСУ	8	8	100 %
Прочая техника	475	465	98 %
Итого	1696	1696	100 %

Мобилизация персонала

Наименование работ	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Всего в т.ч.	чел.	8 472	8 472	100 %
иностраный персонал	чел.	200	200	
персонал из регионов Казахстана	чел.	-	3 722	
местный персонал	чел.	-	4 550	

График производства работ на 2010 год (одно направление)

Наименование работ	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Земляные работы	тыс.м³	2 762	2 804	102 %
Основание	км	36,2	36,6	100 %
Водопропускные трубы	шт.	12	12	100 %
Заготовка материалов				
Щебень	тыс.м³	717	720	100 %
ПГС	тыс.тн	923	925	100 %
ЖБИ	тыс.м³	9,8	9,8	100 %

Реконструкция участка коридора Западная Европа-Западный Китай

Генеральный подрядчик: АО «Салини Конструкторы С.п.А»



асфальтобетонный завод каменный карьер песчаный карьер

Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	410 км
II - техническая категория (а/б)	410 км
План на текущий год (а/б в одном направлении)	40 км
Количество мостов	11 шт.
Количество обходов населенных пунктов	2 шт.

Мобилизация техники

Наименование работ	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Землеройная техника	134	135	101 %
Укладочная техника	63	64	102 %
Автотранспорт	252	252	100 %
АБЗ	2	2	100 %
Прочие	206	206	100 %
Итого	657	659	100 %

Мобилизация персонала


Наименование	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Всего в т.ч.	чел.	2 804	2 804	100 %
иностраннный персонал	чел.	36	36	
персонал из регионов Казахстана	чел.		1 246	
местный персонал	чел.		1 522	

График производства работ на 2010 год (одно направление)

Наименование работ	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Земляные работы	тыс.м ³	734	757	103 %
Устройство основания	км	12,3	12,3	100 %
Водопропускные трубы	шт.	5	5	100 %
Заготовка материалов				
Щебень	тыс.м ³	182	182	100 %
ПГС	тыс.тн	158	168	106 %
ЖБИ	тыс.м ³	1,0	1,0	100 %

Реконструкция участка коридора Западная Европа-Западный Китай

Генеральный подрядчик: «AKKORD / OKAN»

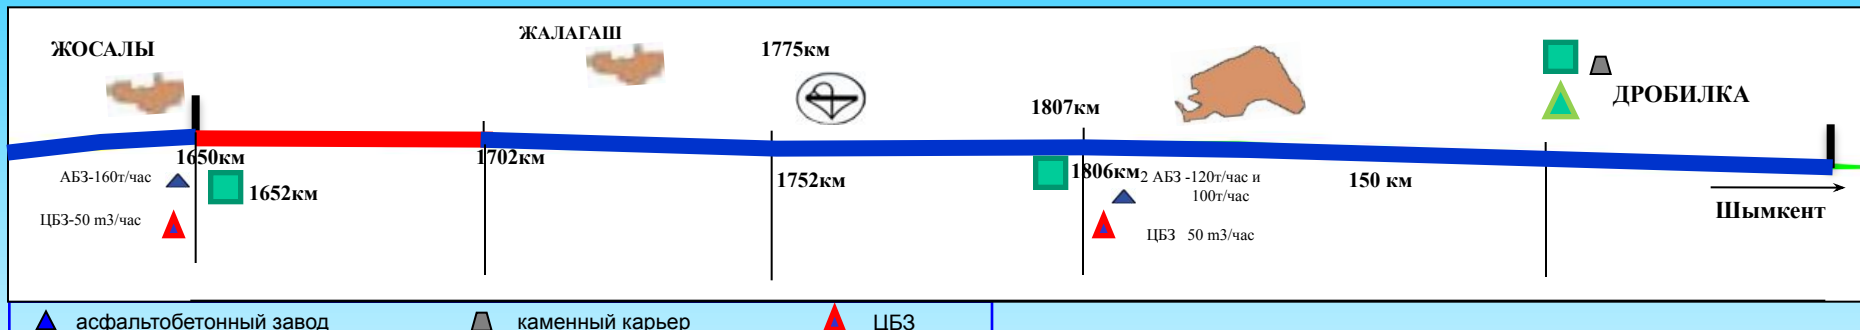

Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	107 км
I Б - техническая категория (а/б)	км
II - техническая категория (а/б)	107 км
План на текущий год (а/б в одном направлении)	5 км
Количество мостов	6 шт.
Количество обходов населенных пунктов	1 шт.

Мобилизация техники

Наименование работ	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Землеройная техника	58	46	79 %
Укладочная техника	35	26	74 %
Автотранспорт	126	101	87 %
АБЗ	2	1	50 %
Прочие	74	62	84 %
Итого	295	236	80 %

Мобилизация персонала


Наименование	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Всего в т.ч.	чел.	495	499	100 %
иностраннный персонал	чел.	59	59	
персонал из регионов Казахстана	чел.		198	
местный персонал	чел.		242	

График производства работ на 2010 год (одно направление)

Наименование работ	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Земляные работы	тыс.м ³	106	85	80 %
Заготовка материалов				
Щебень	тыс.м ³	25	17	68 %
ПГС	тыс.тн	53	38	72 %

Реконструкция участка коридора Западная Европа-Западный Китай

Генеральный подрядчик: АО «Импреза С.п.А»

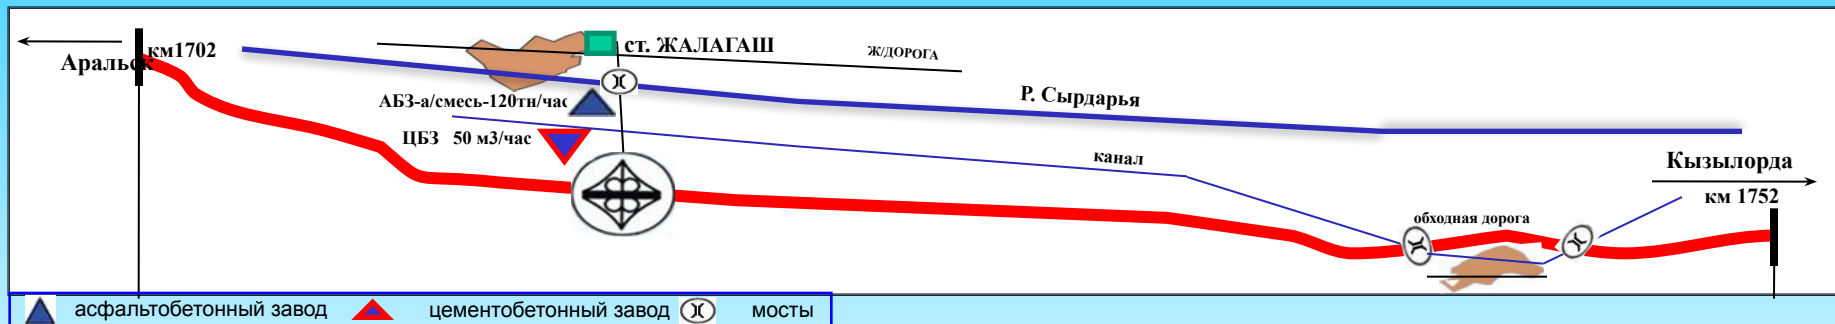

Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	50 км
II - техническая категория (а/б)	50 км
План на текущий год (а/б в одном направлении)	5 км
Количество мостов	3 шт.
Количество обходов населенных пунктов	1 шт.

Мобилизация техники

Наименование работ	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Землеройная техника	43	39	90 %
Укладочная техника	18	17	94 %
Автотранспорт	94	92	98 %
Прочие	52	47	90 %
Итого	207	195	94 %

Мобилизация персонала


Наименование	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Всего в т.ч.	чел.	1 467	1 467	100 %
иностраный персонал	чел.	12	12	
персонал из регионов Казахстана	чел.		654	
местный персонал	чел.		801	

График производства работ на 2010 год (одно направление)

Наименование работ	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Земляные работы	тыс.м ³	22	20	91%
Заготовка материалов				
Щебень	тыс.м ³	10	9	90 %
ПГС	тыс.тн	42	39	93 %
ЖБИ	тыс.м ³	0,3	0,3	100 %

Реконструкция участка коридора Западная Европа-Западный Китай

Генеральный подрядчик: АО «Тодини Кострукциони Дженерали С.п.А.»

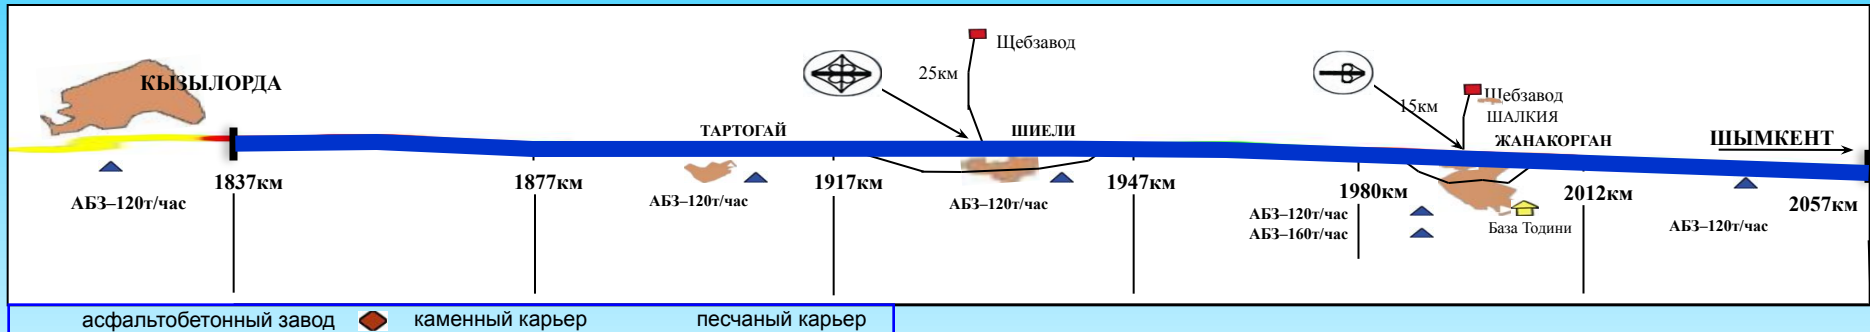

Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	220 км
I Б - техническая категория (а/б)	220 км
План на текущий год (а/б в одном направлении)	100 км
Количество мостов	12 шт.
Количество обходов населенных пунктов	2 шт.

Мобилизация техники

Наименование работ	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Землеройная техника	116	133	115 %
Укладочная техника	61	66	108 %
Автотранспорт	200	240	120 %
АБЗ	9	9	100 %
ДСУ	8	8	100%
Прочие	143	150	105 %
Итого	537	606	113 %


Мобилизация персонала

Наименование	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Всего в т.ч.	чел.	3 702	3 702	100 %
иностраный персонал	чел.	93	93	
персонал из регионов Казахстана	чел.		1 624	
местный персонал	чел.		1 985	

График производства работ на 2010 год (одно направление)

Наименование работ	Ед. изм.	План на 20.06 т.г.	Факт на 20.06 т.г.	от плана на 20.06 т.г.
Земляные работы	тыс.м ³	1 900	1 942	102 %
Устройство основания	км	24,3	24,3	100%
Водопропускные трубы	шт.	7	7	100 %
Заготовка материалов				
Щебень	тыс.м ³	500	512	102 %
ПГС	тыс.тн	670	680	101 %
Ж/б изделия	тыс.м ³	8,5	8,5	100 %

Информация о проделанной работе по Актюбинской области

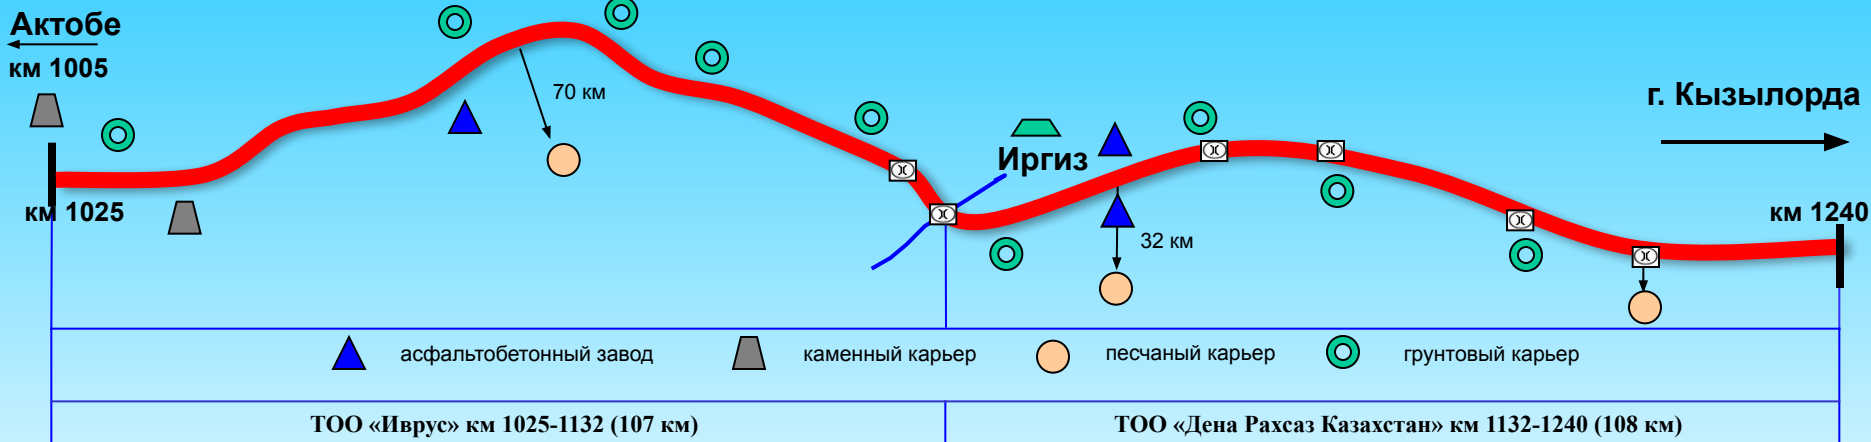

Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	215 км
II - техническая категория	215 км
План на текущий год	102 км
Количество мостов	6 шт.

Мобилизация техники

Наименование работ	План на 23.06 т.г.	Факт на 23.06 т.г.	от плана на 23.06 т.г.
Землеройная техника	71	115	100 %
Укладочная техника	7	8	100 %
Автотранспорт	189	266	100 %
АБЗ 120-160 тн/час	3	3	100 %
ДСУ 70-100 тн/час	5	5	100 %
Прочая техника	55	88	100 %
Итого	330	485	100 %

Мобилизация персонала


Наименование работ	Ед. изм.	План на 23.06 т.г.	Факт на 23.06 т.г.	от плана на 23.06 т.г.
Всего в т.ч.	чел.	1800	1800	100 %
иностраннный персонал	чел.	-	58	
персонал из регионов Казахстана	чел.	-	784	
местный персонал	чел.		958	

График производства работ на 2010 год

Наименование работ	Ед. изм.	План на 23.06 т.г.	Факт на 23.06 т.г.	от плана на 23.06 т.г.
Верхний слой а/б покрытия	км	70	67	96 %
Нижний слой а/б покрытия	км	44	38	86 %
Верхний слой основания из ч.щ.	км	58	35,7	62 %
Земляные работы	м³	568,8	396,1	70 %
Водопропускные трубы	шт.	15	13	87 %
Заготовка материалов				
Щебень	тыс.м³	608,4	499,1	82 %
ПГС	тыс.тн	462,1	295,6	64 %
Битум	тыс.тн	22	16,5	75 %
Ж/б изделия	тыс.м³	1,4	1,3	93 %

Реконструкция участка коридора Западная Европа-Западный Китай

Генеральный подрядчик: ТОО «Иврус»

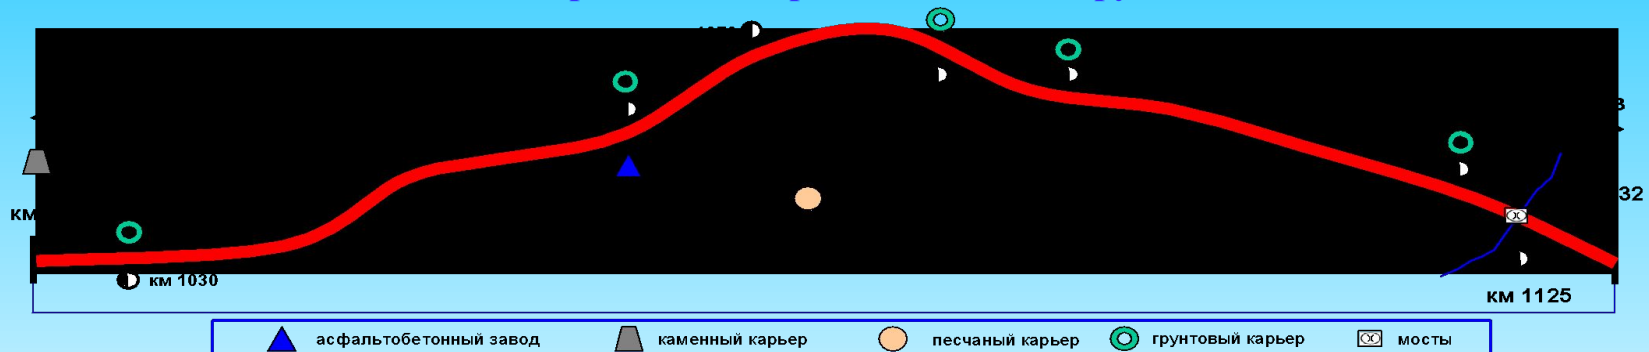

Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	107 км
II - техническая категория (а/б)	107 км
План на текущий год	54 км
Количество мостов	1 шт.

Мобилизация персонала

Наименование	Ед. изм.	План на 23.06 т.г.	Факт на 23.06 т.г.	от плана на 23.06 т.г.
Всего в т.ч.	чел.	897	897	100 %
персонал из регионов Казахстана	чел.		404	
местный персонал	чел.		493	


Мобилизация техники

Наименование работ	План на 23.06 т.г.	Факт на 23.06 т.г.	от плана на 23.06 т.г.
Землеройная техника	35	48	100 %
Укладочная техника	2	2	100 %
Автотранспорт	60	120	100 %
АБЗ 120-160 тн/час	1	1	100 %
ДСУ 70-100 тн/час	2	2	100 %
Прочие	15	37	100 %
Итого	115	210	100 %

График производства работ на 2010 год

Наименование работ	Ед. изм.	План на 23.06 т.г.	Факт на 23.06 т.г.	от плана на 23.06 т.г.
Верхний слой а/б покрытия	км	25	25	100 %
Нижний слой а/б покрытия	км	27	27	100 %
Верхний слой основания из ч.щ.	км	39	25,7	66 %
Земляные работы	м ³	384,8	261,7	68 %
Водопропускные трубы	шт.	7	7	100 %
Заготовка материалов				
Щебень	тыс.м ³	271,8	260,3	96 %
ПГС	тыс.тн	92,8	82,3	89 %
Битум	тыс.тн	10	10	100 %
Ж/б изделия	тыс.м ³	0,8	0,8	100 %

Реконструкция участка коридора Западная Европа-Западный Китай Генеральный подрядчик: ТОО «Дена Рахсаз Казахстан»

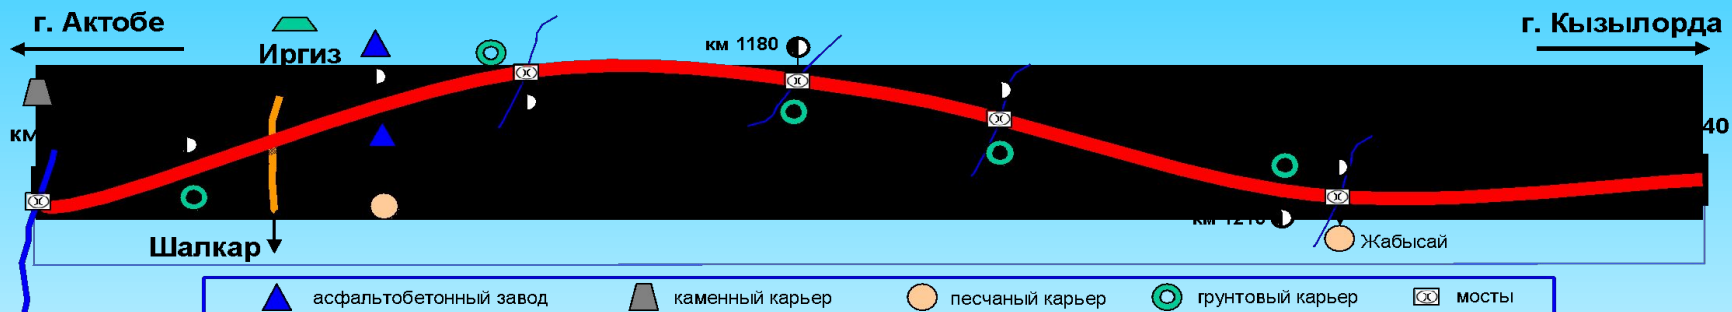

Основные показатели

Протяженность дороги в т.ч.	108 км
II - техническая категория (а/б)	108 км
План на текущий год	48 км
Количество мостов	5 шт.

Мобилизация техники

Наименование работ	План на 23.06 т.г.	Факт на 23.06 т.г.	от плана на 23.06 т.г.
Землеройная техника	36	67	100 %
Укладочная техника	5	6	100 %
Автотранспорт	129	146	100 %
АБЗ 120-160 тн/час	2	2	100 %
ДСУ 70-100 тн/час	3	3	100 %
Прочие	40	51	100 %
Итого	215	275	100 %

Мобилизация персонала

Наименование	Ед. изм.	План на 23.06 т.г.	Факт на 23.06 т.г.	от плана на 23.06 т.г.
Всего в т.ч.	чел.	903	903	100 %
иностранный персонал	чел.		58	
персонал из регионов Казахстана	чел.		380	
местный персонал				

График производства работ на 2010 год

Наименование работ	Ед. изм.	План на 23.06 т.г.	Факт на 23.06 т.г.	от плана на 23.06 т.г.
Верхний слой а/б покрытия	км	45	42	93 %
Нижний слой а/б покрытия	км	17	11	65 %
Верхний слой основания из ч/щ	км	19	10	53 %
Земляные работы	м³	184	134,4	73 %
Водопропускные трубы	шт.	8	6	75 %
Заготовка материалов				
Щебень	тыс.м³	336,6	238,8	71 %
ПГС	тыс.тн	369,3	213,3	588 %
Битум	тыс.тн	12	6,5	54 %
Ж/б изделия	тыс.м³	0,6	0,5	76 %
