

2021

2022

2023

*«Освоение месторождения  
с объектами инфраструктуры»*

**D33**

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРУ
  2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН / ГРАФИК РАБОТ
  3. ДОГОВОРНАЯ СТРАТЕГИЯ
  4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
  5. СТАТУС КОНТРАКТАЦИИ И ПОСТАВКИ
  6. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
  7. ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
  8. S-КРИВАЯ
  9. ВЫВОДЫ
-



# 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРУ

ПОДРЯДЧИК: АО «МРТС»  
 ДОГОВОР: № 21GO422 от 08.10.2021 г.  
 СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 23 315,69  
 (млн. РУБ., без НДС):  
 СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА: 08.10.2021 – 30.10.2023 гг.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА


### Показатели

### Кол-во

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Мультифазный трубопровод, Ø406,4 мм | 71 200 п.м. |
| Кабельная линия №1, 35 кВ           | 71 850 п.м. |
| Кабельная линия №2, 35 кВ           | 72 020 п.м. |

## ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА


| Наименование                          | План          | Прогноз       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Протаскивание трубопровода            | 09.05.2022 г. | 09.05.2022 г. |
| Гидравлические испытания трубопровода | 03.09.2022 г. | 03.09.2022 г. |
| Протаскивание КЛ1                     | 18.07.2022 г. | 18.07.2022 г. |
| Протаскивание КЛ2                     | 05.08.2022 г. | 05.08.2022 г. |
| Комплексные испытания КЛ              | 25.09.2023 г. | 25.09.2023 г. |

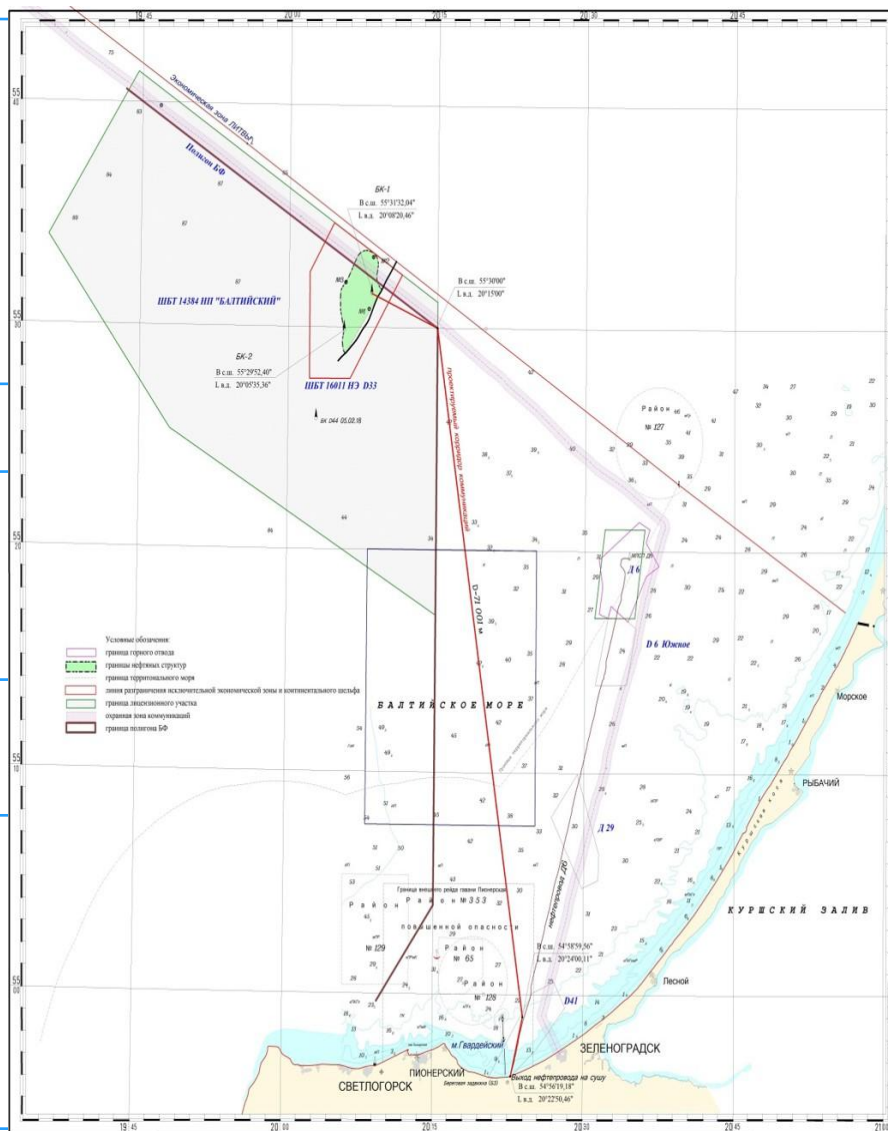

| № п/п | Наименование этапа   | Ед. изм. | Объемы работ | График производства работ |            |                   |         |  |  |         |  |       |       |
|-------|--|----------|--------------|---------------------------|------------|-------------------|---------|--|--|---------|--|-------|-------|
|       |  |          |              | Начало                    | Окончание  | Длительность, сут | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |       |       |
| 1     | Монтаж / демонтаж коффердама.  | шт.      | 1 138        | 15.01.2022                | 18.10.2022 | 276               | [Bar]   |  |  |         |  |       |       |
| 2     | Дноуглубительные работы  | м3       | 242 390      | 23.02.2022                | 31.07.2022 | 158               | [Bar]   |  |  |         |  |       |       |
| 3     | Трубоукладочные работы на береговом участке                              | п.м.     | 576          | 31.03.2022                | 17.07.2022 | 108               | [Bar]   |  |  |         |  |       |       |
| 4     | Трубоукладочные работы на морском участке                                | п.м.     | 70 681       | 21.04.2022                | 23.07.2022 | 93                | [Bar]   |  |  |         |  |       |       |
| 5     | Метрология, изготовление и монтаж трубной вставки                        | компл.   | 1            | 28.06.2022                | 19.08.2022 | 52                | [Bar]   |  |  |         |  |       |       |
| 6     | Очистка, калибровка, испытания и ВТД трубопровода                        | компл.   | 1            | 19.08.2022                | 10.10.2022 | 52                | [Bar]   |  |  |         |  |       |       |
| 7     | Кабелеукладочные работы на береговом участке                             | п.м.     | 756          | 26.06.2022                | 04.08.2022 | 39                | [Bar]   |  |  |         |  |       |       |
| 8     | Кабелеукладочные работы на морском участке                               | п.м.     | 143 870      | 07.07.2022                | 02.09.2022 | 57                | [Bar]   |  |  |         |  |       |       |
| 9     | Обратная засыпка прибрежных траншей                                      | м3       | 242 390      | 15.09.2022                | 21.11.2022 | 67                | [Bar]   |  |  |         |  |       |       |
| 10    | Протаскивание кабельных линий на БК-1, подключение систем мониторинга КЛ | компл.   | 1            | 07.07.2023                | 05.09.2023 | 60                |         |  |  |         |  | [Bar] |       |
| 11    | Комплексные испытания КЛ   | компл.   | 1            | 05.09.2023                | 25.09.2023 | 20                |         |  |  |         |  |       | [Bar] |

**ЗАКАЗЧИК**  
ЛУКОЙЛ-КМН


**ГЕНПОДРЯДЧИК**  
МРТС

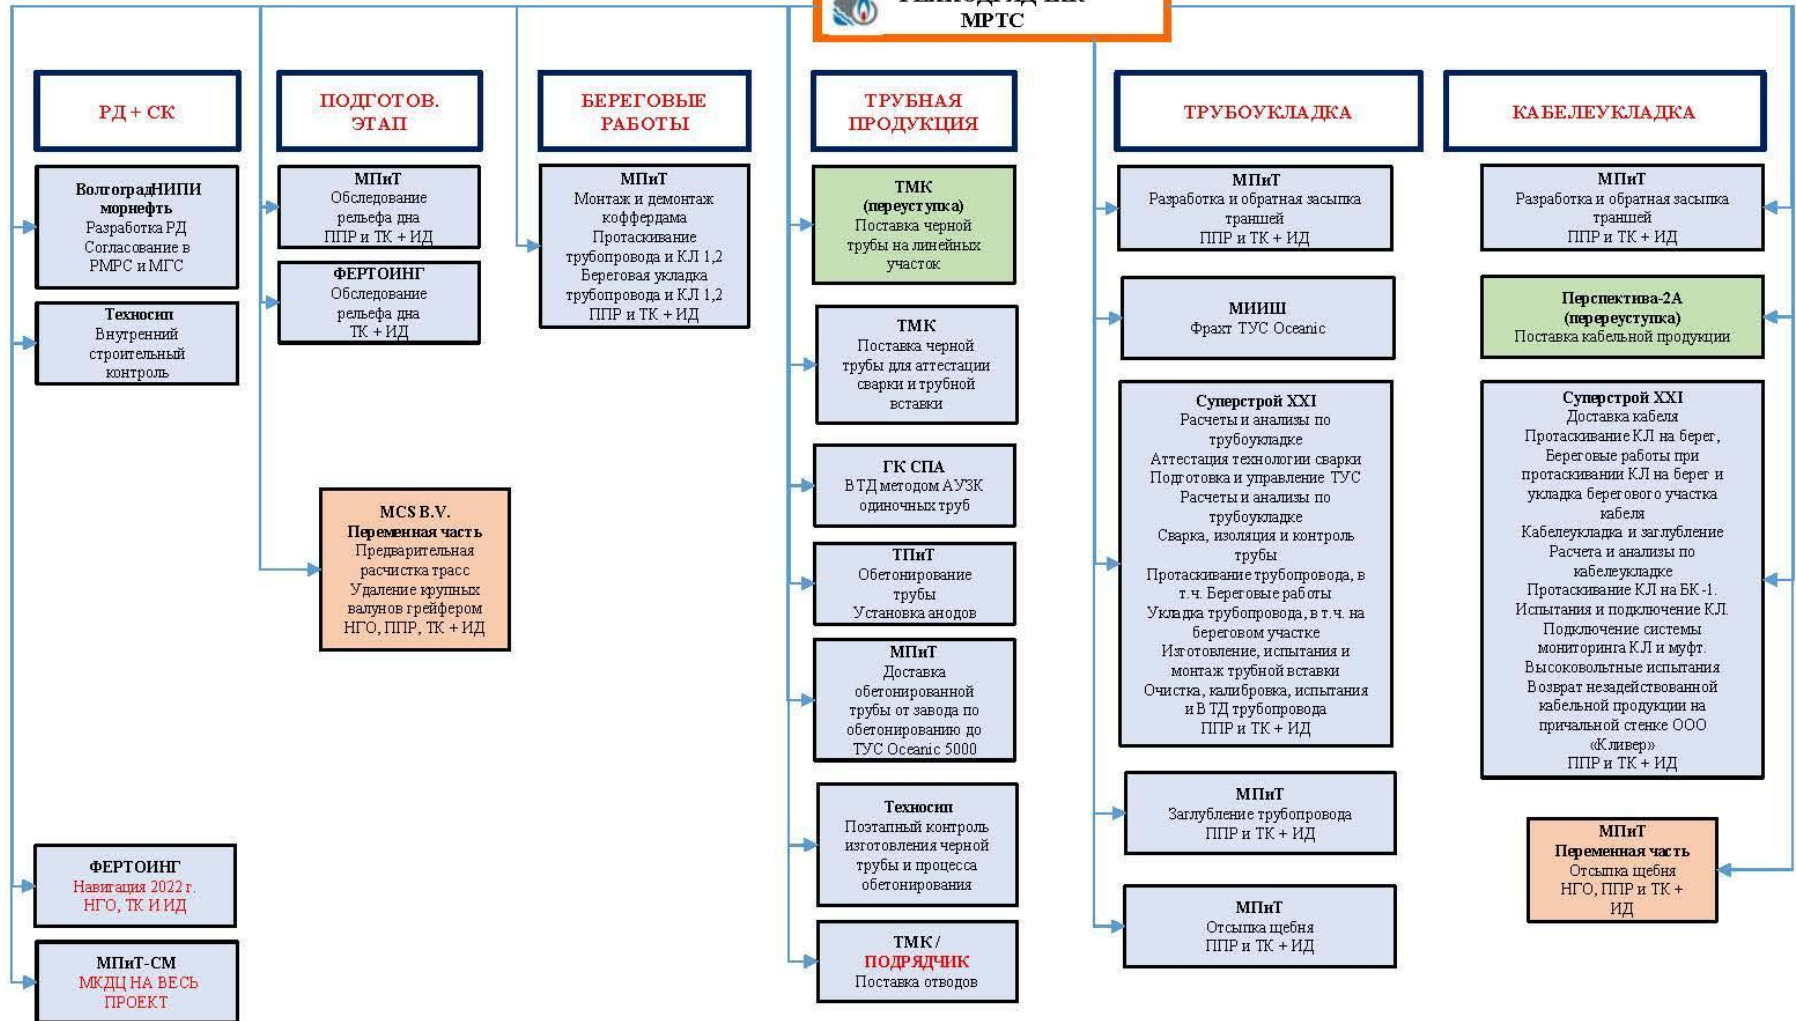




| Объект                   | Товар/Услуги                  | Выбранный поставщик  | Текущий статус                          | Начало и окончание работ       | Объём            | План, на 31.12.2021 г. | Факт, на 31.12.2021 г. | Отклонение |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Мультифазный трубопровод | «Черная» труба                | ПАО «ТМК»            | Договор № 21G0293 от 14.09.2021 г.      | 18.11.2021 г.<br>27.01.2022 г. | 10 432 тн.       | 4 158 тн.              | 3840 тн.               | - 318 тн.  |
| Мультифазный трубопровод | Обетонирование трубы          | ООО «ТПиТ»           | Договор № 5.1/12-061 от 02.12.2021 г.   | 01.12.2021 г.<br>20.05.2022 г. | 6 103 шт.        | 0 шт.                  | 0 шт.                  | -          |
| Мультифазный трубопровод | ТУС Oceanic 5000              | ООО «МИиШ»           | Согласование условий договора сторонами | 01.05.2022 г.<br>28.06.2022 г. | 70 681 м.п.      | 0 м.п.                 | 0 м.п.                 | -          |
| Кабельные линии          | Кабель 35 кВ                  | ООО «Перспектива-2А» | Договор № 21GO294 от 14.07.2021 г.      | 16.09.2021 г.<br>03.07.2022 г. | 149 800 м.       | 28%                    | 32%                    | + 4%       |
| Кабельные линии          | Кабелеукладчик «Living Stone» | DEME Group           | Согласование условий договора сторонами | 14.07.2022 г.<br>19.08.2022 г. | 143 870 м.<br>п. | 0 м.п.                 | 0 м.п.                 | -          |

### Мультифазный трубопровод

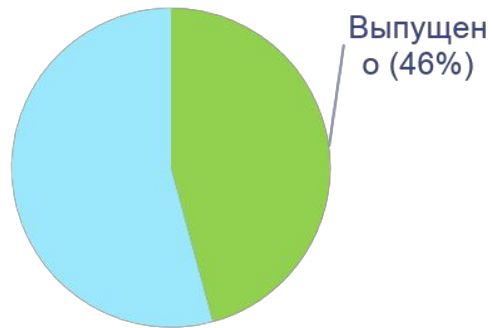

### Силовые кабельные линии



### Временный коффердам



| Объект                       | Всего документов, шт. | Плановое количество документов на 31.12.2021, шт. | Фактически выпущено документов на 31.12.2021, шт. | Необходимо разработать, шт. | Срок завершения разработки РД | Отставание от графика |
|------------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Мультифазный трубопровод  | 59                    | 8   | 27  | 32                          | 02.03.2022                    | Отсутствует           |
| 2.1. Силовые кабельные линии | 37                    | 0   | 0   | 37                          | 24.05.2022                    | Отсутствует           |
| 2.2 Временный коффердам      | 17                    | 17  | 17  | 0                           | 13.01.2022                    | Отсутствует           |




## 7. ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

| Наименование                               | Производственный участок                    | Ед. изм. | План  | Факт  |
|--|---|----------|-------|-------|
| Комплекс работ по обследованию рельефа дна | Морской участок прокладки линейных объектов | млн. м2  | 12,67 | 12,67 |
|  |   |          |       |       |
|  |   |          |       |       |
|  |   |          |       |       |
|  |   |          |       |       |
|  |   |          |       |       |

Отставание связано с .....

# 8. ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

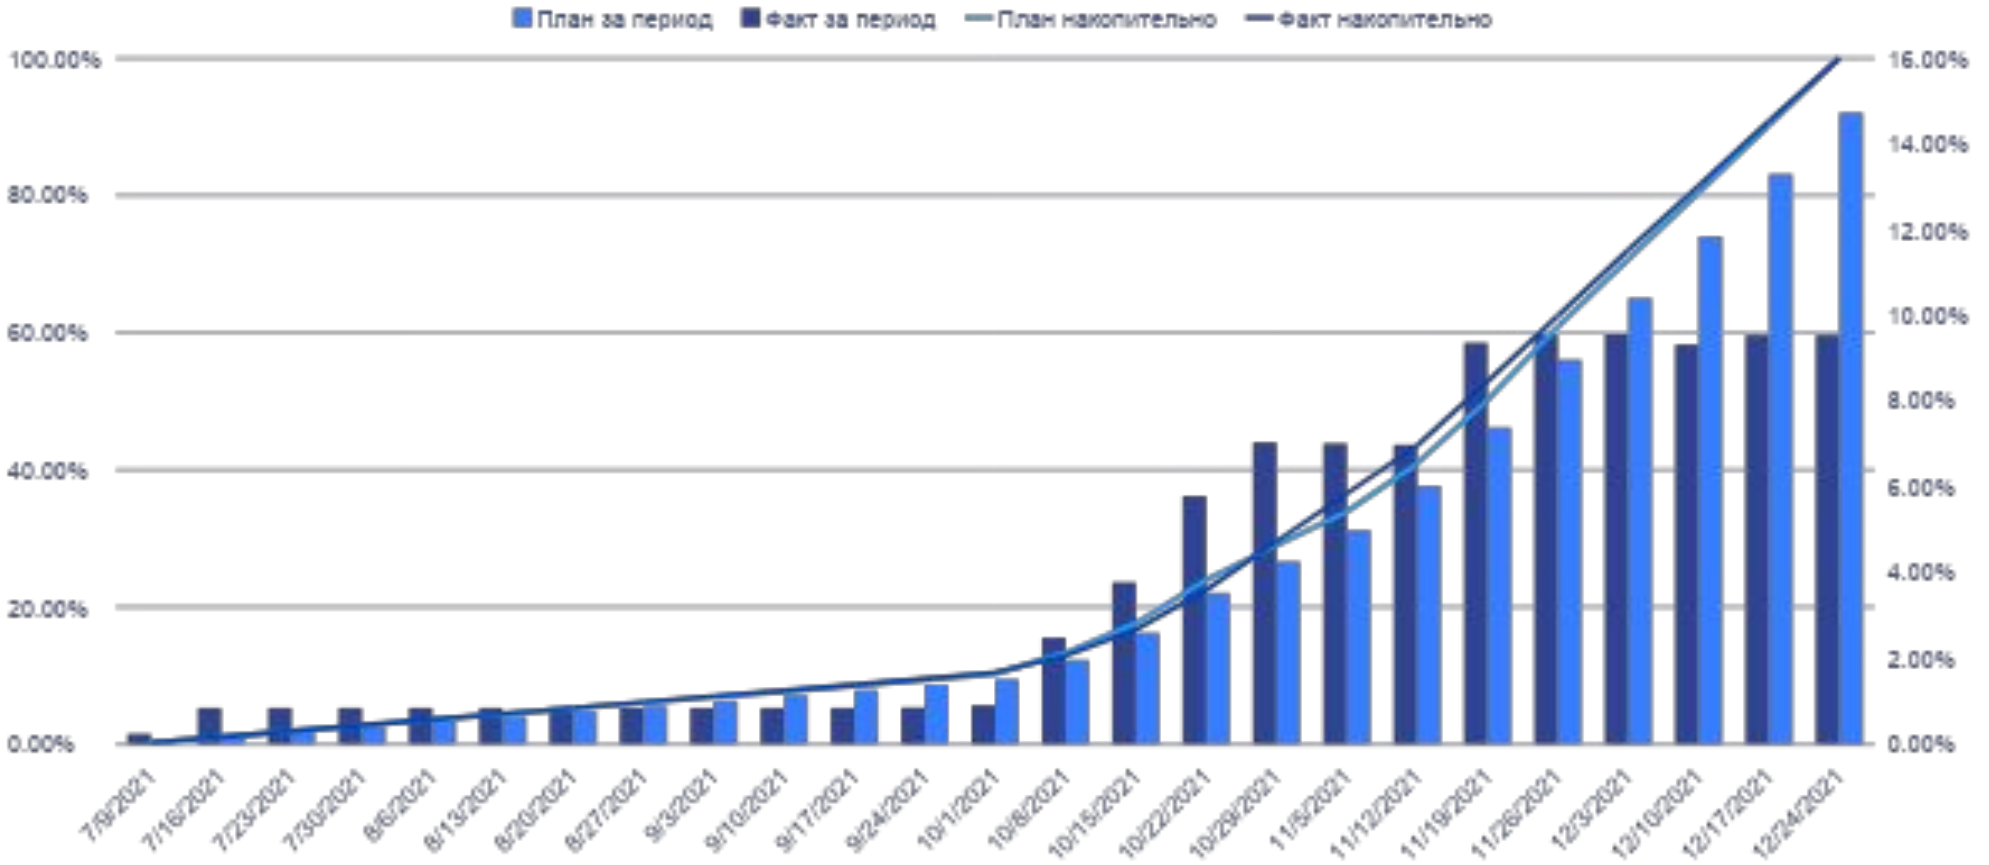

План накопительно: 100 %

Факт накопительно: 100,43 %

+ 0,43 %



## 9. ВЫВОДЫ

*Спасибо за внимание!*
