



2021 2022

«Освоение месторождения с объектами инфраструктуры» 133



2023

Дата: 31.12.2021

мртс содержание

- 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРУ
- 2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН / ГРАФИК РАБОТ
- 3. ДОГОВОРНАЯ СТРАТЕГИЯ
- 4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
- 5. СТАТУС КОНТРАКТАЦИИ И ПОСТАВКИ
- 6. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
- 7. ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
- 8. S-КРИВАЯ
- 9. ВЫВОДЫ

мртс | 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРУ

ПОДРЯДЧИК: AO «МРТС»

ДОГОВОР: № 21GO422 от 08.10.2021 г.

СТОИМОСТЬ ПО

ДОГОВОРУ 23 315,69

(млн. РУБ., без НДС):


CPOK CTPOUTEЛЬСТВА: 10,2021 – 30.10.2023 гг.

ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Показатели	Кол-во
Мультифазный трубопровод, Ø406,4 мм	$71\ 200\ п.м.$
Кабельная линия №1, 35 кВ	71 850 п.м.
Кабельная линия №2, 35 кВ	72~020~п.м.

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Наименование	План	Прогноз
Протаскивание трубопровода	$09.05.2022 \; \Gamma.$	09.05.2022 г.
Гидравлические испытания	03.09.2022 г.	03.09.2022 г.
трубопровода	00.07.2022 1.	09.07.2022 1.
Протаскивание КЛ1	18.07.2022 г.	$18.07.2022 \ \Gamma.$
Протаскивание КЛ2	05.08.2022 г.	$05.08.2022 \; \Gamma.$
Комплексные испытания КЛ	25.09.2023 г.	25.09.2023 г.

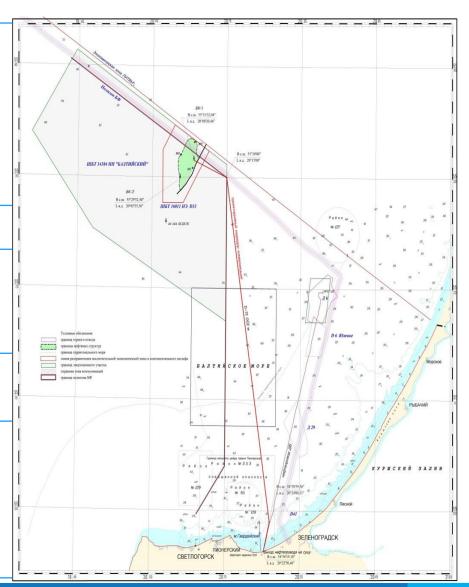




МРТС 2. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

													-
						График пј	роизводстн	за работ					
№ п/п	Наименование этапа	Ед. изм.	Объемы работ	Начало	Окончание	Длительность, сут		2022 г.		2023 г.			
1	Монтаж / демонтаж коффердама.	шт.	1 138	15.01.2022	18.10.2022	276							
2	Дноуглубительные работы	м3	242 390	23.02.2022	31.07.2022	158							
3	Трубоукладочные работы на береговом участке	П.М.	576	31.03.2022	17.07.2022	108							
4	Трубоукладочные работы на морском участке	П.М.	70 681	21.04.2022	23.07.2022	93		—					
	Метрология, изготовление и монтаж трубной вставки	компл.	1	28.06.2022	19.08.2022	52							
	Очистка, калибровка, испытания и ВТД трубопровода	компл.	1	19.08.2022	10.10.2022	52							
	Кабелеукладочные работы на береговом участке	п.м.	756	26.06.2022	04.08.2022	39							
8	Кабелеукладочные работы на морском участке	П.М.	143 870	07.07.2022	02.09.2022	57				d.			
9	Обратная засыпка прибрежных траншей	м3	242 390	15.09.2022	21.11.2022	67							
	Протаскивание кабельных линий на БК-1, подключение систем мониторинга КЛ	компл.	1	07.07.2023	05.09.2023	60							
11	Комплексные испытания КЛ	компл.	1	05.09.2023	25.09.2023	20						0	

МРТС 3. ДОГОВОРНАЯ СТРАТЕГИЯ

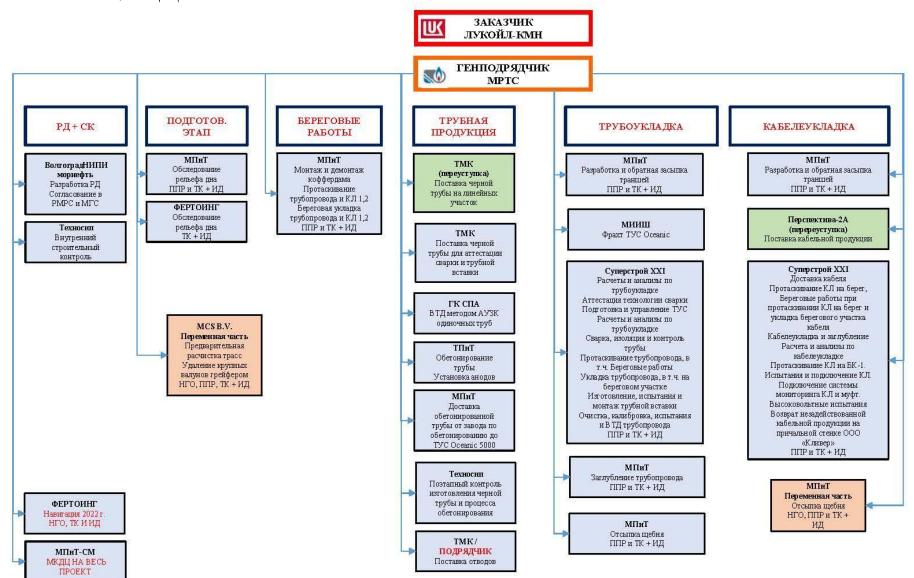

мртс 4. Бюджет проекта

Nº	Основные объекты обустройства/статьи затрат	Бюджет
	ИТОГО бюджет Проекта	




МРТС 5. СТАТУС КОНТРАКТАЦИИ


Объект	Товар/Услуги	Выбранный поставщик	Текущий статус	Начало и окончание работ	Объём	План, на 31.12.2021 г.	Факт, на 31.12.2021 г.	Отклонение
Мультифазный трубопровод	«Черная» труба	ПАО «ТМК»	Договор № 21G0293 от 14.09.2021 г.	18.11.2021 г. 27.01.2022 г.	10 432 тн.	4 158 тн.	3840 тн.	- 318 тн.
Мультифазный трубопровод	Обетонирование трубы	ООО «ТПиТ»	Договор № 5.1/12-061 от 02.12.2021 г.	01.12.2021 г. 20.05.2022 г.	6 103 шт.	0 шт.	0 шт.	-
Мультифазный трубопровод	ТУС Oceanic 5000	ООО «МИиШ»	Согласование условий договора сторонами	01.05.2022 г. 28.06.2022 г.	70 681 м.п.	0 м.п.	0 м.п.	-
Кабельные линии	Кабель 35 кВ	ООО «Перспектива- 2А»	Договор № 21GO294 14.07.2021 г.	16.09.2021 г. 03.07.2022 г.	149 800 м.	28%	32%	+ 4%
Кабельные линии	Кабелеукладчик «Living Stone»	DEME Group	Согласование условий договора сторонами	14.07.2022 г. 19.08.2022 г.	143 870 м.	0 м.п.	0 м.п.	-

МРТС 6. РАЗРАБОТКА РД

Мультифазныйтрубопровод



Силовые кабельные линии






Объект	Всего документов, шт.	Плановое количество документов на 31.12.2021, шт.	Фактически выпущено документов на 31.12.2021, шт.	Необходимо разработать, шт.	Срок завершения разработки РД	Отставание от графика
1. Мультифазный трубопровод	59	8	27	32	02.03.2022	Отсутствует
2.1. Силовые кабельные линии	37	0	0	37	24.05.2022	Отсутствует
2.2 Временный коффердам	17	17	17	0	13.01.2022	Отсутствует

Наименование	Производственный участок	Ед. изм.	План	Факт
Комплекс работ по обследованию рельефа дна	Морской участок прокладки линейных объектов	млн. м2	12,67	12,67

Отставание связано с



МРТС 8. ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

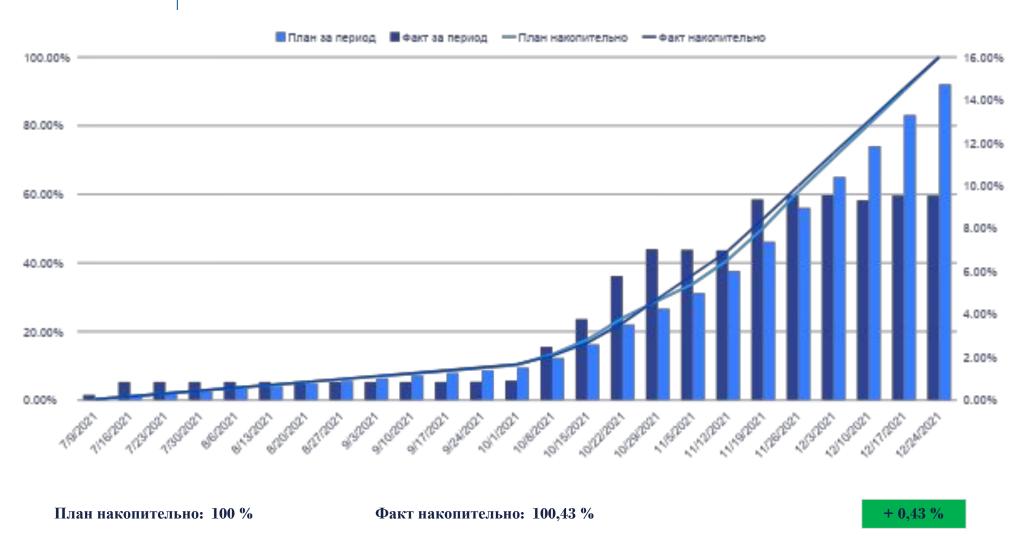





Спасибо за внимание!
