


МИРАТОРГ

Отчет по выполнению строительно-монтажных работ проект Премиксы



Мы кормим людей.

Схема бетонных

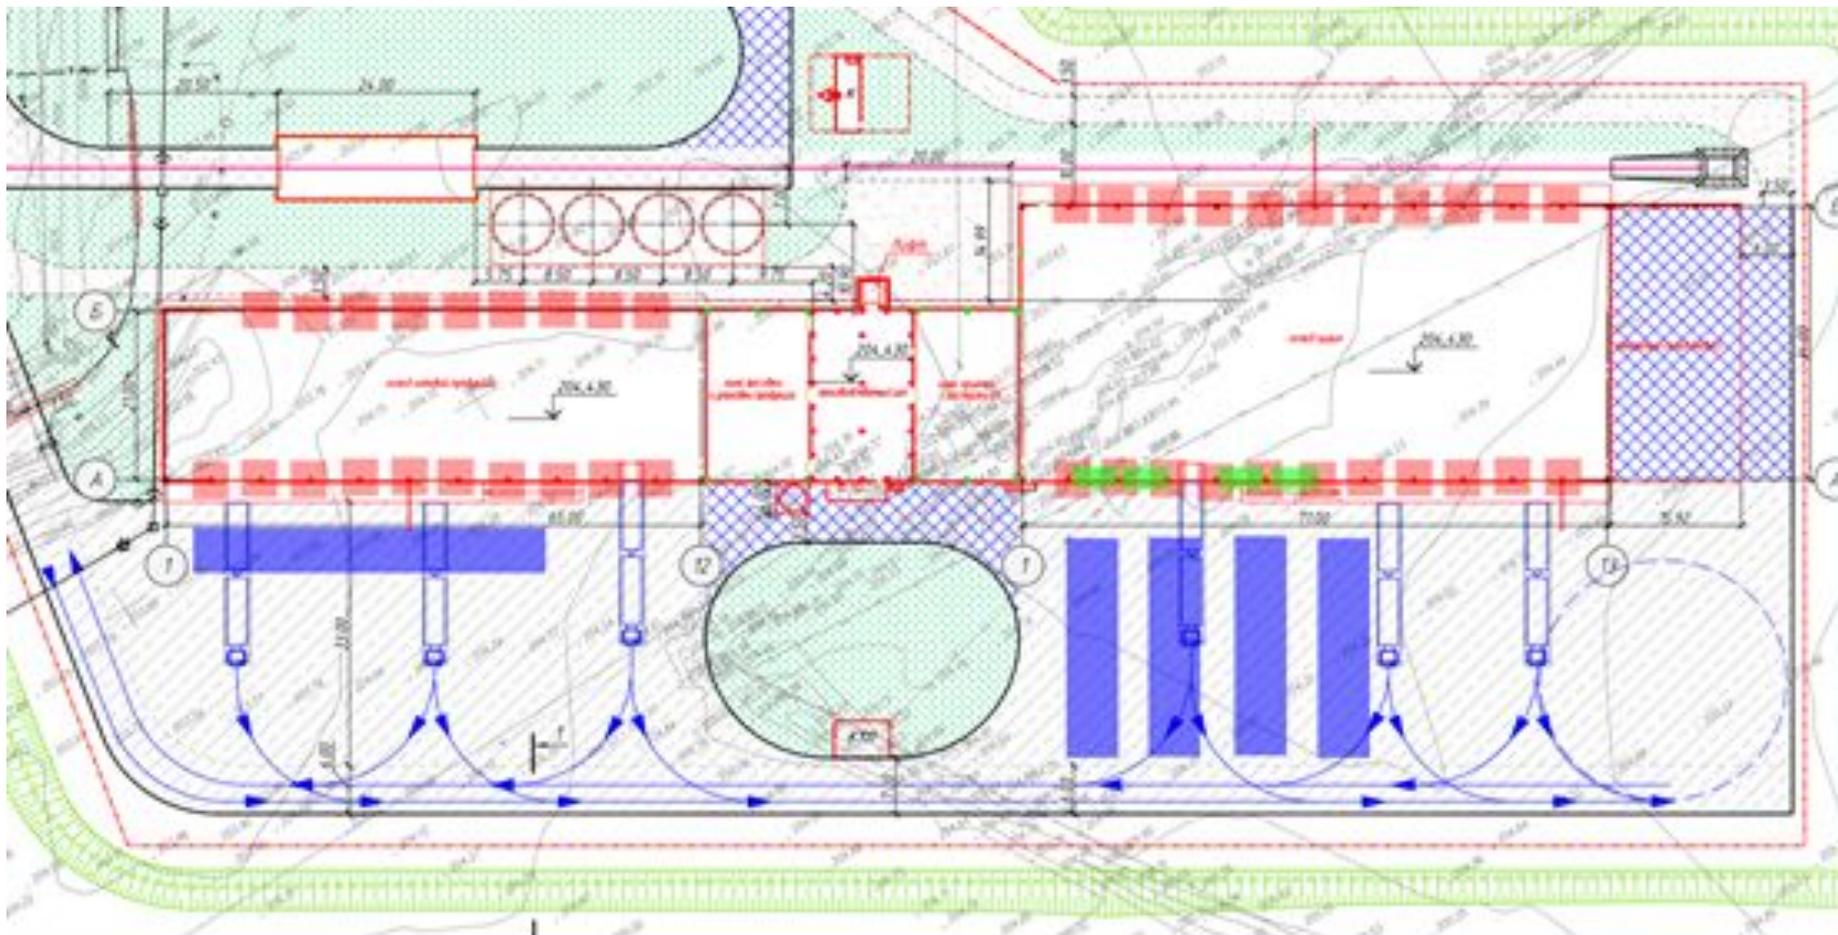

Подрядчики на объекте:

ООО «БрянскАгрострой» – Генеральный подрядчик,

- **ООО «Строй-Победа» - 2 экскаватора, 7 камазов, 2 шакмана, 1 кран, 1 каток, 1 погрузчик, 15 бетонщиков, 5 дорожников , 2 ИТР**
- **ООО «Стройгазсервис» - 1 экскаватор, 4 камаза, 1 каток, 1 погрузчик, 1 ИТР, 10 дорожников**
- **ООО «Интеллектуальные системы» - 5 рабочих, 1 ИТР**

- **Итого ТЕХНИКА: 21 ед**
- **Итого ЛЮДИ: 39 человека**

Изменение сроков запуска объекта

Основное корпуса: производственный/расстарка/фасовка	316 дней	Пт 04.08.17	Пт 15.06.18
Получение расчетных нагрузок от Оттовангера	0 дней	Пт 18.08.17	Пт 18.08.17
Расчет фундаментной плиты под технологический корпус	21 дней	Сб 19.08.17	Пт 08.09.17
Расчет фундаментов под зону расстарки и зону фасовки	21 дней	Сб 19.08.17	Пт 08.09.17
Расчет фундаментов под лифтовую шахту	9 дней	Сб 26.08.17	Вс 03.09.17
Проектирование технологических приемков и подполий	9 дней	Сб 19.08.17	Вс 27.08.17
Заключение договора на СМР	10 дней	Сб 09.09.17	Пн 18.09.17
Мобилизация подрядчика на строй площадку	10 дней	Сб 09.09.17	Пн 18.09.17
Снятие плодородного грунта	2 дней	Вт 19.09.17	Ср 20.09.17
▸ Фундаменты, бетонные работы	232 дней	Ср 13.09.17	Чт 03.05.18
▸ Монтаж Технологическое оборудование	207 дней	Пн 06.11.17	Чт 31.05.18
ПНР Технологического оборудования	14 дней	Пт 01.06.18	Чт 14.06.18
Начало производства продукции	1 день	Пт 15.06.18	Пт 15.06.18

1%	Основное корпуса: производственный/расстарка/фасовка	345 дней	Пт 04.08.17	Сб 14.07.18
0%	Получение расчетных нагрузок от Оттовангера	0 дней	Чт 21.09.17	Чт 21.09.17
0%	Расчет фундаментной плиты под технологический корпус	25 дней	Чт 21.09.17	Вс 15.10.17
0%	Расчет фундаментов под зону расстарки и зону фасовки	25 дней	Чт 21.09.17	Вс 15.10.17
0%	Расчет фундаментов под лифтовую шахту	9 дней	Вс 01.10.17	Пн 09.10.17
0%	Проектирование технологических приемков и подполий	14 дней	Чт 21.09.17	Ср 04.10.17
0%	Заключение договора на СМР	10 дней	Пн 16.10.17	Ср 25.10.17
0%	Мобилизация подрядчика на строй площадку	10 дней	Пн 16.10.17	Ср 25.10.17
0%	Снятие плодородного грунта	2 дней	Чт 26.10.17	Пт 27.10.17
0%	▸ Фундаменты, бетонные работы	199 дней	Пн 16.10.17	Чт 03.05.18
0%	▸ Монтаж Технологическое оборудование	236 дней	Пн 06.11.17	Пт 29.06.18
0%	ПНР Технологического оборудования	14 дней	Сб 30.06.18	Пт 13.07.18
0%	Начало производства продукции	1 день	Сб 14.07.18	Сб 14.07.18

Общий вид стройплощадки



Фундаменты склада сырья (Ось БВ)



Фундаменты склада сырья (Ось А)



Фундаменты склада сырья – общий вид



Фундаменты склада готовой продукции (Ось А)



Фундаменты склада готовой продукции (Ось Б)



Фундаменты склада сырья – общий вид



Бетонирование площадки склада сырья



Бетонирование площадки склада готовой продукции



Гидроизоляция фундаментов



Установка железобетонных колонн

