

# МИРАТОРГ

Отчет по выполнению строительно-монтажных работ проект Премиксы




*Мы кормим людей.*





## Схема бетонных

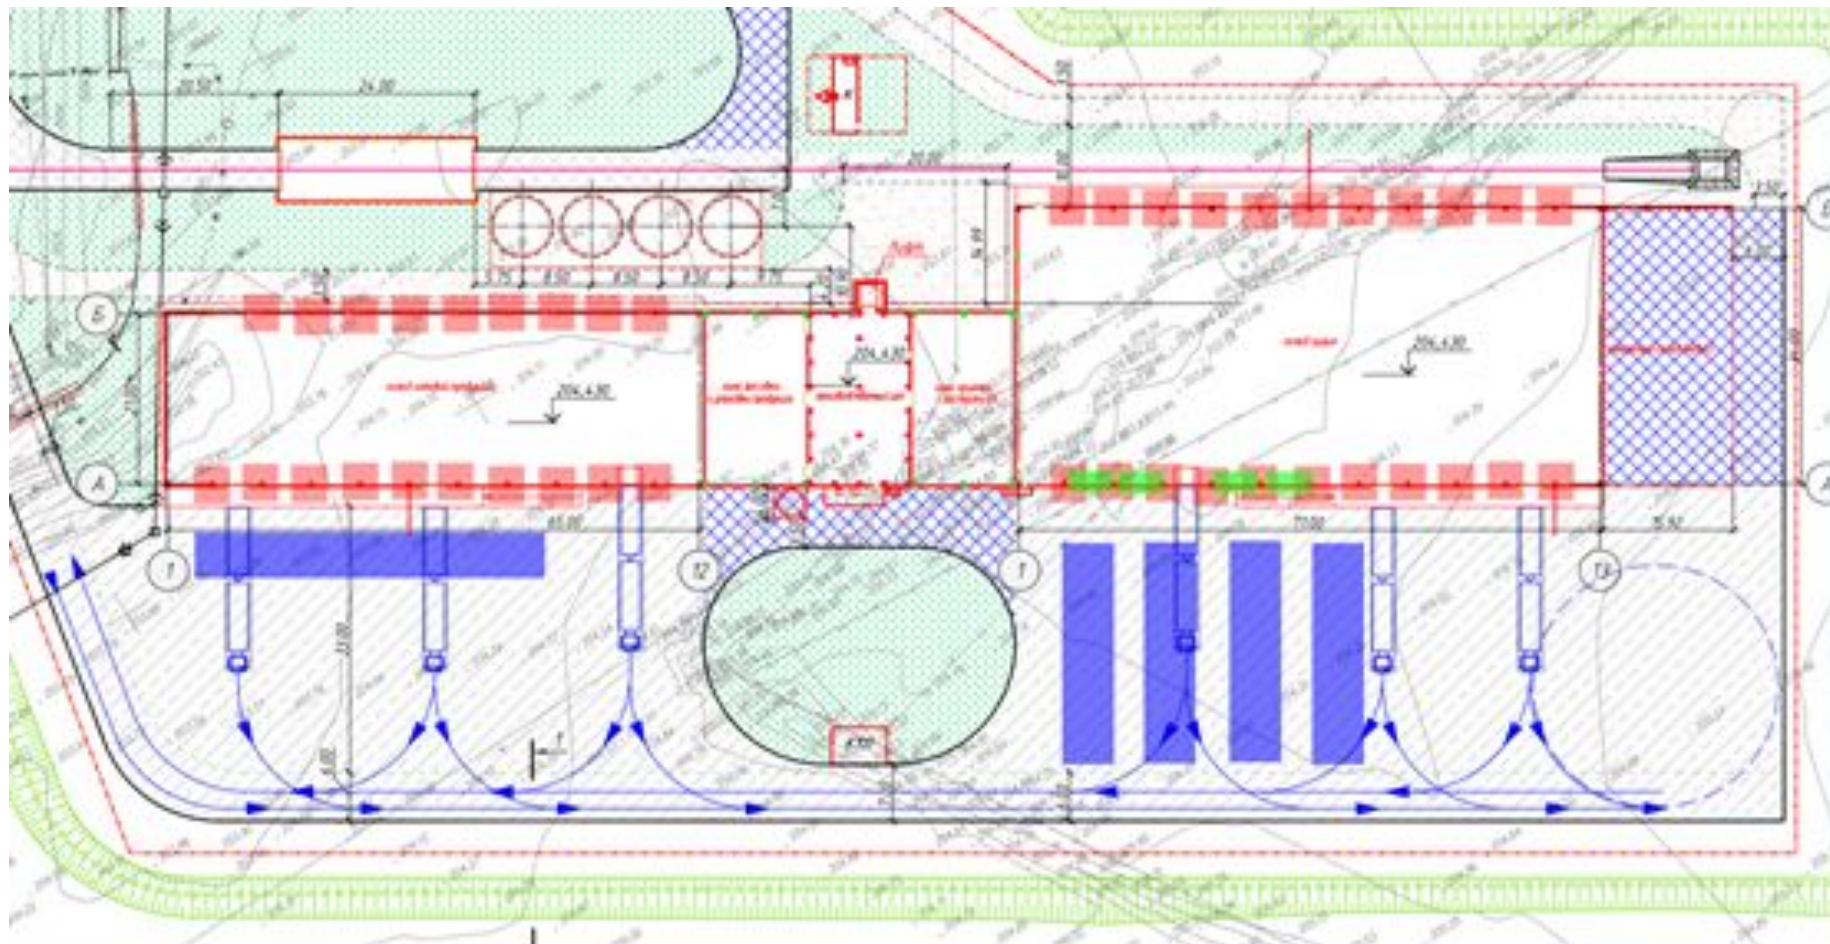

**Подрядчики на объекте:**

**ООО «БрянскАгрострой» – Генеральный подрядчик,**

- **ООО «Строй-Победа» - 2 экскаватора, 7 камазов, 2 шакмана, 1 кран, 1 каток, 1 погрузчик, 15 бетонщиков, 5 дорожников , 2 ИТР**
- **ООО «Стройгазсервис» - 1 экскаватор, 4 камаза, 1 каток, 1 погрузчик, 1 ИТР, 10 дорожников**
- **ООО «Интеллектуальные системы» - 5 рабочих, 1 ИТР**
  
- **Итого ТЕХНИКА: 21 ед**
- **Итого ЛЮДИ: 39 человека**



## Изменение сроков запуска объекта

<b>Основное корпуса: производственный/расстарка/фасовка</b>	<b>316 дней</b>	<b>Пт 04.08.17</b>	<b>Пт 15.06.18</b>
Получение расчетных нагрузок от Оттовангера	0 дней	Пт 18.08.17	Пт 18.08.17
Расчет фундаментной плиты под технологический корпус	21 дней	Сб 19.08.17	Пт 08.09.17
Расчет фундаментов под зону расстарки и зону фасовки	21 дней	Сб 19.08.17	Пт 08.09.17
Расчет фундаментов под лифтовую шахту	9 дней	Сб 26.08.17	Вс 03.09.17
Проектирование технологических приемков и подполий	9 дней	Сб 19.08.17	Вс 27.08.17
Заключение договора на СМР	10 дней	Сб 09.09.17	Пн 18.09.17
Мобилизация подрядчика на строй площадку	10 дней	Сб 09.09.17	Пн 18.09.17
Снятие плодородного грунта	2 дней	Вт 19.09.17	Ср 20.09.17
▸ <b>Фундаменты, бетонные работы</b>	<b>232 дней</b>	<b>Ср 13.09.17</b>	<b>Чт 03.05.18</b>
▸ <b>Монтаж Технологическое оборудование</b>	<b>207 дней</b>	<b>Пн 06.11.17</b>	<b>Чт 31.05.18</b>
<b>ПНР Технологического оборудования</b>	<b>14 дней</b>	<b>Пт 01.06.18</b>	<b>Чт 14.06.18</b>
<b>Начало производства продукции</b>	<b>1 день</b>	<b>Пт 15.06.18</b>	<b>Пт 15.06.18</b>

<b>1%</b>	<b>Основное корпуса: производственный/расстарка/фасовка</b>	<b>345 дней</b>	<b>Пт 04.08.17</b>	<b>Сб 14.07.18</b>
<b>0%</b>	Получение расчетных нагрузок от Оттовангера	0 дней	Чт 21.09.17	Чт 21.09.17
0%	Расчет фундаментной плиты под технологический корпус	25 дней	Чт 21.09.17	Вс 15.10.17
0%	Расчет фундаментов под зону расстарки и зону фасовки	25 дней	Чт 21.09.17	Вс 15.10.17
0%	Расчет фундаментов под лифтовую шахту	9 дней	Вс 01.10.17	Пн 09.10.17
0%	Проектирование технологических приемков и подполий	14 дней	Чт 21.09.17	Ср 04.10.17
0%	Заключение договора на СМР	10 дней	Пн 16.10.17	Ср 25.10.17
0%	Мобилизация подрядчика на строй площадку	10 дней	Пн 16.10.17	Ср 25.10.17
0%	Снятие плодородного грунта	2 дней	Чт 26.10.17	Пт 27.10.17
0%	▸ <b>Фундаменты, бетонные работы</b>	<b>199 дней</b>	<b>Пн 16.10.17</b>	<b>Чт 03.05.18</b>
0%	▸ <b>Монтаж Технологическое оборудование</b>	<b>236 дней</b>	<b>Пн 06.11.17</b>	<b>Пт 29.06.18</b>
0%	<b>ПНР Технологического оборудования</b>	<b>14 дней</b>	<b>Сб 30.06.18</b>	<b>Пт 13.07.18</b>
<b>0%</b>	<b>Начало производства продукции</b>	<b>1 день</b>	<b>Сб 14.07.18</b>	<b>Сб 14.07.18</b>



### Общий вид стройплощадки





## Фундаменты склада сырья (Ось БВ)





## Фундаменты склада сырья (Ось А)





## Фундаменты склада сырья – общий вид





## Фундаменты склада готовой продукции (Ось А)





## Фундаменты склада готовой продукции (Ось Б)





## Фундаменты склада сырья – общий вид





## Бетонирование площадки склада сырья





## Бетонирование площадки склада готовой продукции





## Гидроизоляция фундаментов





## Установка железобетонных колонн

