



*Результаты исполнения условий
концессионного соглашения в
отношении объектов
водоотведения г.Покачи
за период
с 01.01.2021 по 30.09.2021 годов*

Необходимость реконструкции обусловлена
следующими причинами:



сети канализации

- устарели морально и физически
- износ сетей – 82%



КОС — 7000

- период эксплуатации – 27 лет
- износ объектов – 97.6%

Цели и задачи реализации концессионного соглашения



реконструкция КОС-7000 с сокращением установленной мощности до 5000 м³/сут.

модернизация наружных сетей водоотведения ул. Комсомольская, 4 - ул. Комсомольская, 6,

модернизация наружных сетей водоотведения ул. Молодежная, 8, 10, 31 - ул. Комсомольская, 2

модернизация наружных сетей водоотведения ул. Мира, 14 - ул. Мира, 16

обеспечение гарантированного устойчивого и экономически эффективного предоставления услуг в сфере водоотведения

повышение качества услуг и улучшение экологической обстановки в городе Покачи

обеспечение нормативных требований в работе системы КОС

Схема реализации концессионного соглашения

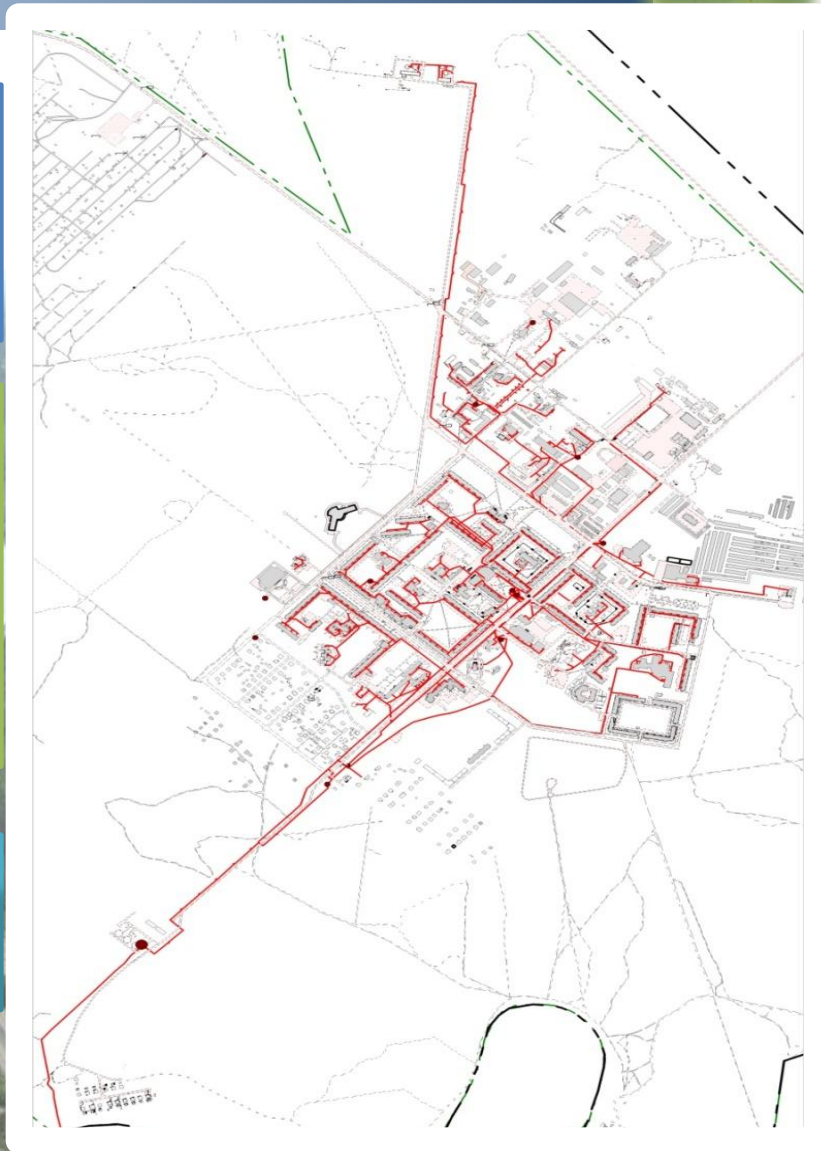


Схема реализации - концессионное соглашение с платой Концедента.


Концедент - муниципальное образование город Покачи.

Финансирование проекта привлечение концессионером собственных и/или привлеченных средств с последующим возвратом заемных средств за счет платы концедента и получения прибыли от эксплуатации объектов концессионного соглашения.

Заклучено концессионное соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОСИСТЕМА».



Этапы реализации концессионного соглашения

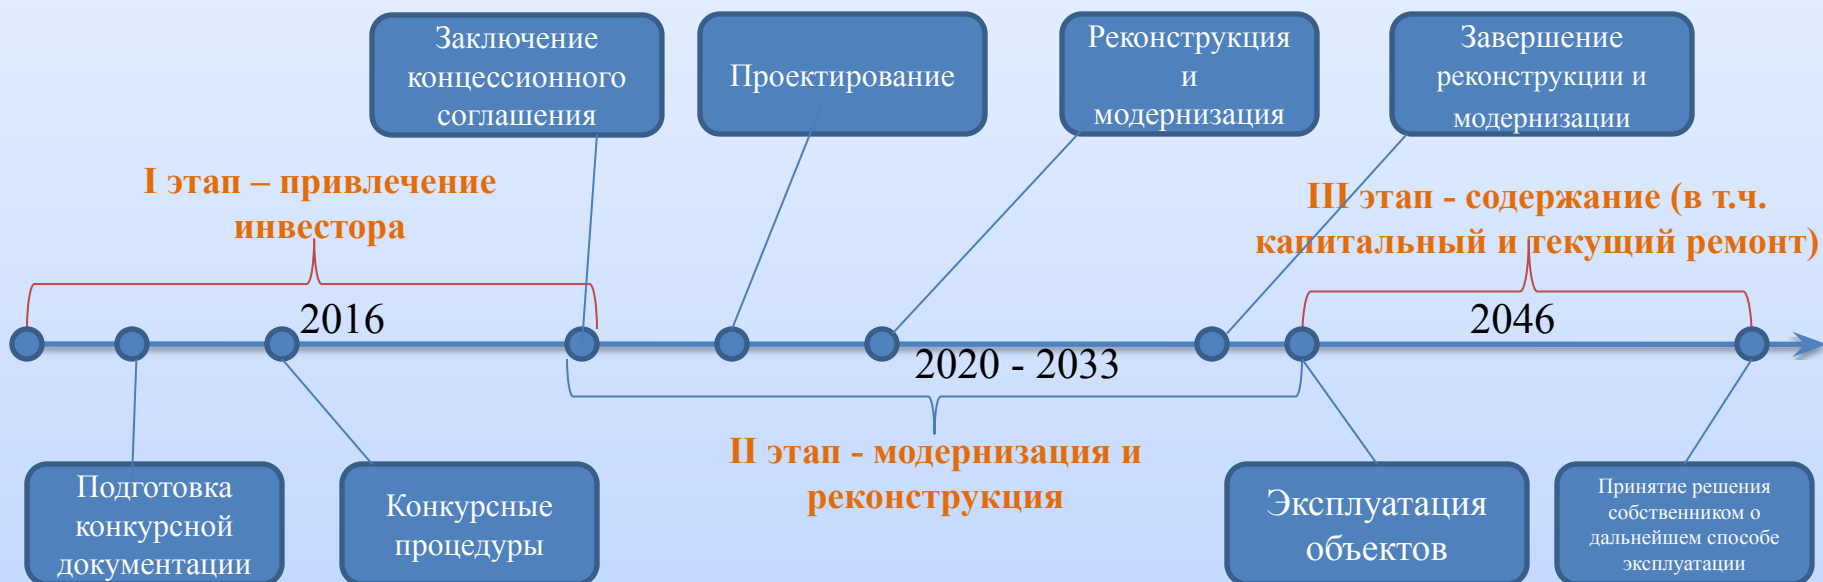

I этап до 2020 года - привлечение инвестора – за счет собственных и привлекаемых средств инвестора

II этап до 2033 года - модернизация и реконструкция за счет собственных и заемных средств инвестора, а так же платы концедента

III этап до 2046 - содержание (в т.ч. капитальный и текущий ремонт) за счет собственных средств инвестора (концессионера)



Основные показатели результативности реализации концессионного соглашения



сокращение мощности КОС с 7000 м³/сут. до 4000 м³/сут..

модернизация наружных сетей водоотведения 14 км – 6,0% от общей протяженности сетей.

снижение аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети с 11,18 ед./км до 10,311 ед./км.



доля сточных вод, не подвергающихся очистке, сбрасываемых в системы водоотведения - 0%;


доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам и лимитам -0%.



*По состоянию на 30.09.2021
концессионером выполнены
следующие виды работ:*

1. Реконструкция ремонтного блока здания КОС, в том числе:
 - 1) реконструкция помещения ВРУ;
 - 2) монтаж оборудования ВРУ;
 - 3) монтаж кабельных линий.
2. Установлена механизированная решетка очистки стоков.
3. Установлена песколовка.
4. Замена лестницы вентиляционной шахты.

*Работы по реконструкции помещения ВРУ и
монтаж кабельных линий и оборудования ВРУ
выполнены*

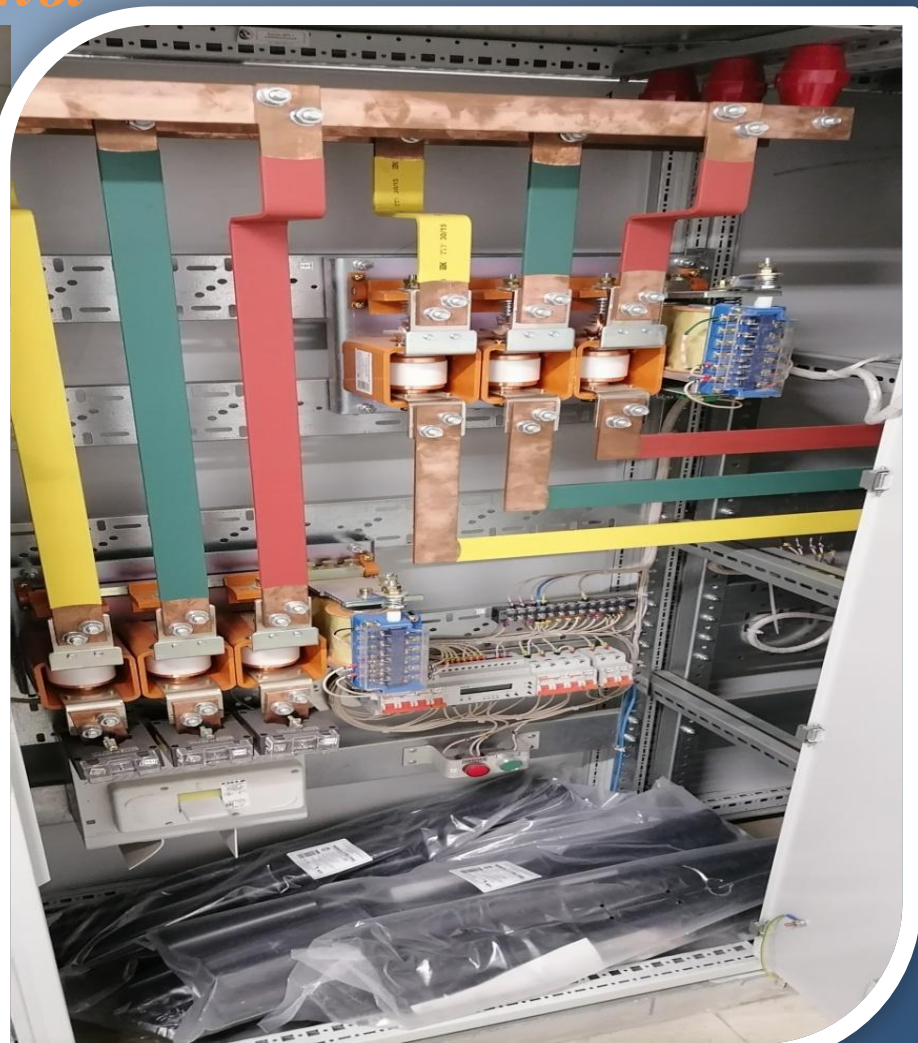



*Замена лестницы вентиляционной шахты,
механизированная решетка очистки стоков*





Во исполнение Федерального закона «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ и согласно условиям концессионного соглашения, Концедентом осуществляется контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в соответствии с графиком проведения контрольных мероприятий.

Результаты контроля оформляются актом контроля, который представлен на обсуждение координационного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Покачи до 2020 и на период 2030 года и вопросам развития инвестиционной деятельности города Покачи.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

