
Заказчик: АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»

Подрядчик: АО «ТРУД»

Контракт № 216-ПР/19 от 14.05.2019


Объект: : «РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМА ОХА»

ОТЧЕТ № 9
О ходе выполнения работ
на 05.07.2020 г.

05.07.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМА "ОХА"

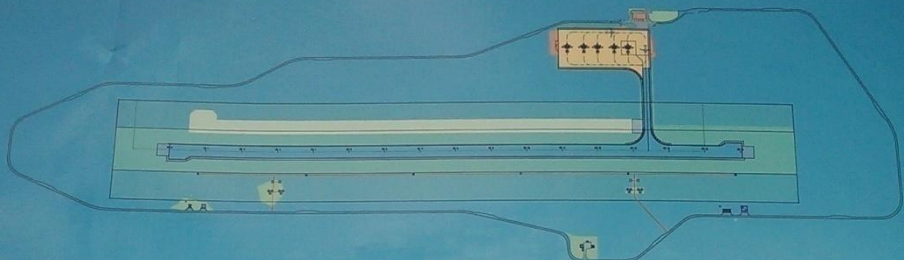

Заказчик:
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
г. Южно-Сахалинск, Аэропорт,
тел.: 8 (4242) 788-311

Генеральный подрядчик:
АО "Труд"
г.Иркутск, ул.Академическая 5А,
тел.: 8 (4243) 747-902

Ответственный за производство работ:
Дедов А.В. тел.: 8 (4243) 747-902

Начало работ: 14 мая 2019г.

Окончание работ: 10 декабря 2021г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ																										
1, 2 этап																										
№ пп	Номера сметных расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость СМР, в руб.	Стоимость услуг Технического заказчика, в руб.	2019 год												2020 год					2021 год				
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	2	3																								
1 ЭТАП																										
4	02-01	Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием (ИВПП-2) (ГП № 6).	803 970 477,28	8 430 588,79																						
5	02-02	РД-А (ГП № 3)	97 885 322,77	1 026 444,29																						
6	02-08	Метеорологическое оборудование (ГП №№ 50,51)	34 105 986,47	357 641,92																						
7	02-11	Светосигнальное оборудование (ССО) (ГП № 39А)	62 879 538,40	659 366,91																						
8	02-12	Био-акустическая система отпугивания птиц (ГП № 11)	8 351 549,97	87 575,96																						
9	04-03	ЦРП (ГП № 38)	36 304 966,03	380 700,84																						
10	04-05	Сети электроснабжения 6 кВ	24 137 425,12	253 109,67																						
11	04-06	Сети электроснабжения 0,4-0,23 кВ	96 393 601,77	1 010 801,82																						
12	05-02	Внутридислокационные сети связи	60 715 814,46	636 677,69																						
13	05-03	Патрульная автодорога (ГП № 70)	279 305 434,01	2 928 850,41																						
14	06-03	Очистные сооружения № 1 (ГП № 36)	11 992 333,49	125 753,91																						
15	06-04	Очистные сооружения № 2 (ГП № 57)	36 962 020,31	387 590,84																						
16	07-01	Вертикальная планировка	134 981 279,13	1 415 439,61																						
17	07-02	Ограждение аэродрома (ГП № 71)	44 689 001,50	468 617,45																						

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

NN	Номера сп	Сметных расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость СМР, в руб.	Стоимость услуг Технического заказчика, в руб.	2019 год												2020 год												2021 год											
						май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
2 ЭТАП																																									
18	01-01		Подготовительные работы	6 619 284,18	69 411,08																																				
19	02-03		Перрон. Площадка для обработки ВС ПОЖ (ГП № 4, 4а)	309 298 370,62	3 243 362,10																																				
20	04-04		ЦДЭС (ГП № 38А)	20 721 648,83	217 291,19																																				
21	04-06		Сети электроснабжения 0,4-0,23 кВ	14 469 582,12	151 730,82																																				
22	04-07		Электрошитовая перрона (ГП № 55)	4 901 347,72	51 396,47																																				
23	05-01		Аварийно-спасательная станция (АСС) (ГП № 35)	154 053 661,25	1 615 436,27																																				
24	05-02		Внутриплощадочные сети связи	597 531,56	6 265,83																																				
25	05-03		Патрульная автодорога (ГП № 70)	133 651,05	1 401,49																																				
26	06-01		Котельная (газовая) (ГП № 37)	11 695 878,81	122 645,23																																				
27	06-02		Противопожарные резервуары с насосами вмк. 500 м3 (2 шт) (ГП № 56)	14 846 478,39	155 683,02																																				
30	06-05		Сети хоз.питьевого водоснабжения	3 956 598,04	41 489,65																																				
31	06-06		Сети противопожарного водоснабжения	9 180 915,87	96 272,85																																				
32	06-07		Сети производственной и бытовой канализации	2 346 376,73	24 604,56																																				
33	06-08		Сети дождевой канализации	762 285,14	7 993,47																																				
34	06-09		Тепловые сети	15 626 033,98	163 857,59																																				
35	06-10		Сети газоснабжения	619 837,20	6 499,73																																				
36	07-01		Вертикальная планировка	14 228 453,36	149 202,29																																				

План-график работ на июнь-октябрь 2020 г.


NN пп	Номера сметных расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость СМР, в руб.	Стоимость услуг Технического заказчика, в руб.	2019 год												2020 год											
					май	июн ь	июл ь	авг уст	сеп тябр ь	окт ябрь	ноя брь	дек ябрь	янв арь	фев раль	март	апр ель	май	июн ь	июл ь	авг уст	сеп тябр ь	окт ябрь	ноя брь	дек ябрь				
1	2	3																										
1 ЭТАП																												
4	02-01	Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием (ИВПШ-2) (ГП № 6).	803 970 477,28	8 430 588,79																								
5	02-02	РД-А (ГП № 3)	97 885 322,77	1 026 444,29																								
6	02-08	Метеорологическое оборудование (ГП №№ 50,51)	34 105 986,47	357 641,92																								
7	02-11	Светосигнальное оборудования (ССО) (ГП № 39А)	62 879 538,40	659 366,91																								
8	02-12	Био-акустическая система отпугивания птиц (ГП № 11)	8 351 549,97	87 575,96																								
9	04-03	ЦРП (ГП № 38)	36 304 966,03	380 700,84																								
10	04-05	Сети электроснабжения 6 кВ	24 137 425,12	253 109,67																								
11	04-06	Сети электроснабжения 0,4-0,23 кВ	96 393 601,77	1 010 801,82																								
12	05-02	Внутриплощадочные сети связи	60 715 814,46	636 677,69																								
13	05-03	Патрульная автодорога (ГП № 70)	279 305 434,01	2 928 850,41																								
14	06-03	Очистные сооружения № 1 (ГП № 36)	11 992 333,49	125 753,91																								
15	06-04	Очистные сооружения № 2 (ГП № 57)	36 962 020,31	387 590,84																								
16	07-01	Вертикальная планировка	134 981 279,13	1 415 439,61																								
17	07-02	Отраждение аэродрома (ГП № 71)	44 689 001,80	468 617,45																								
2 ЭТАП																												
18	01-01	Подготовительные работы	6 619 284,18	69 411,08																								
19	02-03	Перрон. Площадка для обработки ВС ПОЖ (ГП № 4, 4а)	309 298 370,62	3 243 362,10																								
20	04-04	ЦДЭС (ГП, № 38А)	20 721 648,83	217 291,19																								

Численность персонала (ИТР и рабочих)
Количество строительно-дорожных машин

4 - инженерно-технических работника
15 - человек рабочих специальностей

8 - автосамосвалов
4 - экскаватора
3 - бульдозера
2 – виброкатка
1 – автогрейдер
1 - асфальта укладчик

Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

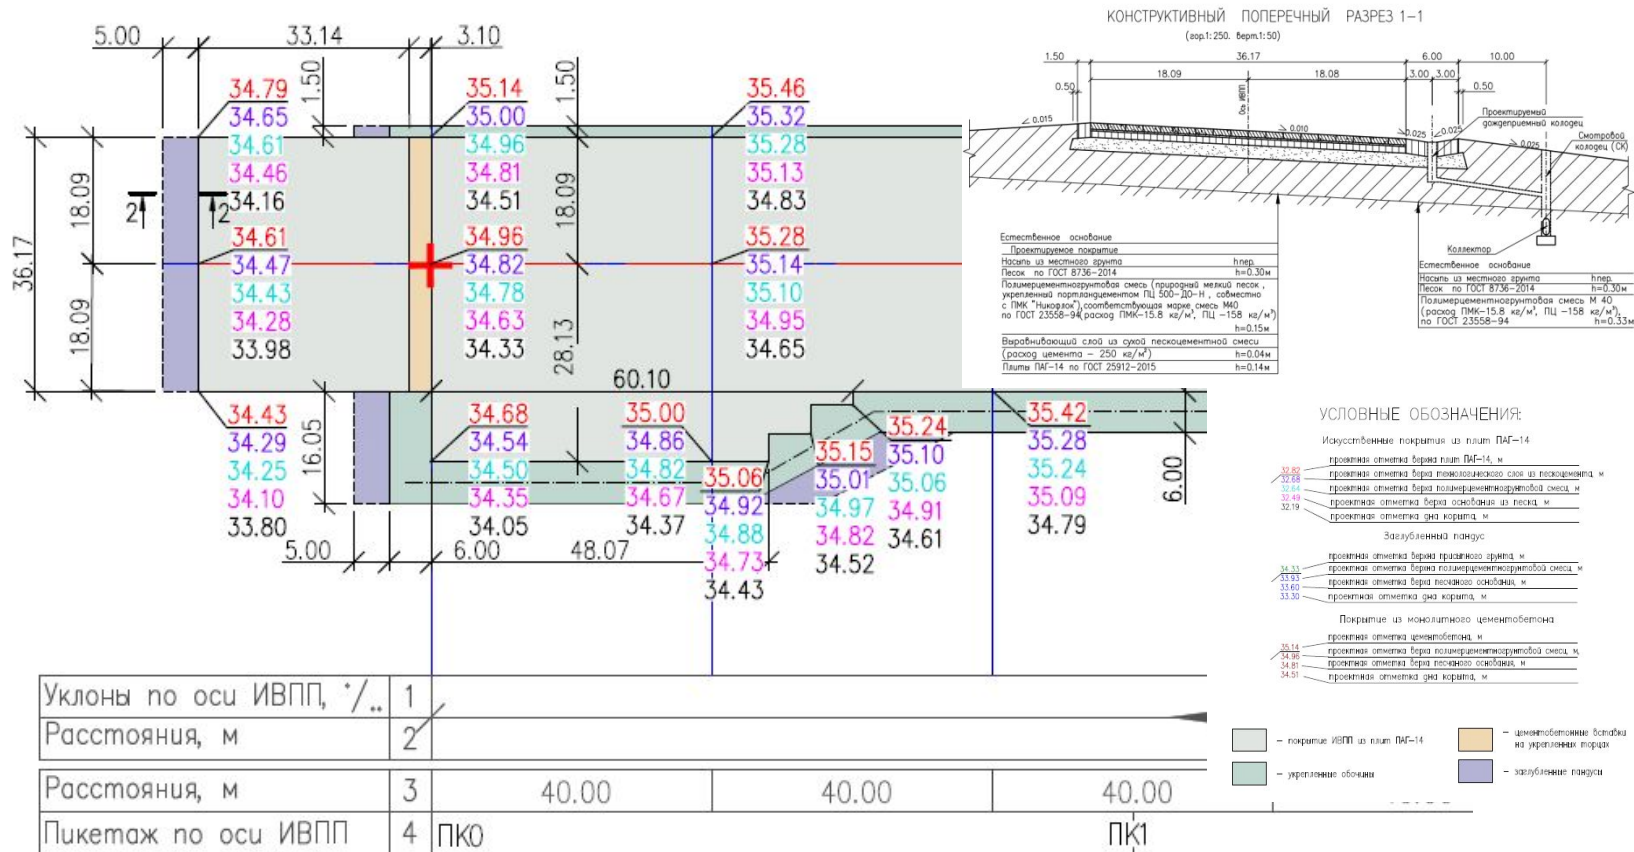

Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

ПК 00 - ПК 01. Устройство основания на ИВПП из ЦПС с ПМК «Никофлок» $h=0,15$ м.




Работы не велись метеоусловия (дождь)

Т/Х «Гранит» вышел из порта отгрузки, на борту ПАГ-14, 584 шт.

Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

Устройство смотровых колодцев (СК)

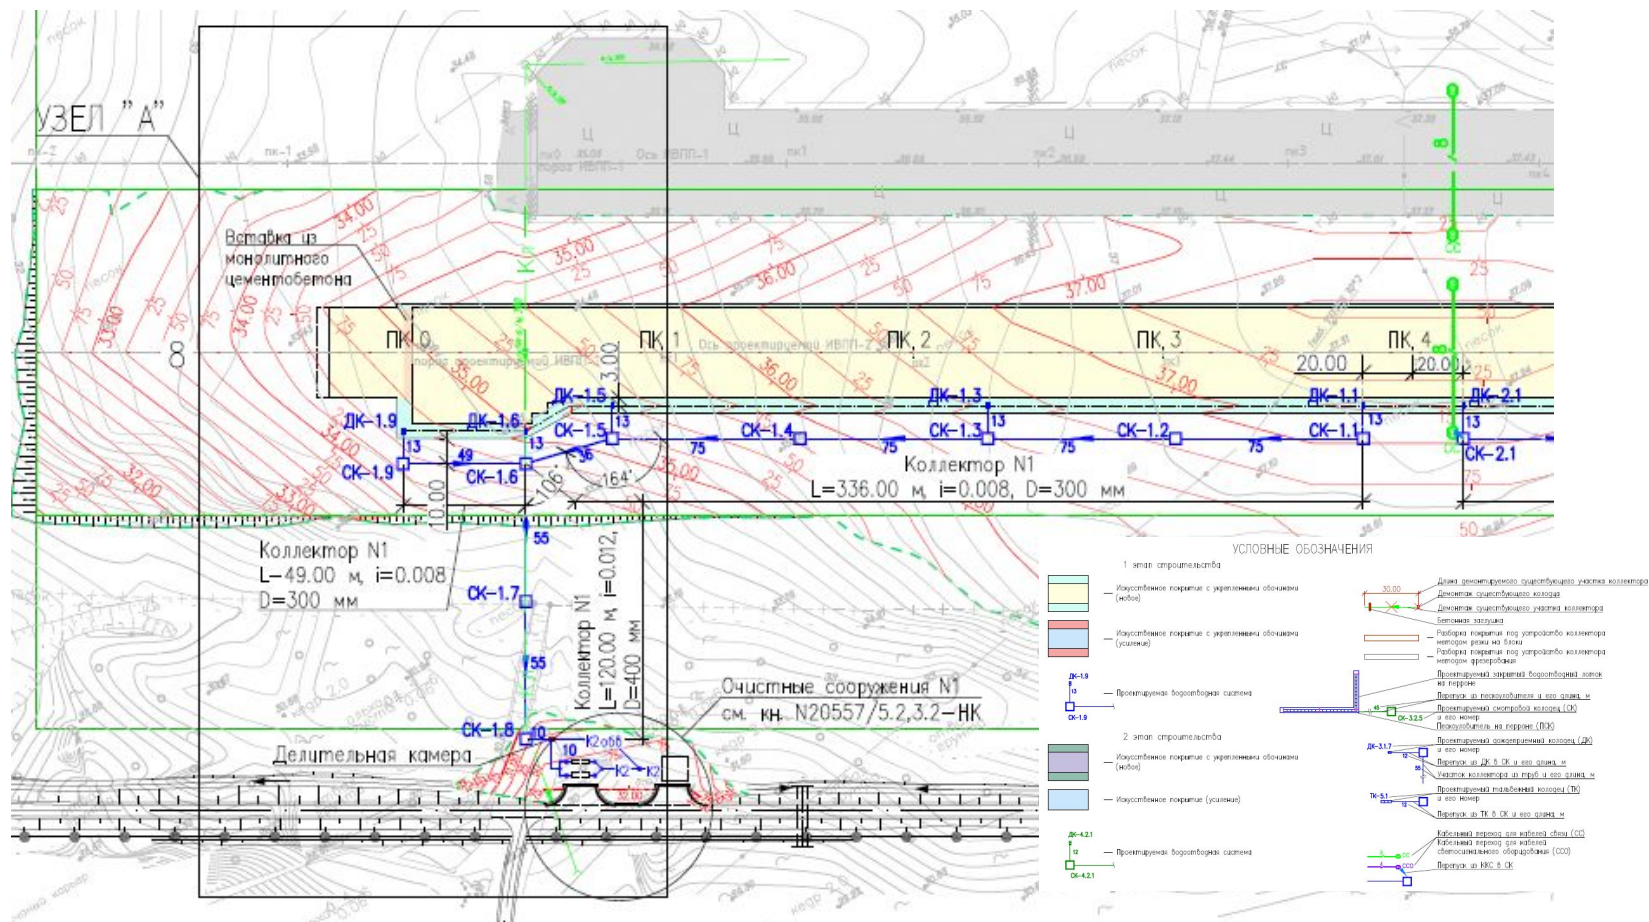

Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

Устройство смотровых колодцев (СК)



Армирование фундаментов ВДС СК 1.4

05.07.2020

Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

Устройство смотровых колодцев (СК)



Армирование фундаментов ВДС СК 1.3

05.07.2020

Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

Устройство коллектора из труб многослойных теплоизолированных (СК 1.3 – СК 1.4)



05.07.2020


Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

Устройство коллектора из труб многослойных теплоизолированных (СК 1.3 – СК 1.4)



05.07.2020

Кабельная канализация на перроне

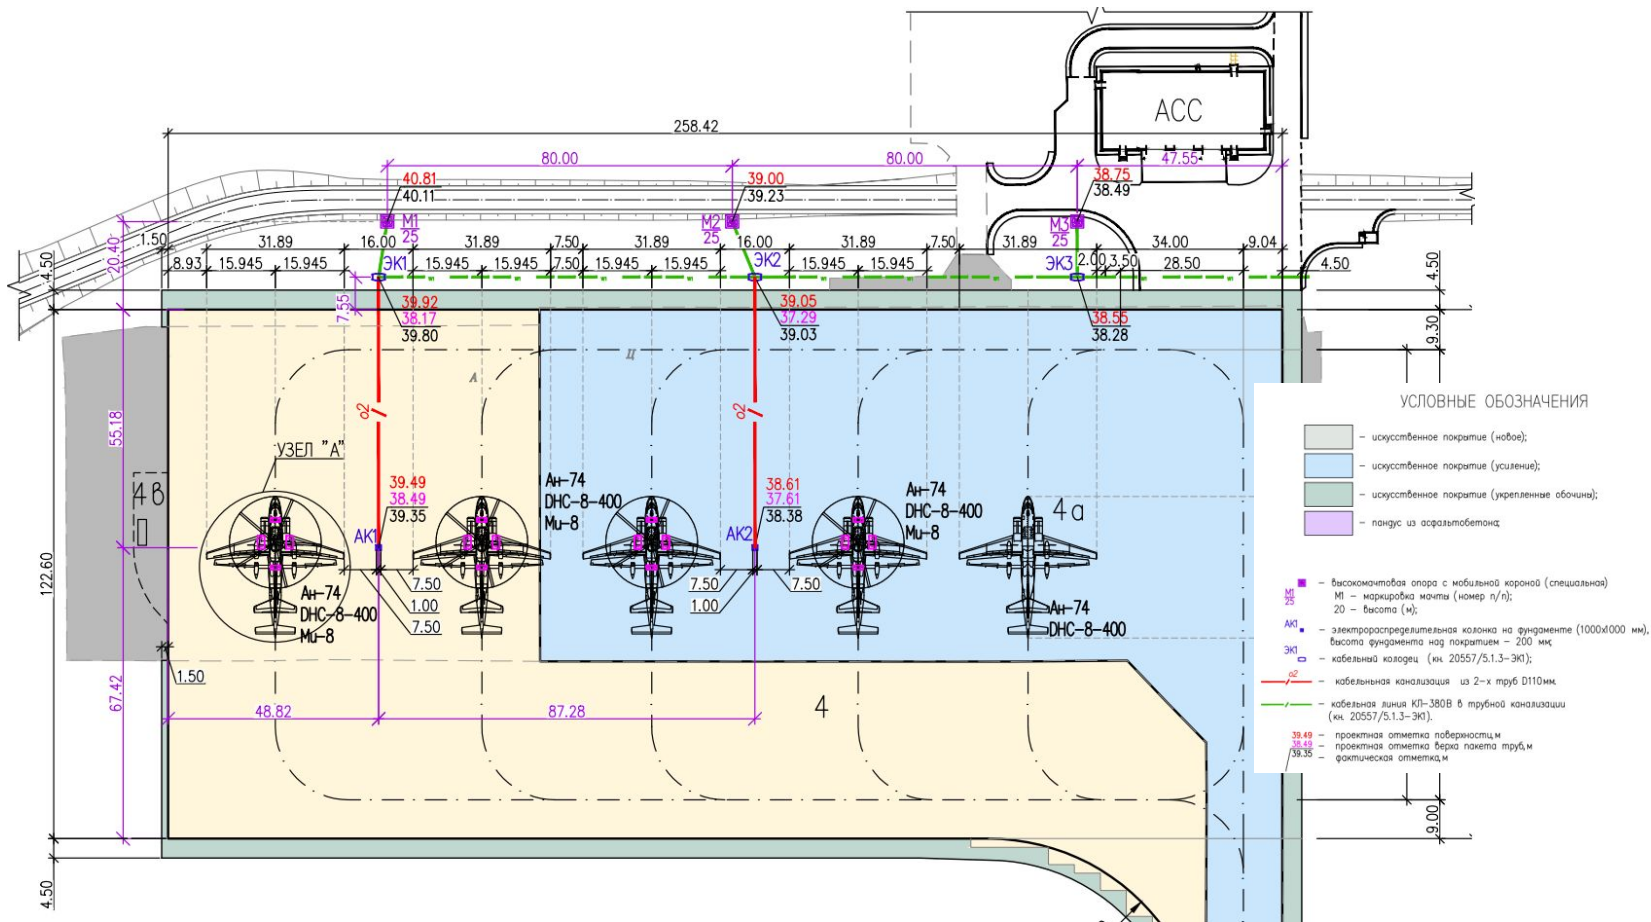

Кабельная канализация на перроне



Кабельная канализация.

05.07.2020

15

Кабельная канализация на перроне



Кабельная канализация.

05.07.2020


Устройство фундамента мачты М3.



05.07.2020

Патрульная автодорога (ГП № 70)

ПК 52 - ПК 54

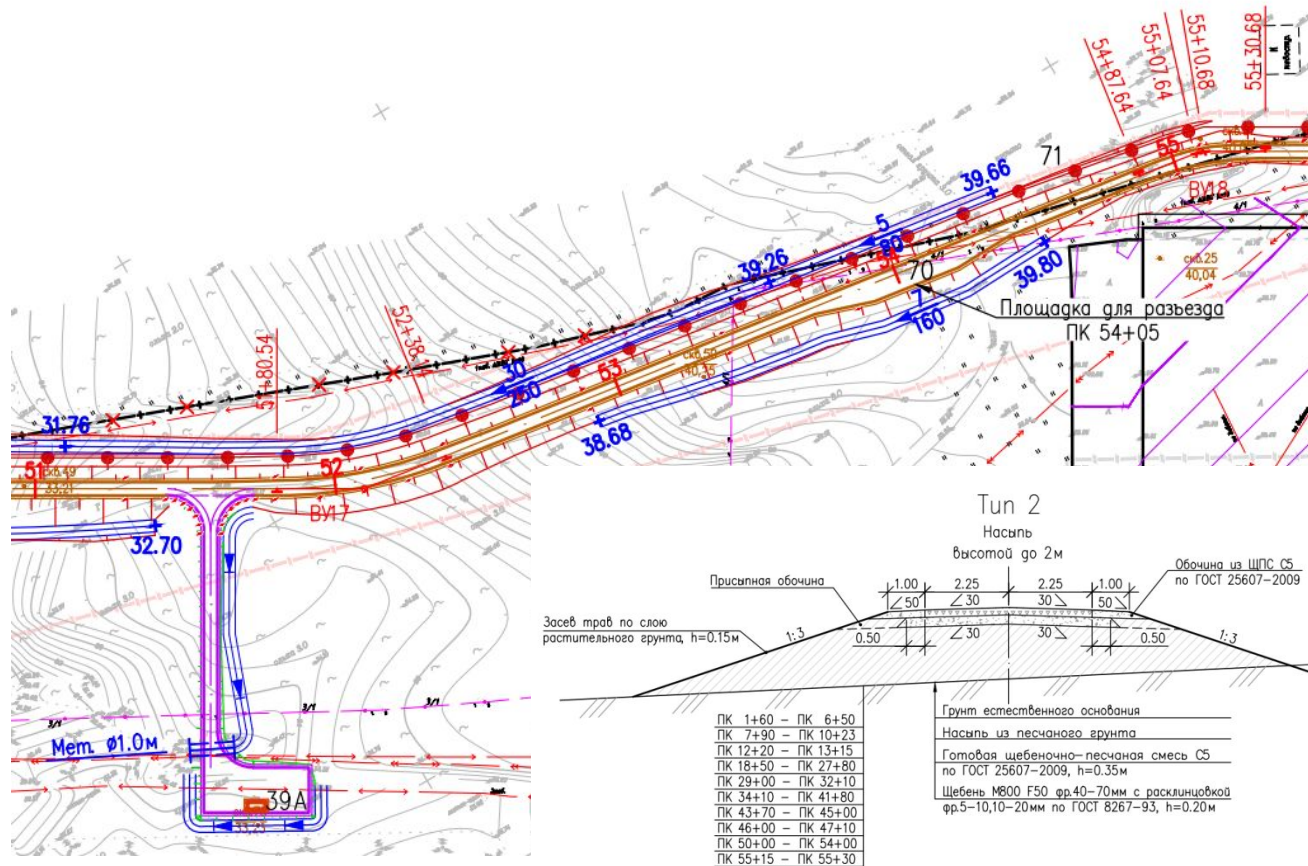

Патрульная автодорога (ГП № 70) ПК 54



Устройство насыпи из местного песчаного грунта

05.07.2020

Выявленные проблемы и пути их решения

- О дополнительных работах. В дополнение к письму № 125 от 29.05.2020 г. направлена на утверждение исполнительная схема производства укрепительных работ на участке патрульной дороги: ПК15+35 – ПК17+29 и локальный сметный расчет на произведенные работы.
- Отставание от графика выполнения работ по Аварийно-спасательной станции начало работ 01 июня 2020.

Ответ Подрядчика: На текущий момент, согласно графика, ведётся работа по закупке и поставке материалов для строительства АСС. Номенклатура материалов включает в себя более 1000 позиций. Начало поставки материалов к концу июля.

Отчет на 17:30, 05 июля 2020

ПОДГОТОВИЛ

Инженер по строительному контролю
филиалов «Аэропорт Оха», «Аэропорт Ноглики»



Фетисов В.А.
