

**Заказчик: АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»**

**Подрядчик: АО «ТРУД»**

**Контракт № 216-ПР/19 от 14.05.2019**

**Объект: : «РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМА ОХА»**


**ОТЧЕТ № 9**  
**О ходе выполнения работ**  
**на 05.07.2020 г.**

---

05.07.

# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

---

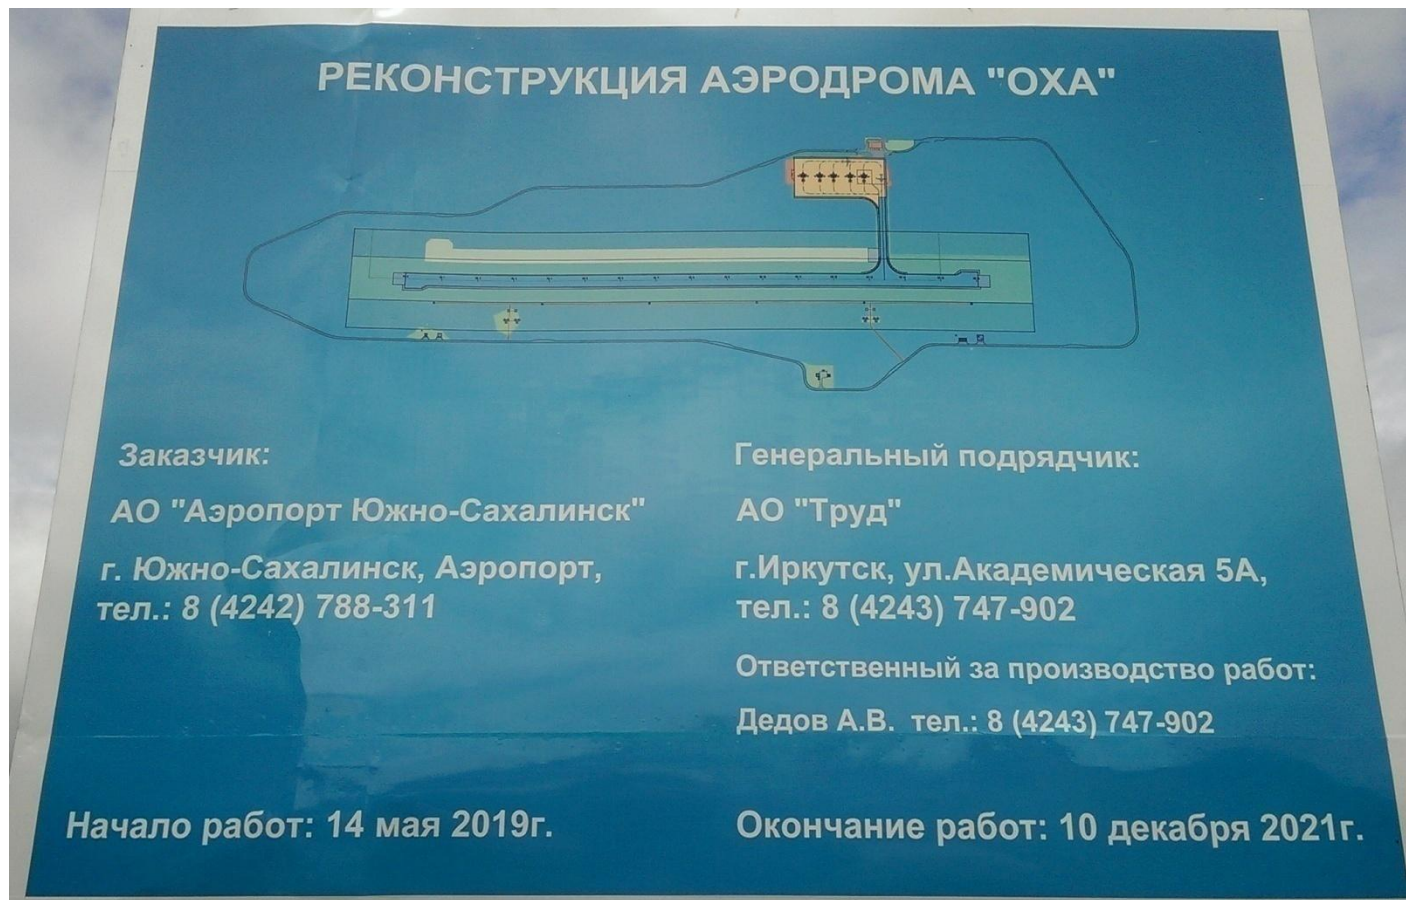

# ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ																							
1, 2 этап																							
№ пп	Номера сметных расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость СМР, в руб.	Стоимость услуг Технического заказчика, в руб.	2019 год					2020 год					2021 год								
					м	а	и	с	с	м	а	и	с	с	м	а	и	с	с				
1	2	3			м	а	и	с	с	м	а	и	с	с	м	а	и	с	с				
<b>1 ЭТАП</b>																							
4	02-01	Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием (ИВПП-2) (ГП № 6).	803 970 477,28	8 430 588,79																			
5	02-02	РД-А (ГП № 3)	97 885 322,77	1 026 444,29																			
6	02-08	Метеорологическое оборудование (ГП №№ 50,51)	34 105 986,47	357 641,92																			
7	02-11	Светосигнальное оборудование (ССО) (ГП № 39А)	62 879 538,40	659 366,91																			
8	02-12	Био-акустическая система отпугивания птиц (ГП № 11)	8 351 549,97	87 575,96																			
9	04-03	ЦРП (ГП № 38)	36 304 966,03	380 700,84																			
10	04-05	Сети электроснабжения 6 кВ	24 137 425,12	253 109,67																			
11	04-06	Сети электроснабжения 0,4-0,23 кВ	96 393 601,77	1 010 801,82																			
12	05-02	Внутрицеликоновые сети связи	60 715 814,46	636 677,69																			
13	05-03	Патрульная автодорога (ГП № 70)	279 305 434,01	2 928 850,41																			
14	06-03	Очистные сооружения № 1 (ГП № 36)	11 992 333,49	125 753,91																			
15	06-04	Очистные сооружения № 2 (ГП № 57)	36 962 020,31	387 590,84																			
16	07-01	Вертикальная планировка	134 981 279,13	1 415 439,61																			
17	07-02	Ограждение аэродрома (ГП № 71)	44 689 001,80	468 617,45																			





# План-график работ на июнь-октябрь 2020 г.

NN пп	Номера сметных расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость СМР, в руб.	Стоимость услуг Технического заказчика, в руб.	2019 год												2020 год																												
					май	июн ь	июл ь	авг ст	сеп тябр ь	окт ябрь	ноя брь	дек ябрь	ян врь	фев раль	март	апр ель	май	июн ь	июл ь	авг ст	сеп тябр ь	окт ябрь	ноя брь	дек ябрь																					
1	2	3																																											
<b>1 ЭТАП</b>																																													
4	02-01	Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием (ИВПШ-2) (ГП № 6).	803 970 477,28	8 430 588,79																																									
5	02-02	ВД-А (ГП № 3)	97 885 322,77	1 026 444,29																																									
6	02-08	Метеорологическое оборудование (ГП №№ 50,51)	34 105 986,47	357 641,92																																									
7	02-11	Светосигнальное оборудования (ССО) (ГП № 39А)	62 879 538,40	659 366,91																																									
8	02-12	Био-акустическая система отпугивания птиц (ГП № 11)	8 351 549,97	87 575,96																																									
9	04-03	ЦРП (ГП № 38)	36 304 966,03	380 700,84																																									
10	04-05	Сети электроснабжения 6 кВ	24 137 425,12	253 109,67																																									
11	04-06	Сети электроснабжения 0,4-0,23 кВ	96 393 601,77	1 010 801,82																																									
12	05-02	Внутриплощадочные сети связи	60 715 814,46	636 677,69																																									
13	05-03	Патрульная автодорога (ГП № 70)	279 305 434,01	2 928 850,41																																									
14	06-03	Очистные сооружения № 1 (ГП № 36)	11 992 333,49	125 753,91																																									
15	06-04	Очистные сооружения № 2 (ГП № 57)	36 962 020,31	387 590,84																																									
16	07-01	Вертикальная планировка	134 981 279,13	1 415 439,61																																									
17	07-02	Отраждение аэродрома (ГП № 71)	44 689 001,80	468 617,45																																									
<b>2 ЭТАП</b>																																													
18	01-01	Подготовительные работы	6 619 284,18	69 411,08																																									
19	02-03	Перрон. Площадка для обработки ВС ПОЖ (ГП № 4, 4а)	309 298 370,62	3 243 362,10																																									
20	04-04	ЦДЭС (ГП, № 38А)	20 721 648,83	217 291,19																																									


Численность персонала (ИТР и рабочих)  
Количество строительно-дорожных машин

---

4 - инженерно-технических работника  
15 - человек рабочих специальностей

8 - автосамосвалов  
4 - экскаватора  
3 - бульдозера  
2 – виброкатка  
1 – автогрейдер  
1 - асфальта укладчик

# Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

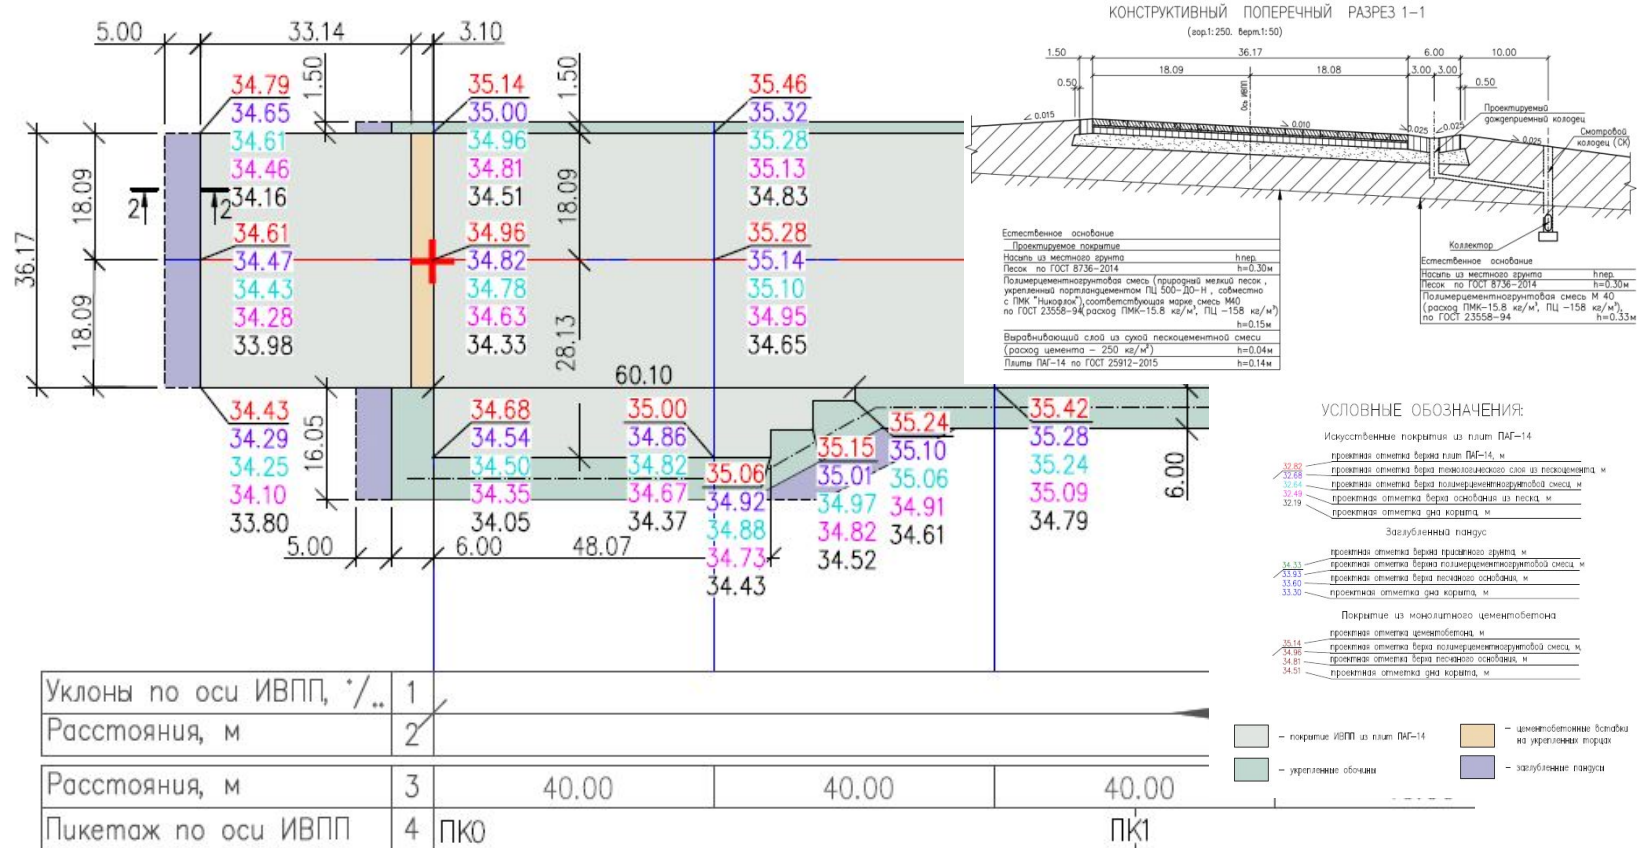

# Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

ПК 00 - ПК 01. Устройство основания на ИВПП из ЦПС с ПМК «Никофлок»  $h=0,15$  м.

---



Работы не велись метеоусловия (дождь)


Т/Х «Гранит» вышел из порта отгрузки, на борту ПАГ-14, 584 шт.

---



# Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

## Устройство смотровых колодцев (СК)

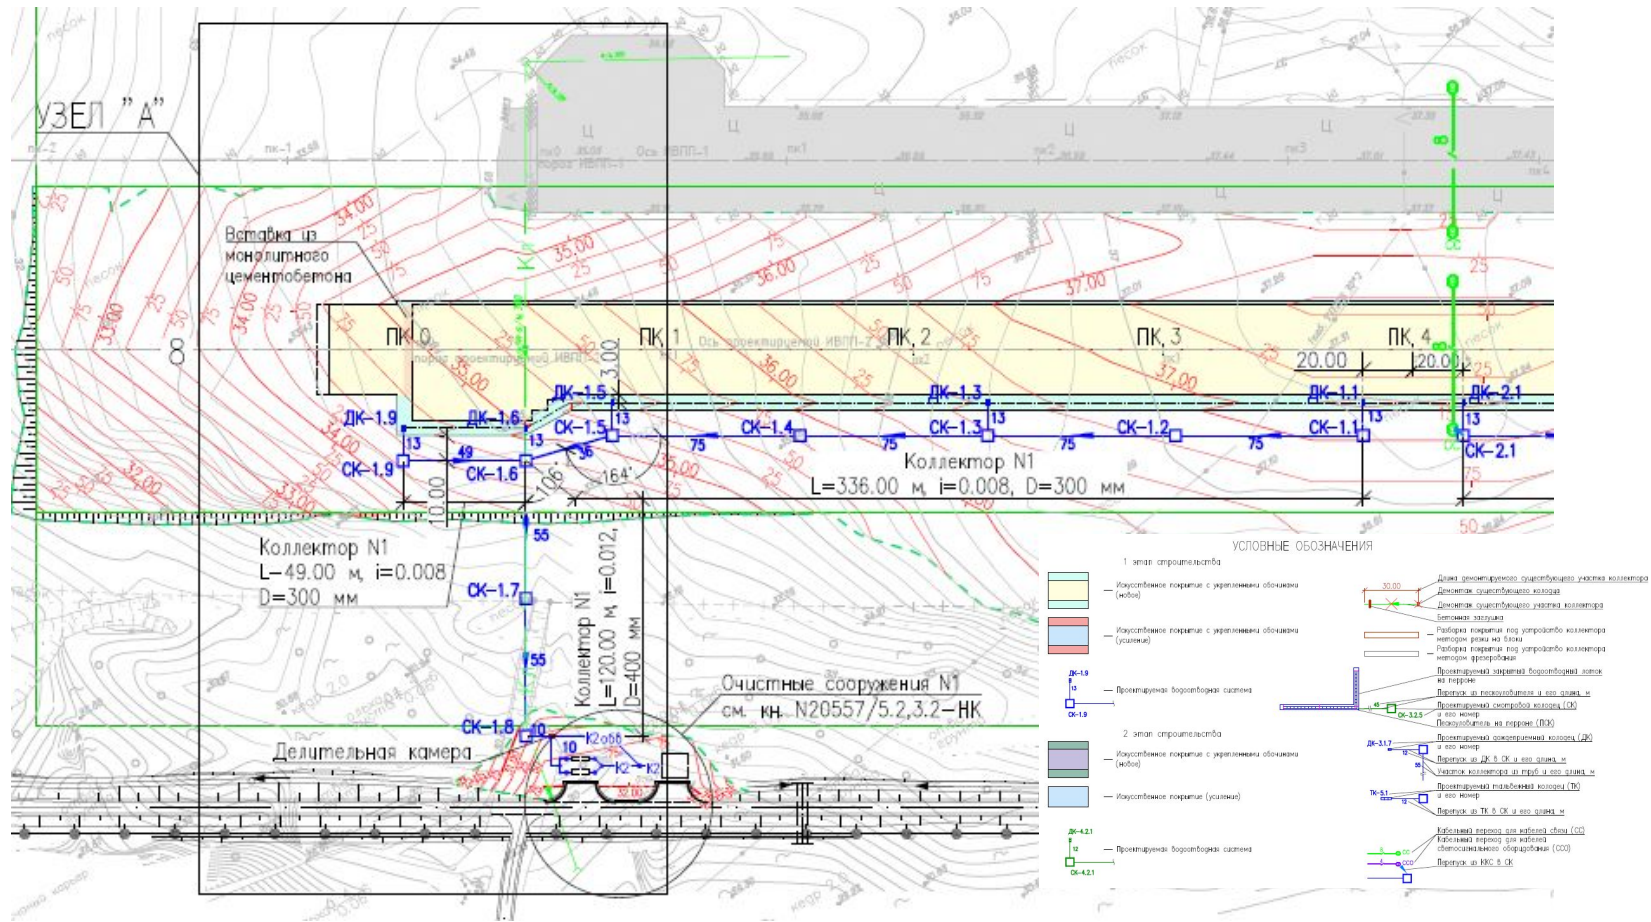

# Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

Устройство смотровых колодцев (СК)

---



Армирование фундаментов ВДС СК 1.4

---

05.07.2020



# Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

Устройство смотровых колодцев (СК)

---



Армирование фундаментов ВДС СК 1.3

---

05.07.2020

# Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

Устройство коллектора из труб многослойных теплоизолированных (СК 1.3 – СК 1.4)

---



---

05.07.2020

# Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием ИВПП-2

Устройство коллектора из труб многослойных теплоизолированных (СК 1.3 – СК 1.4)

---




---

05.07.2020



# Кабельная канализация на перроне

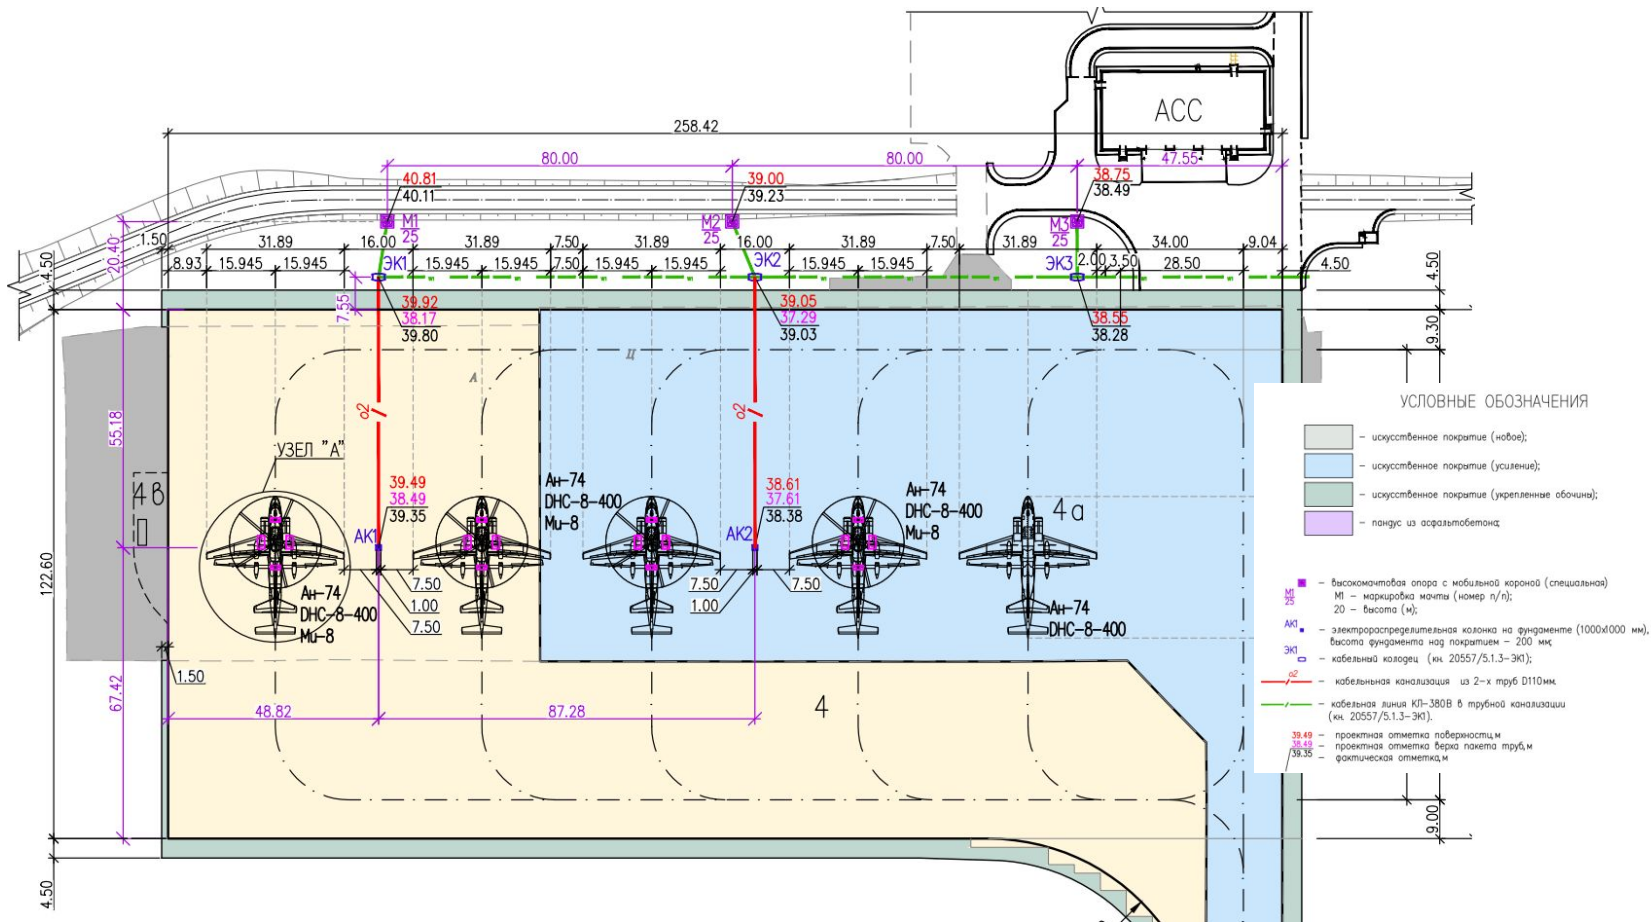

## Кабельная канализация на перроне

---



Кабельная канализация.

---

05.07.2020

15

## Кабельная канализация на перроне

---



Кабельная канализация.

---

05.07.2020



## Устройство фундамента мачты М3.

---




---

05.07.2020

# Патрульная автодорога (ГП № 70)

ПК 52 - ПК 54

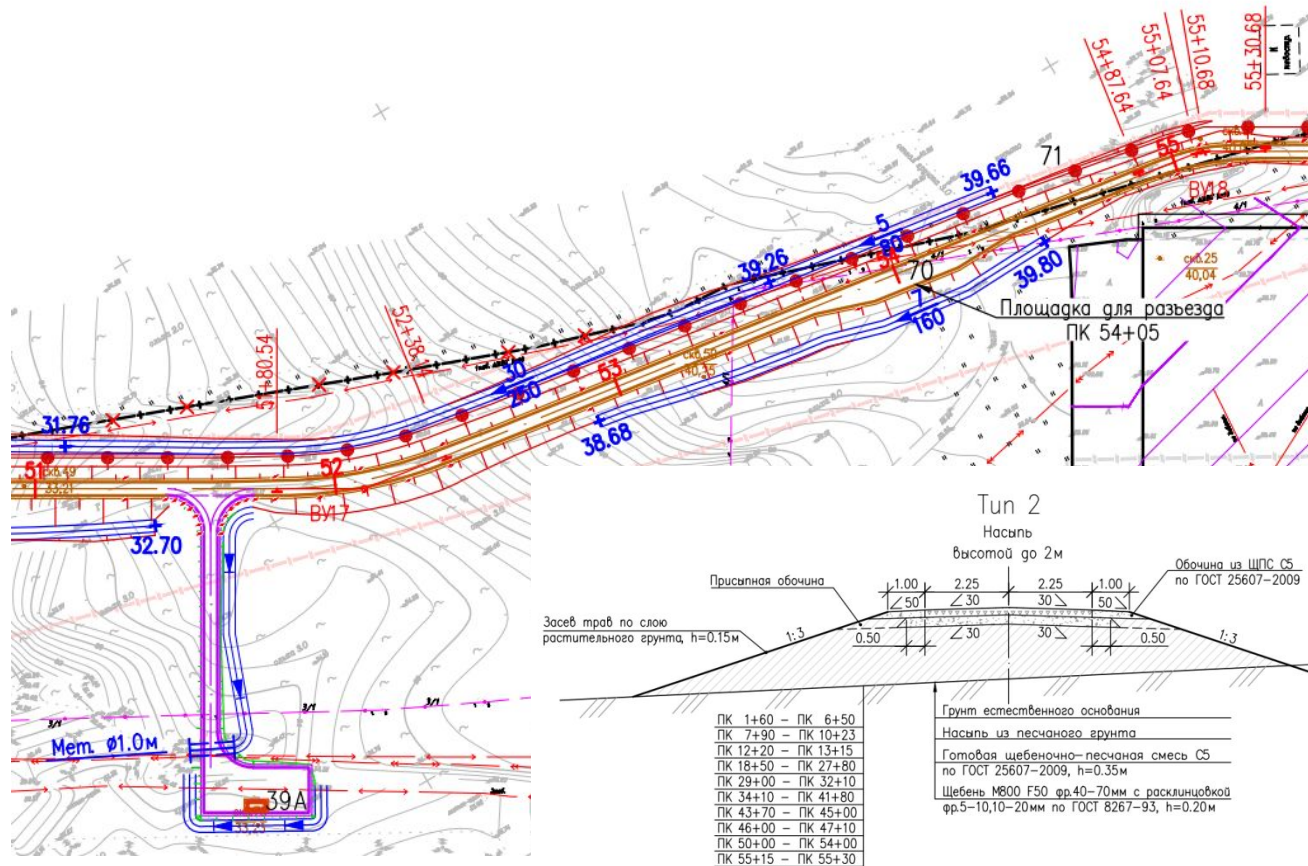



# Патрульная автодорога (ГП № 70) ПК 54

---



Устройство насыпи из местного песчаного грунта

---

05.07.2020

## Выявленные проблемы и пути их решения

---

- О дополнительных работах. В дополнение к письму № 125 от 29.05.2020 г. направлена на утверждение исполнительная схема производства укрепительных работ на участке патрульной дороги: ПК15+35 – ПК17+29 и локальный сметный расчет на произведенные работы.
- Отставание от графика выполнения работ по Аварийно-спасательной станции начало работ 01 июня 2020.

Ответ Подрядчика: На текущий момент, согласно графика, ведётся работа по закупке и поставке материалов для строительства АСС. Номенклатура материалов включает в себя более 1000 позиций. Начало поставки материалов к концу июля.

# Отчет на 17:30, 05 июля 2020

## ПОДГОТОВИЛ

---

Инженер по строительному контролю  
филиалов «Аэропорт Оха», «Аэропорт Ноглики»



Фетисов В.А.
