



## СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА КУЛЬСАРЫ-ТЕНГИЗ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)



Проект « Строительство Водовода Кульсары -Тенгиз (техническая вода) согласно проектному решению разделен на две очереди

I –очередь: Строительство линейной части с узлами учета потребителей.


II-очередь: Резервуарный парк с насосной станцией, автоматика, электроснабжение.



# Строительство Водовода Кульсары-Тенгиз (техническая вода).

## I – очередь.

## ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

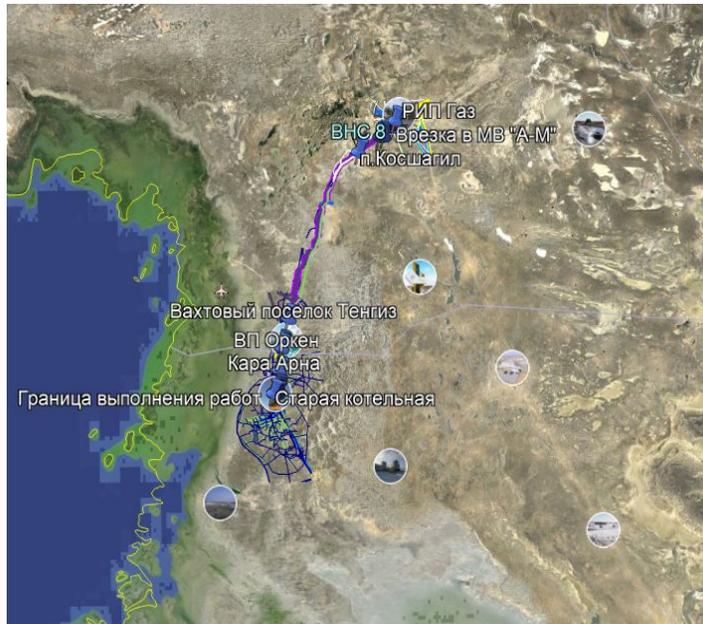

**Проект: «Строительство водовода Кульсары-Тенгиз  
(техническая вода)»**

**Заказчик:**

**АО «КазТрансОйл»**

**Финансирующая сторона:**

**ТОО «Тенгизшевройл»**

**Подрядчик:**

**ТОО «GAZ stroy montazh KZ»**

**Диаметр трубы: 530 мм.**

**Протяженность: 104,3 км.**

**Мощность: 13200 м3 в сутки.**

**Начало строительства: Июль 2018г.**

**Окончание строительства: Декабрь 2019 г.**

**Ответственный: Руководитель проекта Ибраев Б.Ж**

**Тел. конт. +7 (7122) 315920, 315916**





На сегодняшний день 100% сварка и укладка трубы завершена.

Проводятся работы по устройству линейных и корневых колодцев, камер узлов учета потребителей.

Из них:

Узлы учета потребителей выполнены -35%

Колодцы с выпуском в дренажный -50%

Колодцы с вантузом -75%

Колодцы с манометром -85%

Линейная трубопроводная арматура -40%

Полностью планируются завершение к 15 августа 2019г.





Проводятся работы на линейных и корневых колодцах по установке запорной арматуры.

Линейная трубопроводная арматура выполнена на 40%

Полностью планируются завершение к 15 августа 2019г.





### ЭХЗ

Проводятся работы по электрохимзащите линейной части водовода.

На сегодняшний день работы выполнены на 55%

Полностью планируются завершение к 15 июня 2019г.





## КПСОД

Идут подготовительные работы по устройству Камеры приема скребка на зоне.

Прибыли материалы на фундамент.

Камера приема скребка и емкость на 16м3.

Полностью планируются завершение к 15 июля 2019г.



### Узел врезки Астрахань-Мангышлак

Получены разрешение и утвержден ППР на обследование трубы и врезки в магистральный водовод.

Прибыли материалы 325 труба, отводы, тройники, эл изолирующая вставка, переходы.

Запорная арматура имеется в наличии.

Полностью планируются завершение к 1 июля 2019г.





### Укладка геосетки .

Проводятся работы по укладке на обваловках сорových участков противоэрозийной геосетки

Работы выполнены на 50%.

Полностью планируются завершение к 15 июня 2019г.





Работы по очистке полости трубы,заполнение и гидротест.

Проведены работы по очистке полости трубы 0-38км линейной части. Заполнена водой и проведен гидротест.

Линейная часть поделена на три участка.

1. 0-38 км –работы завершены.
2. 38-74км –работы будут начаты после прохождения переходов КТК.
3. 74-104км – тоже самое.

Полностью планируются завершение к 1 июля 2019г.



Работы по переходам ЖД, автодорог, КТК.

Проведены работы по пересечениям методом ГНБ.

Остались переходы КТК.

На данном этапе все разрешения получены и ведутся работы по прохождению а так же работы по водопонижению.

Полностью планируются завершение к 22 июня 2019г.





На пикете 742 произведен прокол ГНБ.

Проташен футляр 820.



# II –очередь.

## ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

Проект: «Строительство водовода Кульсары-Тенгиз (техническая вода)»  
Насосная станция и резервуарный парк



Заказчик:

АО «КазТрансОйл»

Финансирующая сторона:

ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик:

ТОО «GAZ stroy montazh KZ»

Начало строительства: Январь 2019г.

Окончание строительства: Декабрь 2019 г.

Ответственный: Руководитель проекта Ибраев Б.Ж

Тел. конт. +7 (7122) 315920, 315916





Дан старт строительству ВНС и Резервуарного парка.  
Отсыпка площадки резервуарного парка завершена.  
Ведутся работы по устройству фундаментов под РВС.





Ведутся работы по устройству ЖБИ резервуаров, строительство узлов учета. Подготовка фундаментов под насосные станции, площадка камеры запуска скребка.

Работает лаборатория по проверке качества бетона.





В линейной части ведутся работы по устройству фундаментов под блок боксы и опоры для подвода электричества.

Устанавливаются блок боксы для автоматике узлов учета потребителей.





Заказаны материалы длительного изготовления по второй очереди. Это РВС, насосная станция, оборудования для связи и автоматики и многие другие.

На данном этапе производятся поставки первые партии материалов и оборудования.





Ведутся работы по прокладке футляров под кабель ВОЛС, а также установки сигнальной ленты.



Данная презентация подготовлена с целью  
ознакомления процессом строительства водовода  
Кульсары –Тенгиз (техническая вода).

**Благодарим за внимание.**

