## Строительство объекта «Завершение строительства медицинского училища на 300 мест со спортзалом» Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Карла Маркса и лейтенанта Шмидта

Застройщик (Заказчик)	Подрядчик	Адрес объекта	Площадь (тыс. кв. м.)	Кол-во мест	Дата выдачи РС	Срок действия РС	Кол-во провед енных провер ок	Работы, подлежащие завершению, неснятые замечания	Прогноз завершения строительн ых работ (месяц, год)	Кол-во рабочих на объекте (чел.)	Кол-во строитель ной техники на объекте (шт.)	Общая готовность объекта, %
Министерство строительного комплекса Московской • Эбааты строи. 1. Подготови 2. Общестро 3. Общестро	тельные р ительные р	аботы работы ниж			27.07.2018	31.12.2019	16	Не завершены работы по внутренней отделке помещений, монтажу внутренних и наружных сетей, благоустройс тву. Низкий темп строительства	февраль 2020	36	0	80

- 4. Общестроительные работы выше отметки 0.00 ограждающие конструкции
- 5. Общестроительные работы выше отметки 0.00 перегородки, отделка
- 6. Работы при устройстве внутренних инженерных систем
- 7. Технологическое и немонтируемое оборудование
- 8. Работы при устройстве наружных сетей
- 9. Благоустройство

Виды работ для объекта «Завершение строительства медицинского училища на 300 мест со спортзалом»	Готовность, % (при наличии данных работ в проекте, при отсутствии ставить «-»)		
1. Подготовительные работы	100		
2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00	100		
3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 – несущие конструкции	80		
4. Общестроительные работы выше отметки 0.00 – ограждающие конструкции	85		
5. Общестроительные работы выше отметки 0.00 – перегородки, отделка	70		
6. Работы при устройстве внутренних инженерных систем	70		
7. Технологическое и немонтируемое оборудование	0		
8. Работы при устройстве наружных сетей	80		
9. Благоустройство	70		




Центральный фасад, общая готовность - 80%



• Общестроительные работы выше отметки 0.00 – ограждающие конструкции 85%, благоустройство - 70%.



• Общестроительные работы выше отметки 0.00 – ограждающие конструкции 85%, благоустройство - 70%.

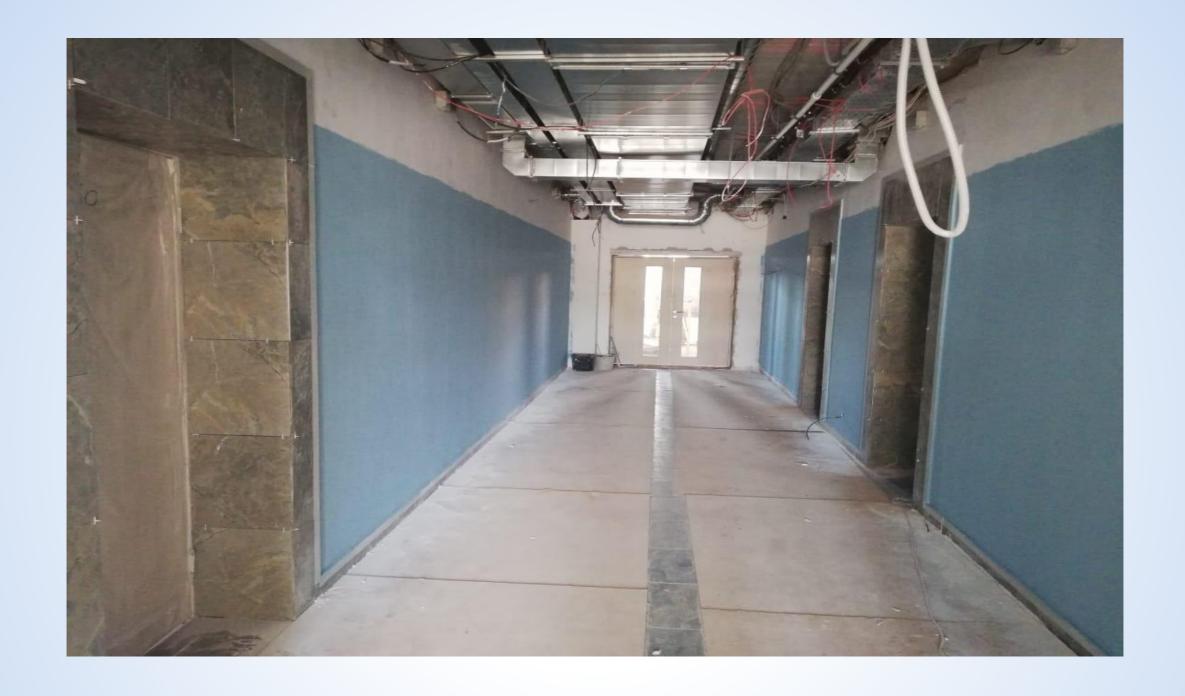

• Общестроительные работы выше отметки 0.00 – перегородки, отделка - 70%, работы при устройстве внутренних инженерных систем - 70%



• Работы при устройстве внутренних инженерных систем - 70%



• Работы при устройстве внутренних инженерных систем - 70%



• Работы при устройстве внутренних инженерных систем - 70%
