Вторая очередь строительства комплексной жилой застройки: 5- ти секционный жилой дом № 3 с сетями инженерно-технического обеспечения, 4-х секционный жилой дом № 5 с сетями инженерно-технического обеспечения, 4-х секционный жилой дом № 6 с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка. 1-ый пусковой комплекс – Жилой дом №3, сети инженернотехнического обеспечения; 2-ой пусковой комплекс – Жилой дом №5, 6 со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения, сети инженернотехнического обеспечения

Застройщик: ООО ""СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАЗВИЛКА"

Подрядчик: АО "МСУ-1"

Срок действия РС: 13.06.2021

Общая готовность объекта: 90%

Площадь (кв.м.): 59696,2

Кол-во рабочих на объекте (чел.): 470

Кол-во строительной техники на объекте (шт.): 20


Прогноз завершения строительных работ: январь 2021

Проблематика на 15.12.2020

Незавершенные работы

- Не завершены работы по устройству фасада;
- Не завершены работы по благоустройству территории.
- Не завершены монтажные работы сантехнического и вентиляционного оборудования, слаботочных систем, систем электроснабжения, противопожарных систем.
- Не завершены пусконаладочные работы.;
- Не завершены работы по отделке внутренних помещений;

При данной динамике строительства на объекте прогноз по завершению работ ориентировочно январь 2021г.

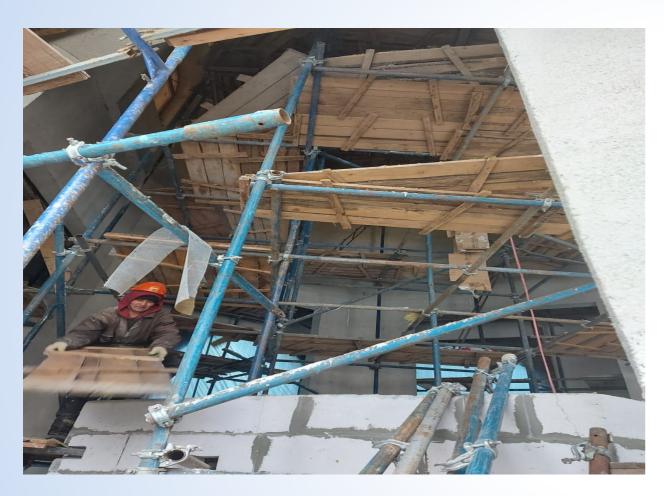





Корпус №3. Не завершены работы по устройству фасада.





Корпус №3. Не завершены работы по благоустройству территории.

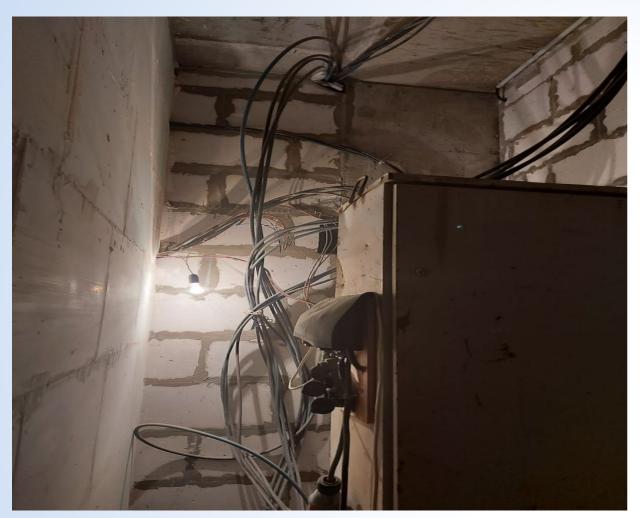

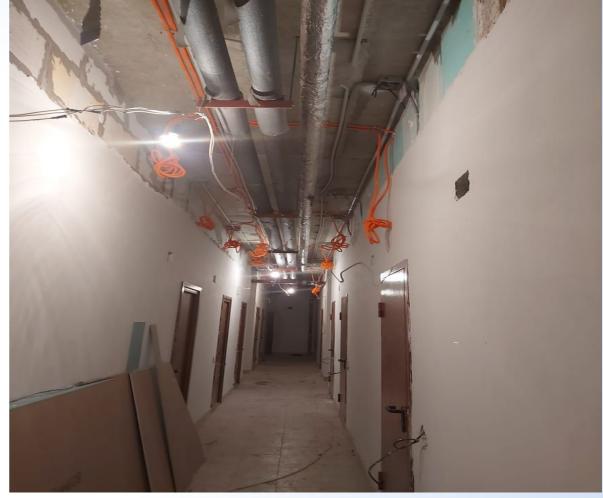

Корпус №3. Не завершены монтажные работы сантехнического и вентиляционного оборудования, слаботочных систем, систем электроснабжения, противопожарных систем.





Корпус №3. Не завершены пусконаладочные работы.





Корпус №3. Не завершены работы по отделке внутренних помещений .






Корпус №5. Не завершены работы по устройству фасада.





Корпус №5. Не завершены работы по благоустройству территории.

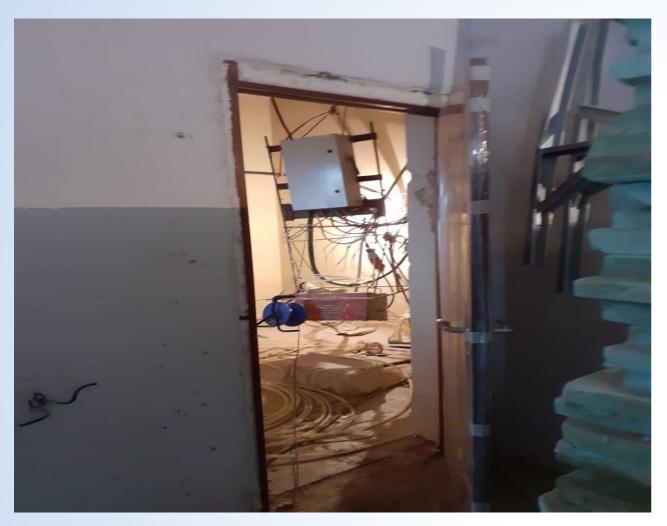



Корпус №5. Не завершены монтажные работы сантехнического и вентиляционного оборудования, слаботочных систем, систем электроснабжения, противопожарных систем.






Корпус № 5. Не завершены пусконаладочные работы.






Корпус №5. Не завершены работы по отделке внутренних помещений .

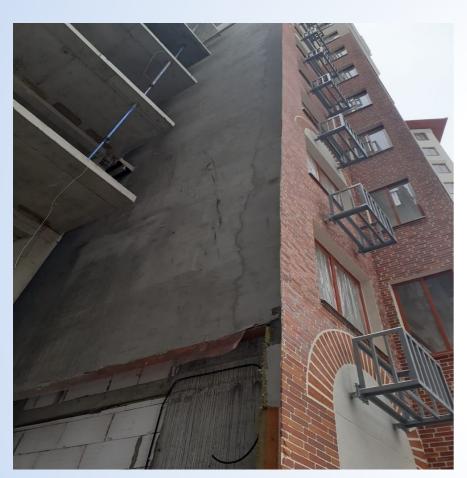



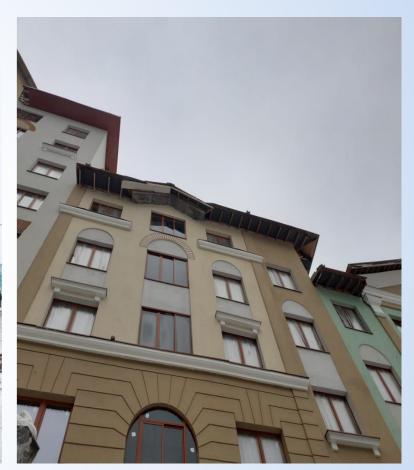


Корпус №6. Не завершены работы по устройству фасада.





Корпус №6. Не завершены работы по благоустройству территории.

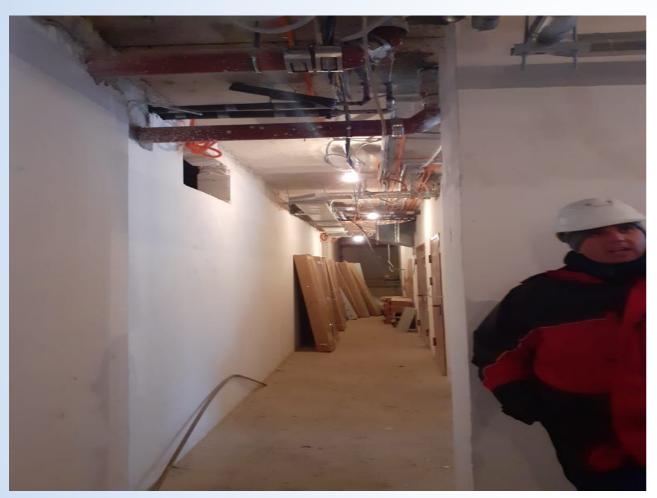



Корпус №6. Не завершены монтажные работы сантехнического и вентиляционного оборудования, слаботочных систем, систем электроснабжения, противопожарных систем.





Корпус № 6. Не завершены пусконаладочные работы.





Корпус №6. Не завершены работы по отделке внутренних помещений .
