


1. Отчет по мобилизации и монтажу МБУ-200


Время на мобилизацию и монтаж бурового оборудования

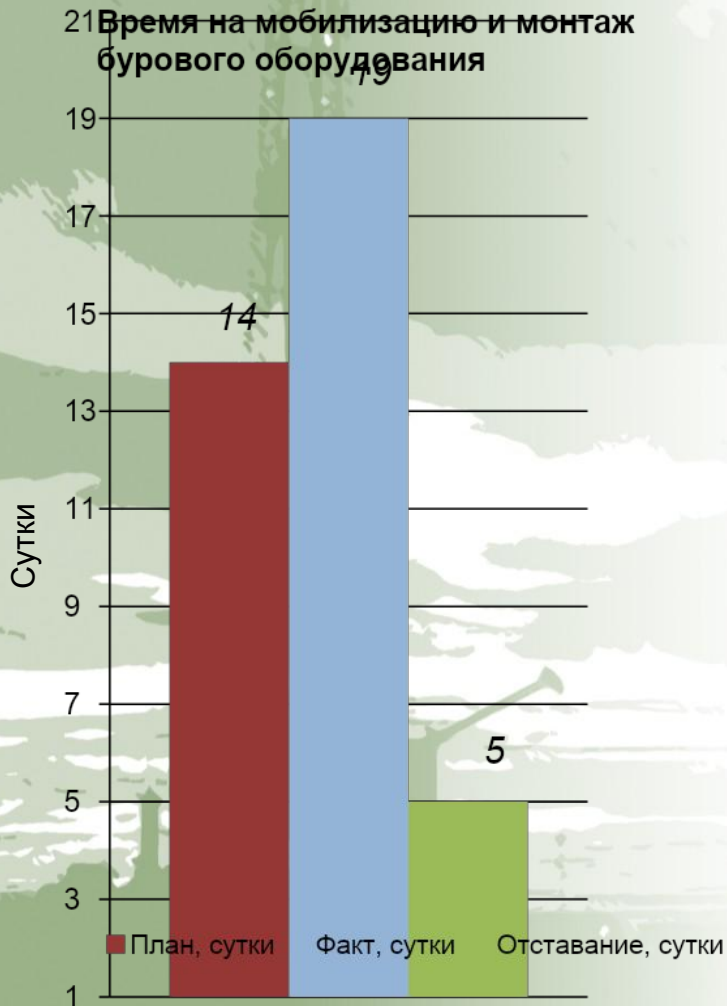

Причины отставания:

1. 21.02.2019 года были приостановлены работы крановой техники, передвижение спец. техники между кустовыми площадками, огневые работы в виду ожидания прибытия комиссии АО «Зарубежнефть» и генерального директора ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»;
2. 23.02.2019 года работы крановой техники были приостановлены в виду неблагоприятных погодных условий ($t = -17^{\circ} \text{C}$, ветер 13 м/с с порывами до 16 м/с, видимость менее 10м);
3. Неготовность кустовой площадки №3 Западно-Хоседаюского месторождения к установке котельной и склада ГСМ;

2. Отношение непроизводительного времени к производительному

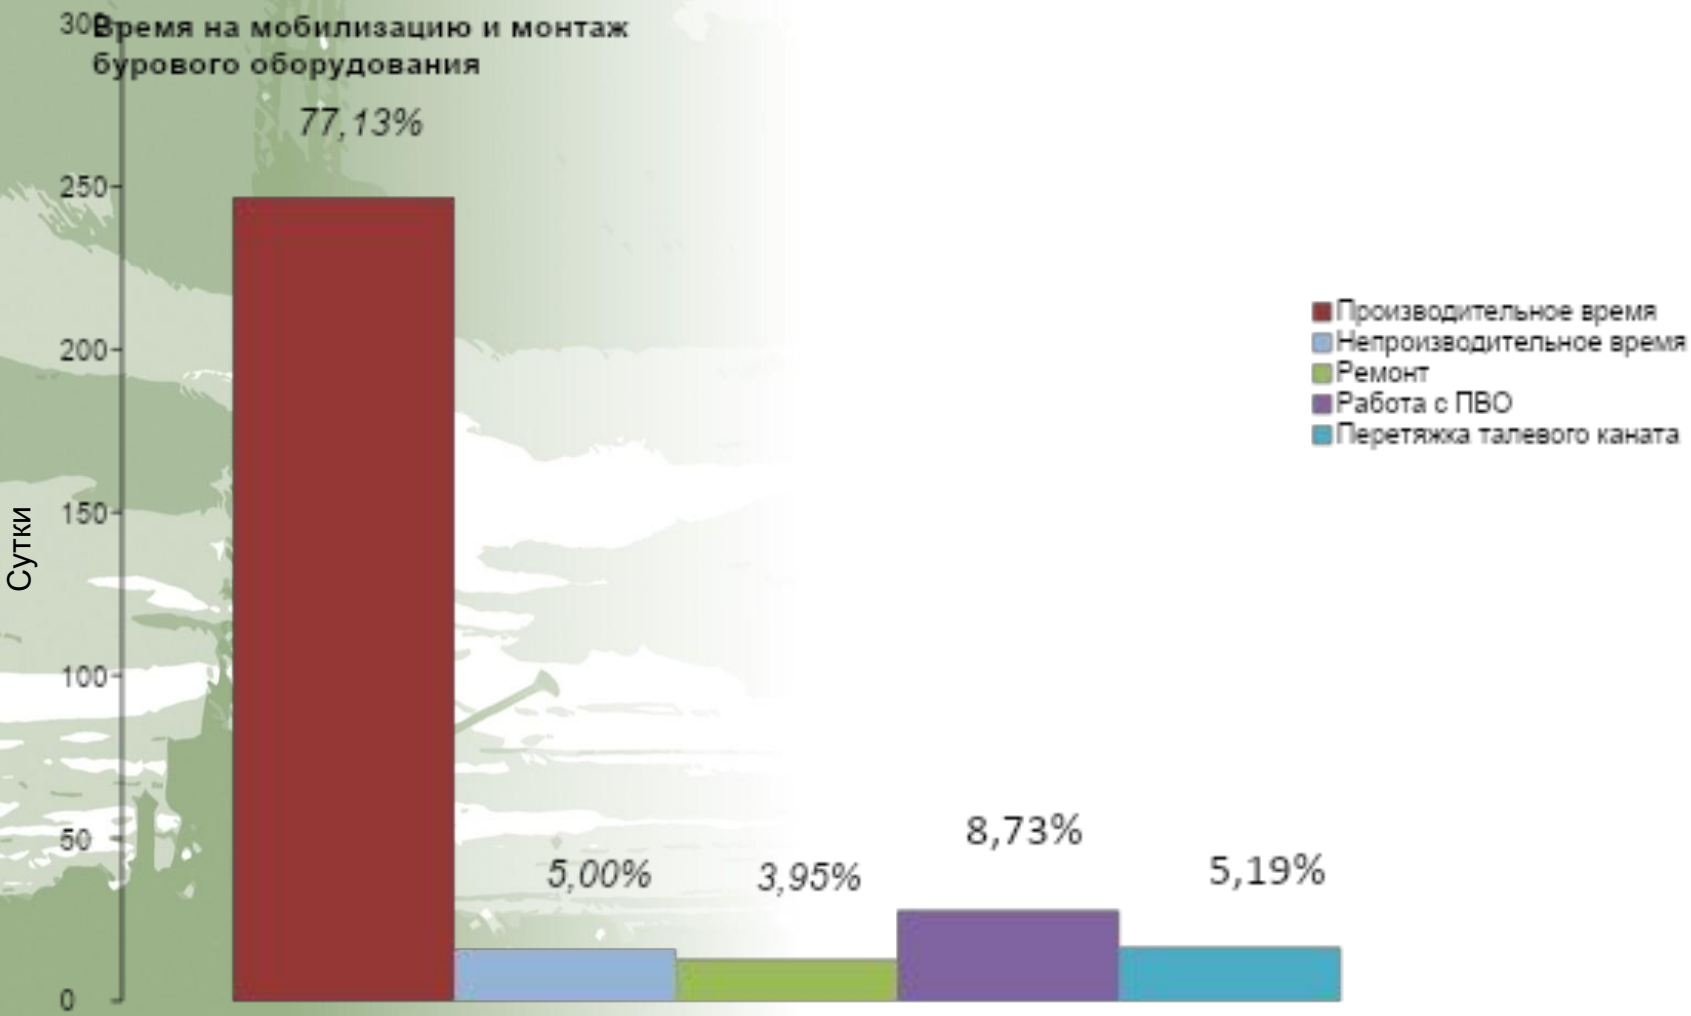

3. Прочее непроизводительное время при строительстве скважины №3301 куст №3

К прочим работам относятся:

1. Демонтаж и монтаж циркуляционного патрубка и желобной системы – 4,33 часа.
2. Работы по опрессовке и продувке манифольда – 5,71 часа.
3. Запуск насоса прокачка раствора ДЗУ – 0,42 часа.
4. Промывка, настройка системы циркуляции – 0,75 часа.
5. Центрация и чистка гидравлического ключа ГКШ-1800 – 0,83 часа.
6. Проведение УЗД СБТ-89*9,35 – 2,33 часа.
7. Откачивание и вывоз технической воды из ЦСГО чистка емкостей – 1,66 часа.
