



# Горячев Сергей

# Проверка бетонного узла

ЧЕК ЛИСТ , ВЫБОР ПОСТАВЩИКА БЕТОНА .					
				Дата вы	20072020
				ФИО.До	Шальнов СА
Перечень , требований :	Категория 1	Категория 2	Категория 3	Комментарии к возможной оценке.	Примечание
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ , заполняет ОС				РБУ Вектор	
АДРЕС РБУ Завода, заполняет ОС				Нижегородская область г Бор Ул Нахимова 78 в	
Производитель бетона: БСТ В 25 , П-4 , F 150 , W 6 на гранитном щебне .	V				
Производство сваи, сечение 150,200 длина до 6мп			V		
Договор поставки (Поставщика)заполняет ОС				1кат. Договор поставщика максимально согласованный с нашими требованиями 2кат. Договор поставщика 3кат. Ничтожные договора без гарантий поставщика	в процессе согласования
Возможность электронного документооборота С.Ф. , Т.Н. в программе СБИС++, провайдер ТЕНЗОР .	V			1кат. ДА , 2кат. Нет, 3кат проблемная передача документов.	
Количество собственных РБУ	V			1кат. один и более РБУ , 2 кат. один и более РБУ , 3кат. Аренда завода.	
GPS координаты РБУ или точный адрес	V			1кат. ДА , 2кат. Нет, 3кат. Отсутствие точных данных	
Время работы на рынке производства и продажи бетона.	V			1кат. Более 5 лет, 2кат. Более 3 лет , 3 кат. менее года.	
ОКВЭД (общероссийский классификатор видов ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)				1 кат. 26 код производителя по нескольким позициям 2 кат. 26 код только по одной позиции 3кат. Отсутствие кода производителя .	
ОКФС (Общероссийский Классификатор формы Собственности)				1кат. собственник 2кат. Аренда 3кат. Отсутствие данных.	

Свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе , Устав , Выписки из ЕГРЮЛ , Копия налоговой декларации по НДС за последний отчетный период , Документы, подтверждающие право на осуществление определенных видов деятельности (свидетельства, лицензии), выписка росстата.				Обязательное для всех.	
Оборудование для производства (марка , автоматизация линий производства )		V		1кат. Высокотехнологичные автоматизированные линии импортного производства 2кат. Отечественного производства 3кат. Отсутствие информации	
Наличие собственной лаборатории , контроля качества бетона.	V			1кат. Собственная лаборатория 2кат. Сторонняя лаборатория 3кат. Отсутствие лаборатории	
Документы подтверждающие , аттестацию лаборатории .	V			1кат. Документы подтверждающие аттестацию лаборатории и виды испытаний 2кат. Сторонняя лаборатория по договору 3кат. Отсутствие лаборатории	
Паспорта качества бетона по ГОСТ 7473-2010	V			1кат. Паспорт по ГОСТ 7473-2010 с заполнением всех пунктов. 2кат. По ГОСТ 7473-2010 с заполнением не всех пунктов. 3кат. Не по ГОСТ	
Наличие действующих сертификатов на продукцию	V			1кат. несколько 2кат. один	
Стоимость бетона БСТ В 25 , П-4 , F 150 , W 6 на	V				
Стоимость ПМД (противоморозные добавки)	V				
до -5 , руб.	V				
до -10 , руб.	V				
до -15 , руб.	V				
Наличие собственных , наемных АБС .	V			1кат. Собственные и	
АБС от м3 до 6 м3				1кат. Широкая линейка от	
Количество АБС		V		1кат. От 25 и более 2 кат. До	
Стоимость доставки руб./м3					

1.Возможность электронного документооборота					
2.Количество собственных РБУ					
3.Координаты GPS , точный адрес РБУ					
4.GPS контроль АБС на линии , пломбировка АБС , весовой контроль загрузки на заводе .					
5.Время заявки на бетон, время отказа от заявки					
6.Корпоративные телефоны , эл. адреса , сайт компании					

# Проверка бетонного узла



# Карта бетонных узлов

## Карта

Поиск мест и адресов

РБУ


Создать новую карту

Последнее обновление: 14 октября

- АБН32-52мл.линейный**  
 ООО ЦСМ, база Строино.8-999-199-04-27  
 виталий
- «ЭЛПРА»**  
 Тверская область, Вышний Волочёк, посёлок  
 Приозёрный, beton\_uok@mail.ru +7 (910) 530-  
 16-28,+7 (920) 684-29-82 Бухг - Светлана +7  
 (910) 640-92-00 Гиви Николаевич - менеджер
- Вектор**  
 Солнечногорск, Красная улица, 7, 8 (499) 955-  
 48-91 BETONVEKTOR-GOS@YANDEX.RU
- ЕвроМастер**  
 Чехов, деревня Кузмино-Филчаково  
<http://tom-bus.ru>, +7 965 170-33-33 Инет  
 отзывы-плохие, не доливает, кач-во под ?  
 (санников спросил про РБУ)
- КРИСТАЛЛ** ИНН 6915015927  
 Тверская область, Торжок, улица Мира, 52  
 12окт20@ФРИСЭВ-сорт,  
 kompanykrystal@mail.ru Марина Диск 8-915-  
 745-77-77 Телефоны офиса 8 (48251) 9-77-10
- ТДС МОНОЛИТ** инн 6915015525  
 Тверская область, Торжок, Старицкая улица,  
 96А 12окт20@ФРИСЭВ-сет на балансе ТС, 1 чел  
 численность/запрос подтв. сделки Алексей 8-  
 910-930-03-09, rskmopolit69@mail.ru Телефон:  
 8-910-647-53-30 Режим работы: пн-пт с 8:00 до  
 17:00 Отгрузка Бетона: пн-сб с 8:00 до 20:00 8-  
 48251-9-48-32, 8-910-647-53-30.
- СтройЭкспертиза**  
 Санкт-Петербург, Свердловская набережная,  
 14/2 (приезжать за специалистом )  
<https://www.stroyeksp.ru/>  
 stroyeksp@yandex.ru 8 (812) 448-55-88, 8 (812)

Яндекс

# Аттестация ОТН

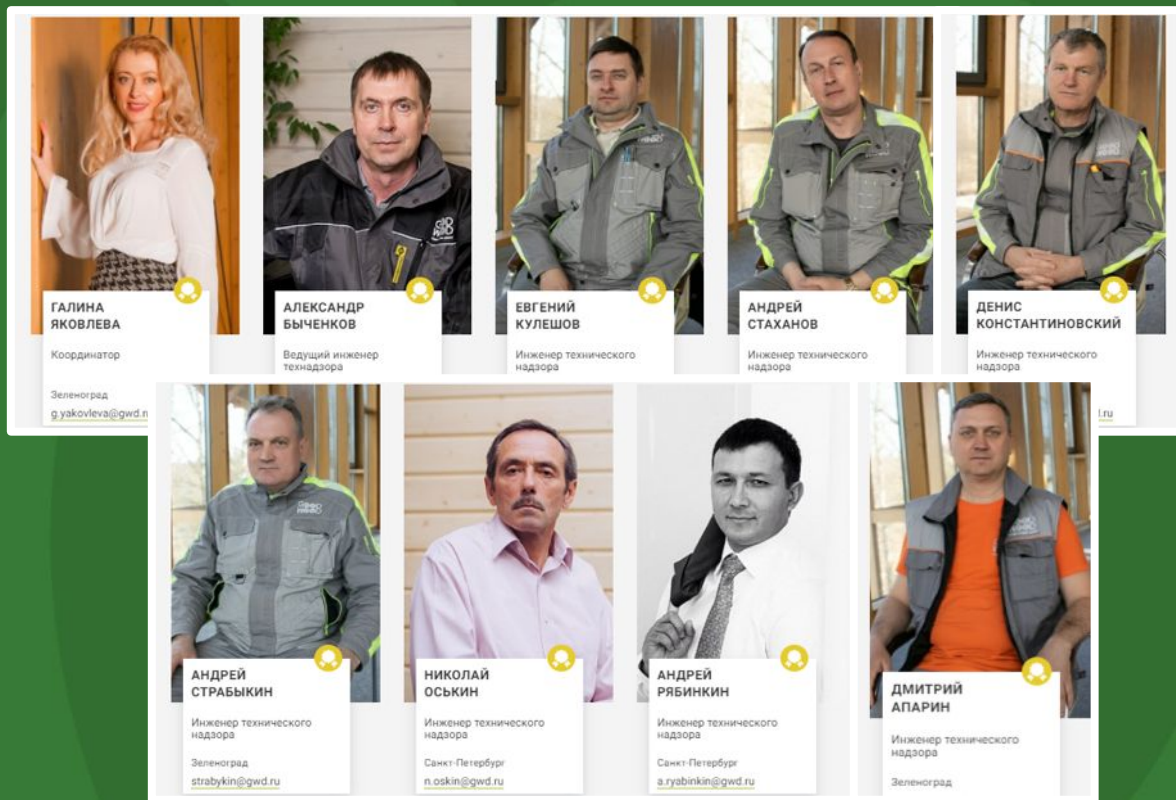

# Обучение бригадиров

← → ☆ **Аттестация у партнера 000000001 от 26.05.2020 10:26:33** Обсуждение

Основное [Напоминания пользователя \(Источник\)](#)

**Провести и закрыть** **Записать** **Провести** Еще

Номер: 000000001 от: 26.05.2020 10:26:33

Партнер: Wienerberger

Программа: Технология кладки Porotherm

**Добавить** Еще

N	Обучающийся	Сертификат	На объекте	Аттестов...
1	Иванов Руслан Варсонофьевич	руслан ивако		✓
2	Куртяков Александр Борисович			✓
3	Художников Алексей Венедиктович			✓
4	Халецкий Павел Владимирович	вионер халецкий		✓
5	Матякубов Руслан Файзуллаевич			✓
6	Раджабов Рабадан Магомедгаджи...	раджабов рабадан		✓

**Бригадир: Халецкий Павел Владимирович (Бригадир)**

Основное [Нарушения административного стандарта](#) [Сводный отчет по чек листам](#) [История звонков \(Абонент\)](#) Еще

**Записать и закрыть** **Записать** Еще

Код: 000002172 Дата создания: 01.10.2019

ФИО: **Халецкий Павел Владимирович** Физ. лицо: Халецкий Павел Владимирович

Квалификация: 3 разряд Паспорт серия: 3050 Номер: 984E033PВ3

Направление: Строительный отдел БС Телефон бригадира: +7 (985) 0936155

Прораб: Гаврилов Альберт Васильевич Аттестующий: Гаврилов Альберт Васильевич

Бригадир может выполнять работы по этапам:

**Добавить** Еще

Партнер	Программа	Сертификат	На объекте
Wienerberger	Технология кл...	вионер халецкий	

Выполнение АС: **81% (29 из 36)** за год: **81% (29 из 36)** Принятые чек-листы: **88% (23 из 26)** за год: **88% (23 из 26)**

Комментарий: Сертификат Поротери 13.02.20

Уволен  Архив  Подрядчик  Автономный бригадир ?



## Проверка по чек-листу. Этап “Стеновой комплект”

# ЧЕК-ЛИСТ

Стеновой комплект  
ЭТАП ПРИНЯТ

Дата проведения осмотра:	21 июля 2020 г.
Начало осмотра	11:30
Завершение осмотра	12:30
Затраченное время	1 час.
Кол-во доп. выездов:	
Дата заезда:	14.07.2020

Заказчик:	Тончу Виталий Валериевич
Объект:	Дом 370 02.02.2020
Адрес объекта:	Московская обл, Одинцовский р-н, Захаровское с.п.,в районе д. Клопово, ДНТ "Топаз", уч. 259, уч. 258.
Менеджер:	Гриценко Андрей Николаевич
Ответственное лицо(прораб):	Климашевский Андрей Александрович
Бригадир:	Казайкин Алексей Николаевич, 2 разряд
ИТН:	Константиновский Денис Вениаминович
Финальный:	Да

<b>Лестница межэтажная строительная однопролетная:</b>	<b>+</b>
4. Качество материала лестницы соответствует ТУ.	✓
5. Ступени закреплены по 2 самореза с каждой стороны тетевы.	✓
6. Угол монтажа тетивы относительно горизонтальной оси не более 60 градусов.	✓
7. Шаг ступеней лестницы соответствует проекту(пропорционально углу установки тетивы)	✓
12. Вертикальность стен (особенно дверные и оконные проемы).	✓
13. Горизонтальные и вертикальные зазоры	✓
14. Изъятие у бригады ранее выданной проектной документации	✓
15. Качество бруса, лаги, балки (сучки, сколы, трещины); качество шлифовки ремонтных мест - только вдоль волокон.	✓
16. Количество половых лаг	✓
17. Контроль среза гребня на видовых балках, согласно проекта ЭП	✓



18. Мусор	V
19. Нагели установлены по проекту + по боковым стенам установлены нестандартные нагели длиной 600 мм через 1 м.	V
20. Наличие шпилек (нагелей, труб, узлы "Сила")	V
21. Присутствие клиента на приемке этапа	V
22. Присутствие менеджера клиентского отдела на приемке этапа	V
23. Проверка вертикальности столба и домкрата в ДВУХ плоскостях	V
24. Соответствие проекту месторасположение опорных столбов и их крепление	V
25. Соответствие проекту, в т.ч. месторасположение оконных и дверных проемов	V
26. Уровень междуэтажных перекрытий (крепление балок, опоры балок в соответствии с проектом)	V
27. Установка домкратов согласно проекту	V
28. Устройство цокольной лестницы согласно узла.	V
29. Чистота бруса, отсутствие наклеек	V


<b>Примечание:</b>	Этап стеновой комплект принят				
<b>Вопросы клиента:</b>					
<b>Пожелания клиента:</b>					
<b>Замечания по технологии:</b>					
<b>Остатки материалов:</b>	Нет				
<b>Замечания по приемке:</b>					
<b>Бригадир:</b>	Казайкин Алексей Николаевич	<b>Код проекта:</b>	11.11.2011 11:11:00	<b>Предоставление чек-листа на объекте:</b>	ДА
<b>Аттестация:</b>	2 разряд	<b>Выдача инф. листа:</b>	21.07.2020	<b>Чек-лист предоставил:</b>	БРИГАДИР
<b>Выдача корп. газеты:</b>	21.07.2020			<b>Чек-лист сдал:</b>	

### АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ

21. Выезд является первичным (не повторный)	V	
22. Исполнение узлов соответствует проектным, "переделок" и согласований нет.	V	
23. Этап готов к проверке полностью, все работы завершены - вызов не ложный.	V	
24. Этап принят без исправлений (если во время приемки бригада делала исправления поставить "галочку" в поле "НЕТ")	V	
25. Этап принят без согласований (если этап принят по согласованию поставить "галочку" в поле "НЕТ")	V	
26. Этап принят на объекте (если принято по фото - поставить "галочку" в поле "нет")	V	
27. Этап сдавал прораб или аттестованный бригадир	V	

Константиновский Денис Вениаминович	21 июля 2020 г.	
заполнил	дата заполнения	подпись

# Проверка по чек-листу. Этап “Стеновой комплект”

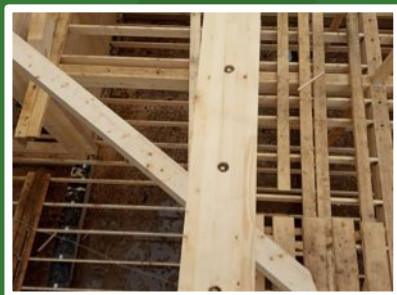

# Проверка по чек-листу. Этап "Кровля"



## ЧЕК-ЛИСТ

Кровля

ЭТАП ПРИНЯТ

Дата проведения осмотра:	26 августа 2020 г.
Начало осмотра	10:30
Завершение осмотра	11:50
Затраченное время	1 час. 20 мин.
Кол-во доп. выездов:	
Дата заезда:	26.07.2020

Заказчик:	Тончу Виталий Валериевич
Объект:	Дом 370 02.02.2020
Адрес объекта:	Московская обл, Одинцовский р-н, Захаровское с.п., в районе д. Клопово, ДНТ "Топаз", уч. 259, уч. 258.
Менеджер:	Гриценко Андрей Николаевич
Ответственное лицо(прораб):	Климашевский Андрей Александрович
Бригадир:	Казайкин Алексей Николаевич, 2 разряд
ИТН:	Апарин Дмитрий Анатольевич
Финальный:	Да

<b>Кровля</b>	<b>+</b>
35. Допускаемые отклонения прямолинейности конька, на всю длину - не более 10 мм.	✓
36. Замена гидроизола на подкладочный ковер при консервации битумной черепицы;	✓
37. Отклонение прогонных межэтажных балок от горизонтали в мм	✓
38. Правильность укладки и проклейки пароизоляции (проверить величину перехлеста, правильность, величина запаса примыкания к наружным стенам и прогонам – см. узлы №№ 526, 527).	✓
39. Правильность укладки утеплителя в примыкании кровли, утепление фронтонов и проклейка пароизоляции по фронтонным стенам(см. узел 526), по коньковым и конструкционным балкам.	✓
40. Правильность установки мансардных окон - размеры согласно проекту, чертеж «мансардное окно» (см. узел 587).	✓
41. Примыкание кровли к стенам выполнено по узлу проекта. При наличии открытых перерубов установлен капельник по узлу.	✓
42. Проверить величину зазора на усадку подшивной доски – 70...100мм, между доской 3-5 мм.	✓
43. Проверка сверления отверстий под закладные	✓
44. Устройство вентиляционного зазора в коньке (см.чертежи кровельных пирогов в соответствии с финишным покрытием).	✓
45. Устройство внутренней обрешетки и нижнего бруска с зазором на усадку в местах примыкания к наружным стенам и прогонам.	✓
<b>МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА</b>	<b>+</b>

55. Подрезка металлочерепицы запрещена абразивным кругом (болгаркой), проверить срезы.	V
56. Проверка целостности и чистоты кровельного покрытия, элементов водосточной системы и кровельной обрешетки.	V
57. Снегозадержание: крепление снегозадержателей глухарями (саморезами с шестигранной головкой) диаметром 8 * 60 мм (см.уел 590).	V
58. Снегозадержание: наличие установленных штатных резиновых уплотнителей: под верхнее и нижнее крепление согласно инструкции производителя.	V
59. Снегозадержание: при длине ската свыше 6 м установка 2 линии трубчатого снегозадержателя, согласно схеме расстановке опор системы снегозадержания, над мансардными окнами, печными трубами и газовой вентиляцией.	V
60. Снегозадержание: установка рядом с карнизом, на месте несущей стены по схеме приложенной в проекте.	V
61. Снегозадержание: шаг установки креплений трубчатого снегозадержания не более 549 мм - в каждую третью впадину.	V
72. Присутствие клиента на приемке этапа	
73. Присутствие менеджера клиентского отдела на приемке этапа	

<b>Примечание:</b>	Этап Кровля основного дома принят.				
<b>Вопросы клиента:</b>					
<b>Пожелания клиента:</b>					
<b>Замечания по технологии:</b>					
<b>Остатки материалов:</b>	Нет.				
<b>Замечания по приемке:</b>					
<b>Бригадир:</b>	Казайкин Алексей Николаевич	<b>Код проекта:</b>	26.08.2020 11:00:00	<b>Предоставление чек-листа на объекте:</b>	ДА
<b>Аттестация:</b>	2 разряд	<b>Выдача инф. листа:</b>	26.08.2020	<b>Чек-лист предоставил:</b>	ПРОРАБ
<b>Выдача корп. газеты:</b>	26.08.2020			<b>Чек-лист сдал:</b>	

#### АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ

Бригада отсутствует, административный стандарт не требуется

Апарин Дмитрий Анатольевич	26 августа 2020 г.	
заполнил	дата заполнения	подпись

# Проверка по чек-листу. Этап “Кровля”



# Технический надзор. Партнеры



**Wienerberger**



# Контакты

GOOD  
WOOD



+7 916 656 60 83



GSA@GWD



@GSAGWD
