



АСЭ
РОСАТОМ

Статус-отчет по выполнению проектов с аккордно- премиальной системой оплаты труда

«Применение аккордной системы оплаты труда на участке
общестроительных работ №5 КуАЭС-2 ООО «СМУ№1»»

Крюков О.Л.

Начальник строительного участка №5





000 СМУ№1

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

сдельно-премиальной системы оплаты труда по отделке помещений (10URS) Курская АЭС-2

УОР №5

Объём выполняемых работ		тематика сентябрь 2022г.	м2	план	47,44	факт			
Стоимость работ		в базовых ценах	руб.	план	7 181	факт			
		в текущих ценах			181 257				
Продолжительность ССЧ участка	5	дата начала	10.09.2022	дата окончания	14.09.2022	факт			
					% от ССЧ участка				
Показатель	Единица измерения	Объем							
		Сметные показатели	Текущие показатели	Целевые показатели	+/-, % отклонения целевого		Факт	+/-, % отклонения факта	
					к сметному	к нормативному		к нормативному	к целевому
Срок производства работ	дн.	5	5	5	0	0	0	-5	-5
Трудоёмкость	чел.-ч	161	322	274	170%	85%	0	0%	0%
Коэффициент к сметной трудоёмкости (к)	коэф.	1	2,0	1,70	170%	85%	0,00	0%	0%
Среднесписочная численность	чел.	3	6	5	170%	85%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Фонд оплаты труда (ФОТ)	руб.	61 586	123 172	123 172	200%	100%		0%	0%
Заработная плата	руб./ч	383	383	450	118%	118%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Среднемесячная заработная плата на норму времени	руб.	63 116	63 116	73 993	117%	117%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Производительность труда	м2/чел.	3,241	1,621	1,907	59%	118%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Выработка в месяц, всего	руб. (баз.)/чел.	7 359	3 680	4 314	59%	117%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	руб. (тек.)/чел.	185 760	92 880	108 887	59%	117%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Наряд-задание участка строительных работ с 10.09.2022 по 14.09.2022 гг.



АСЭ
РОСАТОМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Жальских А.А.

" " 2022г.

НАРЯД-ЗАДАНИЕ ДЛЯ СДЕЛЬНО-ПРЕМИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА по отделке помещений (10URS)

Отчетный период С 10.09.22 ПО 14.09.22
Подразделение УОР №5

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнение объемов работ			Сметная трудоемкость, чел. часов			Примечание (№ КС-2, пояснения, причины невыполнения плановых показателей)
				% выполнения	План на отчетный	Факт на конец	На единицу измерения работ	На плановый объем работ	На фактически выполненный	
<i>БРИГАДА</i>										
13	02-40.1-0014С-И1	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором потолков _затирка Объем:(31,54+31,8)/100	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,00%	0,633	0,000	51,30	32,49	0,00	
14		Окраска полвинилщелочными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску Объем:(31,54)/100	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00%	0,315	0,000	16,94	5,34	0,00	
21		Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен _затирка Объем:(21,6+14,6)/100	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,00%	0,362	0,000	42,18	15,27	0,00	
22		Окраска полвинилщелочными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем:(21,6+75,2+14,6)/100	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00%	1,114	0,000	15,18	16,91	0,00	
20		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен Объем:(75,2)/100	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,00%	0,752	0,000	85,40	64,22	0,00	
17		Окраска полвинилщелочными составами улучшенная по штукатурке потолков _прим. в 2 слоя Объем:(15,9)/100	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00%	0,156	0,000	53,90	8,41	0,00	
30		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен Объем:(17,82)/100	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,00%	0,178	0,000	42,18	7,52	0,00	
		Окраска полвинилщелочными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем:(17,82)/100	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00%	0,178	0,000	15,18	2,71	0,00	
Итого:							161	0		

Составил: Начальник участка _____ Крюков О.Л.

Проверил: Ведущий экономист по труду _____ Паушок Е.В.

Расчет премии аккорда



АСЭ
РОСАТОМ

Смена	168
Взлет	176

168
168

Табель - расчет за СЕНТЯБРЬ 2022 г. 10УРС_ОТДЕЛКА ПОМЩЕННИЙ_СЕНТЯБРЬ_10.09.2022.14.09.2022

Директор филиала ООО "СМУ №1"

В.В.Дмитриев

Категория	Фамилия И.О.	таб.№	Индекс выплаты	Оклад	Дни	Часы	Оклад за ФОВ	Индекс выплаты	Сверхуроч				КОМАНДИРОВАНИЕ	Подплата за вредные условия	ИСН установленный	ИСН начисленный	бригадирские	бригадирские	Итого начислено	Расчет оперативной премии			Итого начислено	
									часы	часы	сумма 50%	сумма 100%								Оклад за Фов с учетом КТУ	КТУ	Сумма премии ОПД		
																								УСТУРОВЕН А
УОР №5	Морозовский Евгений Сергеевич	42702608	PILOT 10 URS	2360	19470	5	55	6084	738					1557,6	487				0	7309	6084,375	1,00	13801	21109
УОР №5	Морозовский Сергей Александрович	18311430	PILOT 10 URS	2810	23210	5	55	7253	878					0	0				0	8131	7253,125	1,00	16452	24383
УОР №5	Полков Олег Валентинович	18311434	PILOT 10 URS	3150	26070	5	55	8147	984					0	0				0	9131	8146,875	1,00	18479	27610
УОР №5	Шагуев Тимур Азиевич	42702300	PILOT 10 URS	2810	23210	5	55	7253	878					1856,8	580				0	8712	7253,125	1,00	16452	25163
УОР №5	Шагуев Азие Бадурович	42800110	PILOT 10 URS	2810	23210	5	54	7121	862					1856,8	570				0	8553	7121,25	1,00	16153	24706
				13940	115170	25	274	35859	4340	0	0	0	0	5271	1637	0	0	0	0	41836	35859	5	81336	123172

Главный специалист ОРП _____ Паушок Е.В.
 Начальник подразделения _____ Крюков О.Л.

ст-ть часа			440,53			
средн. з/час	449,5328	75522				Оперативная премия
						81336


ФОТ ПО ПАСПОРТУ 123 172,00

Фото фиксация физ. объёмов на старте проекта + текущее состояние.




АС9
РОСАТОМ

Блочная насосная станция 10URS

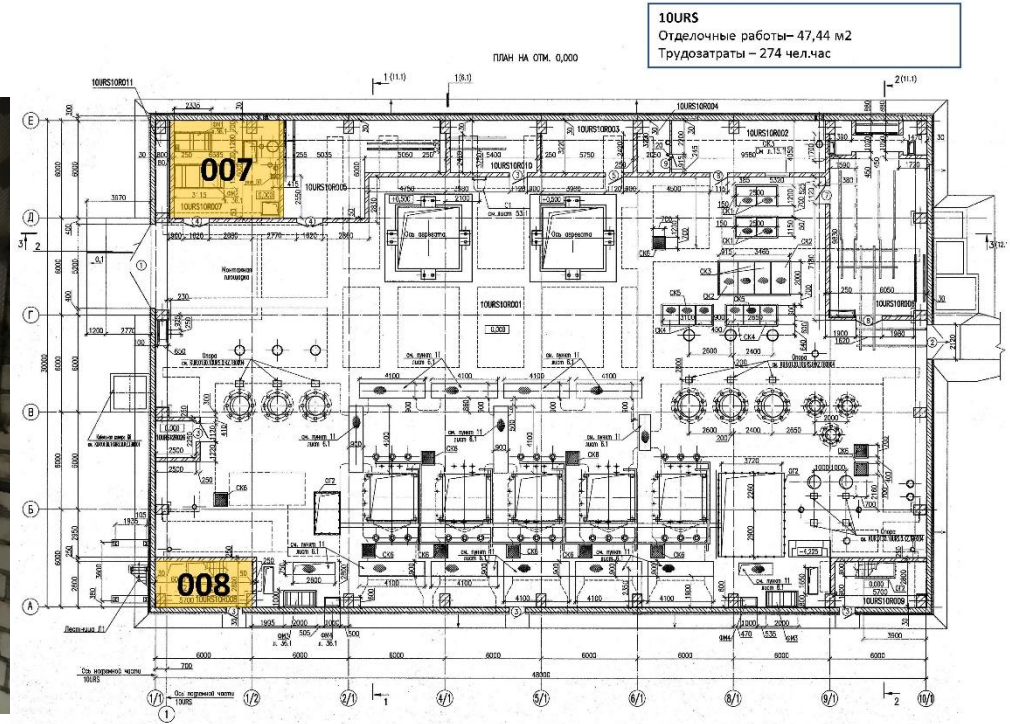


Отделочные работы м2

Мониторинг отработанного времени



■ Выполнено ■ Остаток

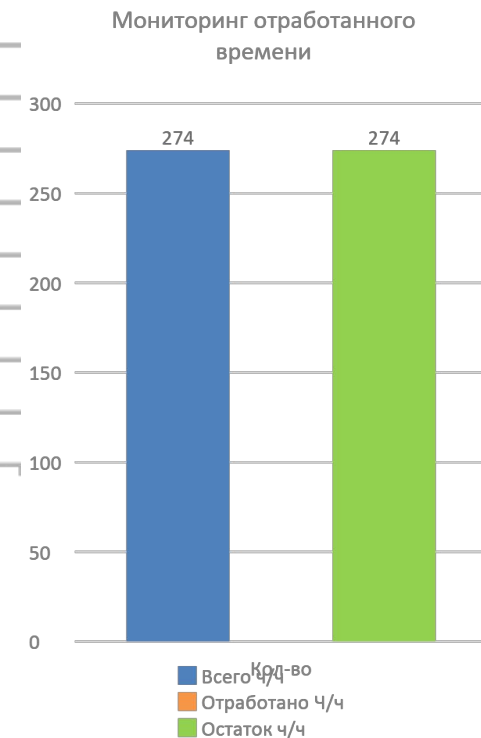



Накопительный график выполнения работ

Накопительный итог, м2



Всего запланировано
47,44 м2.



1. Темп суточный м2/сут:
Требуемый – 9,488 м2
Фактический – 0 м3.

Выявленные проблемы:

Выполненные мероприятия:

Факт подтверждения выполнения работ



Причины отставания и предлагаемые решения.



№	Проблема	Мероприятие	Ответственный	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1					
2					
