

Департамент строительства и транспорта Белгородской области


ГУП «Белгородский фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ОБЛАСТИ»

Генеральный директор
ГУП «Белгородский фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»
Попков Анатолий Тихонович

- 1. НЕДОСТАТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ К СОДЕРЖАНИЮ ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН
- **2.** НЕПРИГЛЯДНЫЙ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗОН
- **3.** ПАССИВНОЕ УЧАСТИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ



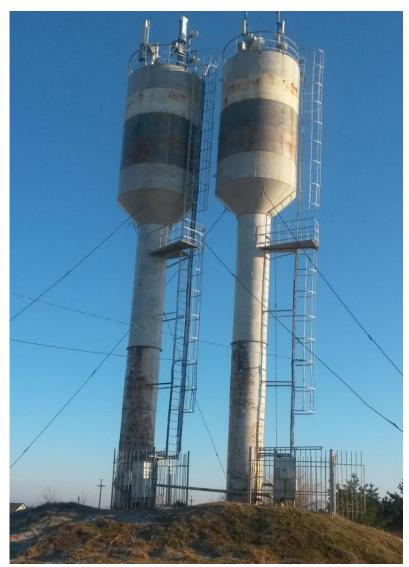





ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:	ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ С РАЗРАБОТАННЫМ АЛЬБОМОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК НЕ МЕНЕЕ 260 ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ К ДЕКАБРЮ 2018 ГОДА						
СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ:	РАЗРАБОТКА АЛЬБОМА ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА НИХ						
РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:	АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК НЕ МЕНЕЕ 260 ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЕДЕН В СООТВЕТСТВИЕ С РАЗРАБОТАННЫМ АЛЬБОМОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ						
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ:	 РАЗРАБОТАН АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В 2017 ГОДУ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ НА 130 ОБЪЕКТАХ В 2018 ГОДУ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ НА 130 ОБЪЕКТАХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВЫПОЛНЕНА ОКРАСКА ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ НЕ МЕНЕЕ 15 000 КВ.М. 						
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА:	ЖИТЕЛИ И ГОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА						

- 1. ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ ОБРЕЛИ НОВЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК
- 2. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ОБЛАСТИ
- 3 ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗОН
- **4.** ПРОДЛЕН СРОК СЛУЖБЫ КОНСТРУКЦИЙ ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН













ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

		Продол-			2017 год					2018 год										
№	Наименование	житель- ность, дней	Начало	Окончание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
1	РАЗРАБОТКА АЛЬБОМА ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ	15	01.03.17	27.03.17																
2	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ	25	27.03.17	28.04.17																
3	ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ	19	03.04.17	28.04.17																
4	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОКРАШИВАНИЮ ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН	19	10.04.17	10.05.17																
5	ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ОКРАШИВАНИЮ БАШЕН	400	11.05.17	30.10.18																
5.1	В 2017 ГОДУ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ НА 130 ОБЪЕКТАХ	140	11.05.17	30.10.17																
5.2	В 2018 ГОДУ БУДУ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ НА 130 ОБЪЕКТАХ	146	09.04.18	30.10.18																
6	ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	280	02.10.17	30.11.18																
7	ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ	281	01.11.17	30.11.18																
	ИТОГО	451	01.03.17	30.11.18																

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

		Бюджет	Бюдже	Внебюджетные источники					
№	Наименование	проекта, тыс. руб.	федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	Прочие
1	РАЗРАБОТКА АЛЬБОМА ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОКРАШИВАНИЮ ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ОКРАШИВАНИЮ БАШЕН	39 000,0	0	0	0	0	0	0	39 000,0
5.1	В 2017 ГОДУ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ НА 130 ОБЪЕКТАХ	19 500,0	0	0	0	0	0	0	19 500,0
5.2	В 2018 ГОДУ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ НА 130 ОБЪЕКТАХ	19 500,0	0	0	0	0	0	0	19 500,0
6	ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего:	39 000,0	0	0	0	0	0	0	39 000,0

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

	Бюдже	тное финансирование							
		Разме	Размер участия бюджета, тыс. руб.						
Форма	/частия	Федеральный	Областной	Местный					
Прямое бюджетное финансирование	-	-	-	-					
Дороги*	-	-	-	-					
Субсидии [*]	-	-	-	-					
итс)FO:	-	-	-					
)	/ частие в програм	имах государственной	поддержки						
Потреб	бность	Фина	Финансовые вложения, тыс. руб.						
Электроэнергия*	-		-						
Газоснабжение [*]	-		-						
Водоснабжение*	-		-						
Гарантии*			-						
Залоги*			-						
Прочие формы участия [*] :			-						
Земельный участок: -									

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Г			K.	$T\Lambda$

I IF () I N I A		
1 Социальная эффективность		
1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	-
1.2 Новые рабочие места	Ед.	-
1.3 Средняя з/п	Тыс. руб.	-
1.4 Месячный ФОТ	Млн. руб.	-
1.5 Годовой ФОТ	Млн. руб.	-
1.6 Иные показатели		
2 Бюджетная эффективность		
2.1 Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	-
2.2 Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	-
2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	-
2.4 Целевая выработка на одного работника		-
2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	-
2.6 Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	-
2.7 Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	-
3 Экономическая эффективность		
3.1 Годовой объем выручки*	Млн. руб.	-
3.2 Годовой объем прибыли [*]	Млн. руб.	-
3.3 Рентабельность*	%	-
3.4 Срок окупаемости проекта	Лет	-
3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	-
3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	-
3.7 Количество окрашенных водонапорных башен	Шт.	260

КОМАНДА ПРОЕКТА

N°	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1.	Гридчин Валерий Иванович	Заместитель начальника департамента – начальник управления жилищного строительства и реализации федеральных программ департамента строительства и транспорта Белгородской области	Куратор проекта
2.	Попков Анатолий Тихонович	Генеральный директор ГУП «Белгородский фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»	Руководитель проекта
3.	Кузнецова Наталья Геннадьевна	Специалист ОКСа ГУП «Белгородский фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»	Администратор проекта
4.	Кириленко Сергей Вячеславович	Консультант отдела контрольной работы, проектной деятельности и закупок управления контрольной работы и закупок департамента строительства и транспорта Белгородской области	Оператор мониторинга проекта
5.	Заместители глав администраций районов курирующие вопросы строительства и ЖКХ	Будут определены при подготовке плана управления проектом	Ответственный за проведение работ по окрашиванию водонапорных башен
6.	Архитекторы муниципальных образований	Будут определены при подготовке плана управления проектом	Ответственный за согласование архитектурного облика водонапорных башен

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Попков Анатолий Тихонович

т. 8(4722) 27-37-90

Администратор проекта:

Кузнецова Наталья Геннадьевна

т. 8(4722) 33-37-96
