



Федеральное агентство по обустройству  
государственной границы Российской Федерации



**«О ходе строительства и проектирования  
пунктов пропуска в целях обеспечения  
подготовки и проведения саммита АТЭС  
2012 года во Владивостоке»**



Доклад руководителя ФГКУ Росгранстрой С.В. Сазонова<sub>1</sub>



# Объекты ФГКУ Росгранстрой в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 в г. Владивосток

## Проектирование

(5 проектов на рассмотрении в ФГУ «Главгосэкспертиза России»)

## Строительство

(начато 27 января 2011 года)

АПП «Краскино»

МПП «Восточный»

МПП «Находка»

МПП «Владивосток»

(проектная документация утверждена государственным заказчиком)

ВПП «Владивосток»

ВПП «Хабаровск»

АПП «Пограничный»



## **Контракт № 36СМР от 21.12.2010**

на выполнение работ по разработке рабочей документации на строительство, выполнение строительно-монтажных работ и оснащение МАПП «Краскино».

**Начало** – 27.01.2011

**Окончание** – 10.12.2011

**Ввод в эксплуатацию** – 21.12.2011



## ***Землеотвод***

- выделен и оформлен земельный участок **8,1 га**;
- ведется **оформление** земельных участков, примыкающих к пункту пропуска на въезд–выезд;
- решается вопрос по переводу земель из категории **особо охраняемых** в земли промышленности и иного специального назначения.



## *Проектирование*

19.01.2011 проектная документация по объекту  
передана Генеральному подрядчику  
установленным порядком.

Положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России»

**№ 25-1-5-0054-09 от 02.06.2009г.**



# Состояние обустройства МАПП «Краскино»

## Строительство

27.01.11 строительная площадка передана подрядчику.

04.03.11 начало строительства объекта зарегистрировано в органах Государственного строительного надзора (№08/03).

| <i>Персонал и техника на объекте (в среднем в сутки)</i>  | <i>ед.</i> |
|---|------------|
| Рабочий персонал (чел.)   | <b>63</b>  |
| ИТР на стройплощадке (чел.)   | <b>10</b>  |
| Техника (бульдозеры – 4, экскаваторы – 2, катки – 2, самосвалы – 6, фронтальный погрузчик – 1). | <b>15</b>  |



# Состояние обустройства МАПП «Краскино»

7

## Строительство



*Здание № 4*



# Состояние обустройства МАПП «Краскино»

8

## Строительство



*Здание № 7*





# Состояние обустройства МАПП «Краскино»

9

## Строительство

*Здание № 8*






## Строительство



*Здание № 10*

# Строительная готовность

## МАПП «Краскино» на 25 мая 2011 года

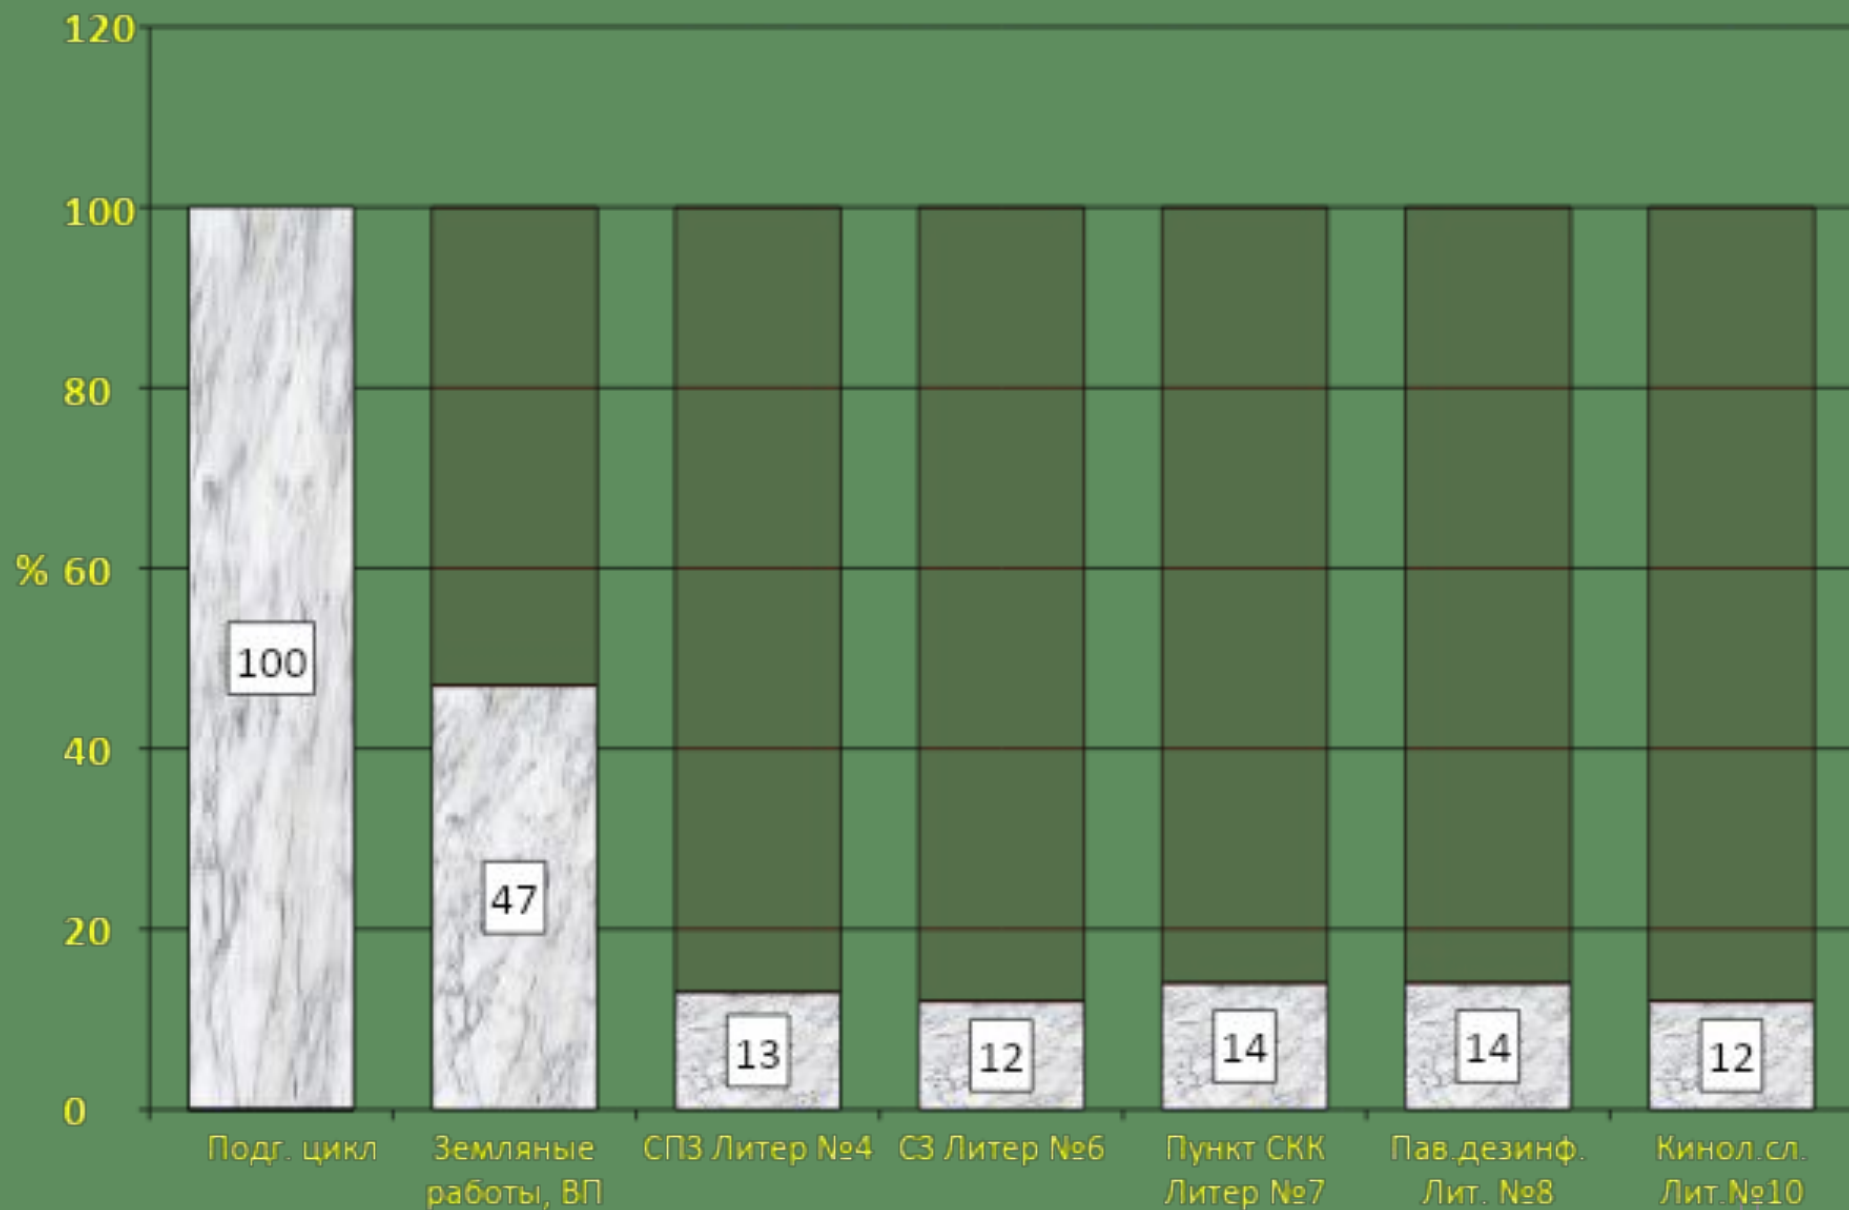



## ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПО МАПП «КРАСКИНО»

Не завершено оформление **дополнительных земельных участков** для обустройства въезда-выезда МАПП «Краскино», а также **перевод земель** из категории особо охраняемых в земли промышленности и иного специального назначения

**Согласование измененной схемы** генплана и благоустройства, выполнения каркаса служебно-административного здания из металлоконструкций, а ограждающих конструкций – из сендвич-панелей с базальтовым утеплителем, подразумевает увеличение затрат на строительство, выполнение дополнительных теплотехнических расчетов, а также **повторное прохождение Главгосэкспертизы.**

Необходимо проработать возможность обеспечения МАПП «Краскино» и «Пограничный» электроэнергией **от промышленной сети со стороны Китайской Народной Республики**

Необходимо активное участие Приморского края, а также Росавтодора, в оборудовании **подъездных дорог** к МАПП «Краскино»



Федеральное агентство по обустройству  
государственной границы Российской Федерации



**«Строительство и проектирование пунктов  
пропуска в целях обеспечения подготовки  
и проведения саммита АТЭС 2012 года во  
Владивостоке»**



Доклад руководителя ФГКУ Росгранстрой  
С.В. Сазонова
