

# Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации



«О ходе строительства и проектирования пунктов пропуска в целях обеспечения подготовки и проведения саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке»



Доклад руководителя ФГКУ Росгранстрой С.В. Сазонова



# Объекты ФГКУ Росгранстрой в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 в г. Владивосток

#### Проектирование

(5 проектов на рассмотрении в ФГУ «Главгосэкспертиза России»)

МПП «Восточный» МПП «Находка» МПП «Владивосток»

(проектная документация утверждена государственным заказчиком)

ВПП «Владивосток» ВПП «Хабаровск» АПП «Пограничный»

#### Строительство

(начато 27 января 2011 года)

АПП «Краскино»



## Контракт № 36СМР от 21.12.2010

на выполнение работ по разработке рабочей документации на строительство, выполнение строительно-монтажных работ и оснащение МАПП «Краскино».

**Начало** – 27.01.2011

Окончание – 10.12.2011

**Ввод в эксплуатацию** – 21.12.2011



#### Землеотвод

- выделен и оформлен земельный участок 8,1 га;
- ведется оформление земельных участков, примыкающих к пункту пропуска на въезд– выезд;
- решается вопрос по переводу земель из категории особо охраняемых в земли промышленности и иного специального назначения.



#### Проектирование

19.01.2011 проектная документация по объекту передана Генеральному подрядчику установленным порядком.

Положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России»

№ 25-1-5-0054-09 от 02.06.2009г.




#### Состояние обустройства МАПП «Краскино» Строительство

27.01.11 строительная площадка передана подрядчику.

04.03.11 начало строительства объекта зарегистрировано в органах Государственного строительного надзора (№08/03).

Персонал и техника на объекте (в среднем в сутки)	ед.
Рабочий персонал (чел.)	63
ИТР на стройплощадке (чел.)	10
Техника (бульдозеры — 4, экскаваторы — 2, катки — 2, самосвалы — 6, фронтальный погрузчик — 1).	15



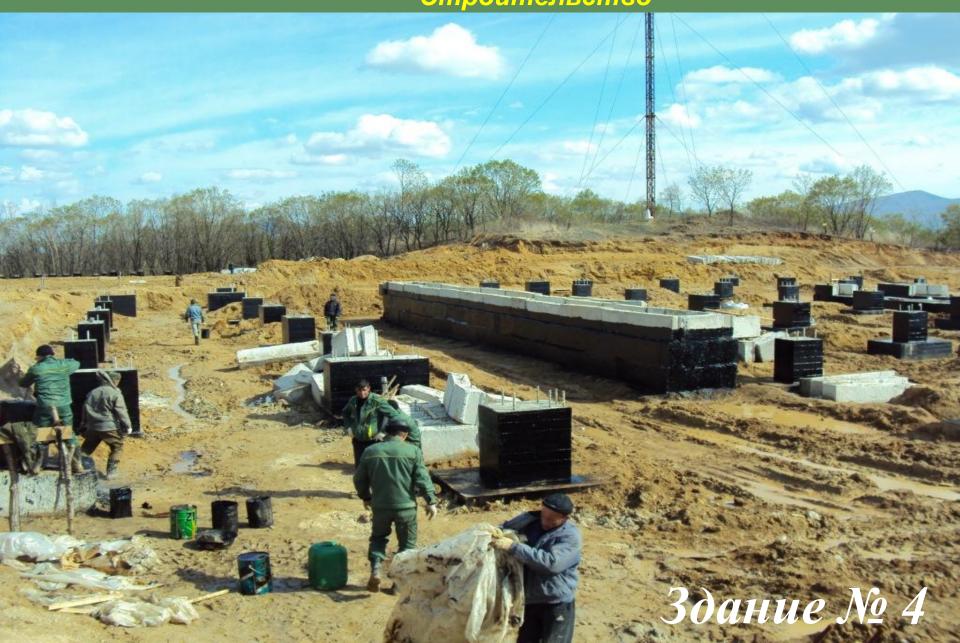














# Строительная готовность МАПП «Краскино» на 25 мая 2011 года

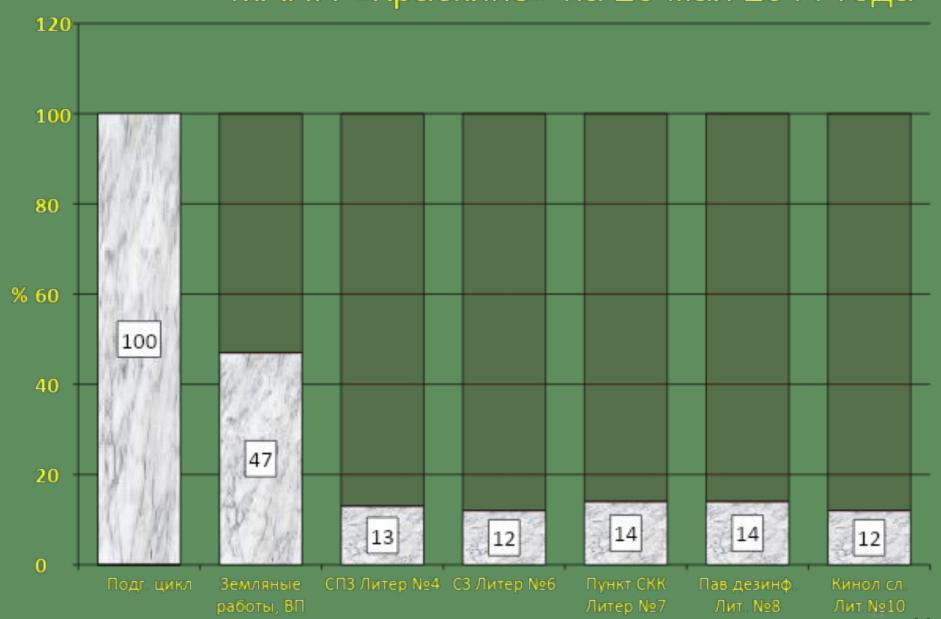



#### ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПО МАПП «КРАСКИНО»

Не завершено оформление **дополнительных земельных участков** для обустройства въезда-выезда МАПП «Краскино», а также **перевод земель** из категории особо охраняемых в земли промышленности и иного специального назначения

Согласование измененной схемы генплана и благоустройства, выполнения каркаса служебно-административного здания из металлоконструкций, а ограждающих конструкций — из сендвич-панелей с базальтовым утеплителем, подразумевает увеличение затрат на строительство, выполнение дополнительных теплотехнических расчетов, а также повторное прохождение Главгосэкспертизы.

Необходимо проработать возможность обеспечения МАПП «Краскино» и «Пограничный» электроэнергией **от промышленной сети со стороны Китайской Народной Республики** 

Необходимо активное участие Приморского края, а также Росавтодора, в оборудовании **подъездных дорог** к МАПП «Краскино»



# Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации



«Строительство и проектирование пунктов пропуска в целях обеспечения подготовки и проведения саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке»



Доклад руководителя ФГКУ Росгранстрой С.В. Сазонова
