



**ФРЯЗИНО**  
Н А У К О Г Р А Д



Выполнение мероприятий по  
реконструкции ВЗУ №4,  
расположенной по адресу: г.  
Фрязино, Окружной проезд, д. 2, стр.  
1 и ВЗУ №5, расположенной по  
адресу: г. Фрязино, Площадь  
Введенского, д. 1, стр. 1





**ФРЯЗИНО**  
НАУКОГРАД




В рамках реализации мероприятия "Чистая вода" Национального проекта "Экология" ВЗУ № 4 03.07.2020 заключен муниципальный контракт № 0148200005420000190 "Реконструкция ВЗУ № 4 с установкой станции водоподготовки, г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1", подрядчик ООО «РБК СтройИнвест». Начальная максимальная цена контракта 208 729 688,39 руб. Контакт заключен на сумму 176 376 586,54 руб. (снижение на 15%). Срок выполнения работ по ПОС составляет 10 месяцев, в соответствии с положительным заключением ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» №50-1-1-3-0887-20 от 13.05.2020.





**ФРЯЗИНО**  
НАУКОГРАД

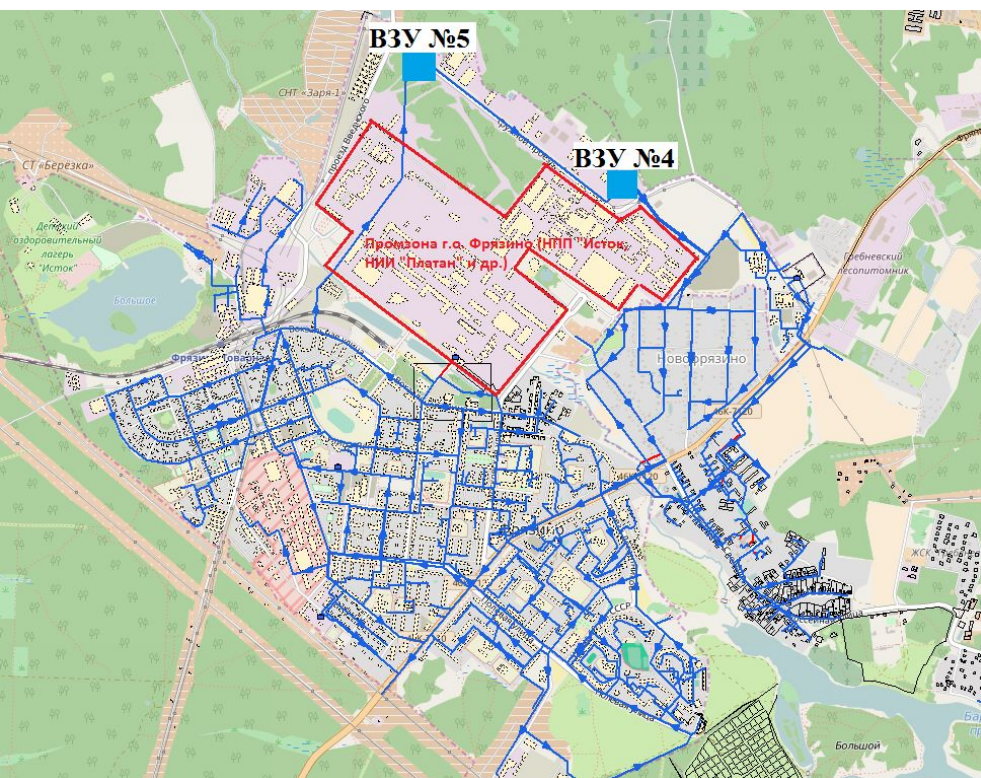

Численность населения – 59 535 чел. (2020 г.)

Социальные учреждения г.о. Фрязино:

- школы – 7;
- детские сады – 15;
- дом ребёнка – 1;
- ДЮСШ – 1;
- ЦДТ – 1;





**ФРЯЗИНО**  
Н А У К О Г Р А Д

## Водозаборный узел №4

- Адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, Окружной проезд, д. 2 стр. 1;
- Ввод в эксплуатацию – 1964 г.;
- Производительность: 11 160 м. куб./сут.;
- Состав ВЗУ: 5 артезианских скважин №№ 8,9,10,10а,14, резервуары чистой воды общим объемом 6000 м. куб, насосная станция 2-го подъема;
- Численность населения, получающего воду от ВЗУ: > 40 000 человек
- Качество воды: присутствие тетрахлорметана в концентрациях от 0,006 до 0,17 мг/л (при норме 0,002 мг/л)





**ФРЯЗИНО**  
НАУКОГРАД





**ФРЯЗИНО**  
НАУКОГРАД

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
по реализации мероприятия  
Государственной программы Московской  
области "Развитие жилищно-коммунального  
хозяйства" на 2018-2022 годы по объекту  
«Реконструкция ВЗУ № 4 г.о. Фрязино»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения		Ответственные	Результат
		Начало	Окончание		
1	Земляные работы,	15.07.2020	31.09.2020	ООО «РБК «СтройИнвест»	Выполнены работы по вырубке зелёных насаждений. Выполнены работы по планировке и подготовке котлована станции водоподготовки. Готовность 1,5%.
2	Устройство здания станции водоподготовки	15.08.2020	15.12.2020	ООО «РБК «СтройИнвест»	По состоянию на 02.10.2020 -0 %
3	Бурение скважин, тампонаж скважин	23.09.2020	31.12.2020	ООО «РБК «СтройИнвест»	По состоянию на 02.10.2020 — 0%
4	Внутреннее освещение и силовое оборудование	23.09.2020	15.12.2020	ООО «РБК «СтройИнвест»	По состоянию на 02.10.2020 — 0%
5	Внутренние сети водоснабжения, система внутренней канализации, система отопления, вентиляции и кондиционирования. Здание водоподготовки.	01.09.2020	07.11.2020	ООО «РБК «СтройИнвест»	По состоянию на 02.10.2020 — 0%



**ФРЯЗИНО**  
НАУКОГРАД

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
по реализации мероприятия  
Государственной программы Московской  
области "Развитие жилищно-коммунального  
хозяйства" на 2018-2022 годы по объекту  
«Реконструкция ВЗУ № 4 г.о. Фрязино»

<b>Технологические решения</b>	01.11.2020	01.03.2021	ООО «РБК «СтройИнвест»	
<b>Наружное освещение, наружные сети водоснабжения, система наружной канализации</b>	15.08.2020	31.01.2021	ООО «РБК «СтройИнвест»	По состоянию на 02.10.2020 — 0%
<b>Наружные сети связи</b>	23.07.2020	15.12.2020	ООО «РБК «СтройИнвест»	По состоянию на 02.10.2020 — 0%
<b>Сети связи</b>	01.03.2021	30.04.2021	ООО «РБК «СтройИнвест»	
<b>Благоустройство</b>	01.03.2021	30.04.2021	ООО «РБК «СтройИнвест»	
<b>Пуско-наладочные работы</b>	01.03.2021	30.04.2021	ООО «РБК «СтройИнвест»	



**ФРЯЗИНО**  
Н А У К О Г Р А Д

По состоянию на 08.12.2020 выполнены подготовительные работы: земляные работы, спил зеленых насаждений. Произведены работы по устройству котлована и уплотнение грунта в котловане. Произведены работы по устройству 1-й ветки водопровода «ввод в здание». Осуществлен вынос двух кабелей 10 кВ. Задействовано на объекте 11 человек, 4 ед. техники.







**ФРЯЗИНО**  
НАУКОГРАД

Еженедельно под руководством Главы г. о. Фрязино Д.Р. Воробьева проводится совещание по реализации мероприятий реконструкция ВЗУ №4





**ФРЯЗИНО**  
Н А У К О Г Р А Д

## Водозаборный узел №5

- Адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, площадь Введенского, д. 1, стр. 1;
- Ввод в эксплуатацию – 1962 г.;
- Производительность: 3 800 м. куб./сут.;
- Состав ВЗУ: 3 артезианских скважины №№ 12,13,15, резервуары чистой воды общим объемом 1000 м. куб, насосная станция 2-го подъема;
- Численность населения, получающего воду от ВЗУ: > 10 000 человек
- Качество воды: присутствие тетрахлорметана в концентрациях от 0,004 до 0,071 мг/л (при норме 0,002 мг/л)





**ФРЯЗИНО**  
НАУКОГРАД





**ФРЯЗИНО**  
Н А У К О Г Р А Д

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации мероприятия Государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы по объекту «Реконструкция ВЗУ № 5 г.о. Фрязино»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения		Ответственные	Результат
		Начало	Окончание		
1	Подготовительные работы, вырубка деревьев	01.08.2020	31.08.2020	ООО «СтройГрупп»	Выполнены работы по вырубке зелёных насаждений.
2	Станция водоподготовки (конструкции железобетонные, конструкции металлические)	01.09.2020	23.11.2020	ООО «СтройГрупп»	По состоянию на 02.10.2020 выполнено 50%
3	Станция водоподготовки (отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение)	01.12.2020	26.02.2021	ООО «СтройГрупп»	
4	Станция водоподготовки (архитектурные решения)	15.10.2020	01.12.2020	ООО «СтройГрупп»	
8	Скважина павильон № 2	15.09.2020	23.12.2020	ООО «СтройГрупп»	По состоянию на 02.10.2020



**ФРЯЗИНО**  
НАУКОГРАД

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации мероприятия Государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-2022 годы по объекту «Реконструкция ВЗУ № 5 г.о. Фрязино»

10	Скважина павильон № 6	01.09.2020	24.12.2020	ООО «СтройГрупп»	По состоянию на 02.10.2020 выполнено 10 %
11	Скважины павильон № 12,13	01.11.2020	30.11.2020	ООО «СтройГрупп»	
12	Насосная станция 2-подъема	24.08.2020	15.09.2021	ООО «СтройГрупп»	По состоянию на 02.10.2020 выполнено 3 %
13	Наружные сети	15.09.2020	31.09.2021	ООО «СтройГрупп»	По состоянию на 02.10.2020 выполнено 35 %
14	Слаботочные работы	15.11.2020	15.09.2021	ООО «СтройГрупп»	
15	Благоустройство	01.04.2021	23.09.2021	ООО «СтройГрупп»	
16	Пусконаладочные работы	01.09.2021	30.09.2021	ООО «СтройГрупп»	



**ФРЯЗИНО**  
Н А У К О Г Р А Д



По состоянию на 08.12.2020 выполнены подготовительные работы: земляные работы, спил зеленых насаждений. Ведутся работы по монтажу металлоконструкций каркаса станции водоподготовки, прокладка трассы К4 сбросная канализация резервуаров, отделочные работы в насосной станции 2го подъема. Закончены кровельные и фасадные работы насосной станции, установлены наружные окна и двери. Резервуар РВЧ обвалован, закончены работы по гидроизоляции. На объекте задействованы 8 человек и 4 единицы техники.





**ФРЯЗИНО**  
НАУКОГРАД

Еженедельно под руководством Главы г. о. Фрязино Д.Р. Воробьева проводится совещание по реализации мероприятий реконструкция ВЗУ №5

