



ArcelorMittal

Программа «Гигиена».  
Статус выполнения по итогам 2018 года

Февраль 2019 г



# Стальной департамент. План 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Структурное подразделение	Площадь м <sup>2</sup>	Сумма по тендеру	Наименование подрядной организации	Сроки начала и окончания работ	% выполненных работ на 31.12.2018
1	КХП ЦХУ	Сульфатное отделение, ремонт санузла	5,0	2 250 000,00	ТАМА-ТЖУ	Август - Декабрь 2018 г	90%
2	КХП КЦ	СБК-2. Душевая 1 этаж	310,0	22 100 000,00	ТОО "FERA PLAST"	Август - Декабрь 2018 г	80%
3	КХП УПЦ	Ремонт санузла АБК	12,0	4 521 783,00	ТОО "FERA PLAST"	Август - Декабрь 2018 г	100%
4	КХП УОЦ	СБК-5, 1 этаж	615,0	26 170 000,00	ТОО "Темирмет ЛТД"	Август - Декабрь 2018 г	40%
<b>Итого:</b>				<b>55 041 783,00</b>			

# Стальной департамент. Факт 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Структурное подразделение	Площадь м <sup>2</sup>	Сумма по тендеру	Наименование подрядной организации	Сроки начала и окончания работ	% выполненной работы на 20.02.2019г
1	КХП ЦХУ	Сульфатное отделение, ремонт санузла	5,0	2 250 000,00	ТАМА-ТЖУ	Октябрь 2018г. - Февраль 2019г.	100%
2	КХП КЦ	СБК-2. Душевая 1 этаж	310,0	22 100 000,00	ТОО "FERA PLAST"	Сентябрь 2018г. - Март 2019г.	85%
3	КХП УПЦ	Ремонт санузла АБК	12,0	4 521 783,00	ТОО "FERA PLAST"	Сентябрь 2018г. - Ноябрь 2018г.	100%
4	КХП УОЦ	СБК-5, 1 этаж	615,0	26 170 000,00	ТОО "Темирмет ЛТД"	Ноябрь 2018г. - Март 2019г.	65%
5	ЛПЦ-3	АБК душевая № 5	1440,0	16 044 176,00	ТОО "FERA PLAST"	Октябрь 2018г. - Февраль 2019г.	97%
6	ЛПЦ-3	АБК-2, санузел	30,0	6 263 513,00	ТОО "FERA PLAST"	Октябрь 2018г. - Январь 2019г.	100%
7	ТЭЦ ПВС	здание ГЩУ (санузлы, производственные комнаты)	5,0	3 800 000,00	ТОО "Прокатремонт"	Ноябрь 2018г. - Декабрь 2018г.	85%
8	ТЭЦ ПВС	Мужская душевая ХВО-2	102,0	9 300 000,00	ТОО "Прокатремонт"	Ноябрь 2018г. - Декабрь 2018г.	40%
9	ЛПЦ-1	Душевые, туалет, помещения	300,0	34 700 000,00	ТОО "ТемирВторРесурсы"	Октябрь 2018г. - Февраль 2019г.	95%
10	ЦГЦА	Моечные отделения душевых	112,0	13 496 395,00	ТОО "FERA PLAST"	Октябрь 2018г. - Март 2019г.	67%
11	ЦР и ОО ГПМ	Ремонт душевой 1эт	400,0	19 599 570,00	ТОО "Крипт"	Октябрь 2018г. - Февраль 2019г.	85%
<b>Итого:</b>				<b>138 645 867,00</b>			

## ПРИЧИНЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ по КХП в 2018 г:

- В связи с аварийной ситуацией в ноябре 2018г. были задержаны подписи по тендерам.

# Выполнение программы «Гигиена»




ArcelorMittal

ЛПЦ 3. АБК- 2 мужской, женский санузлы

**ДО**



**ПОСЛЕ**

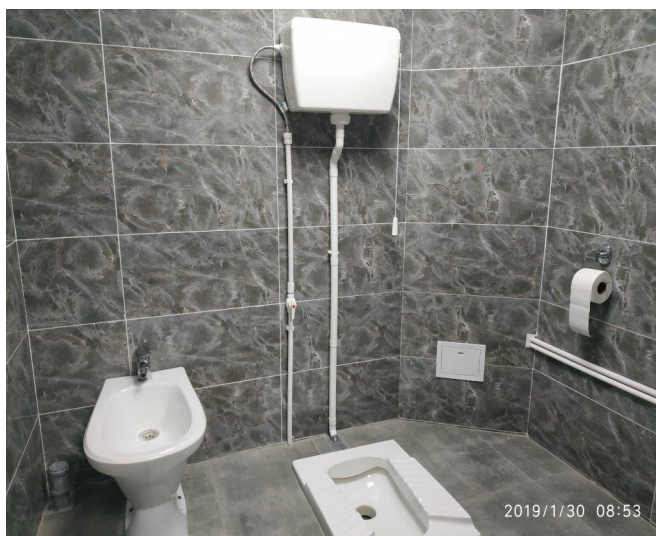

4



# Выполнение программы «Гигиена»

ЛПЦ 3. АБК душевая № 5

**ДО**



**ПОСЛЕ**



# Выполнение программы «Гигиена»

ЛПЦ 1. АБК душевые

**до**



**после**




# Выполнение программы «Гигиена»



ArcelorMittal

ТЭЦ ПВС. ГЩУ санузел

**до**

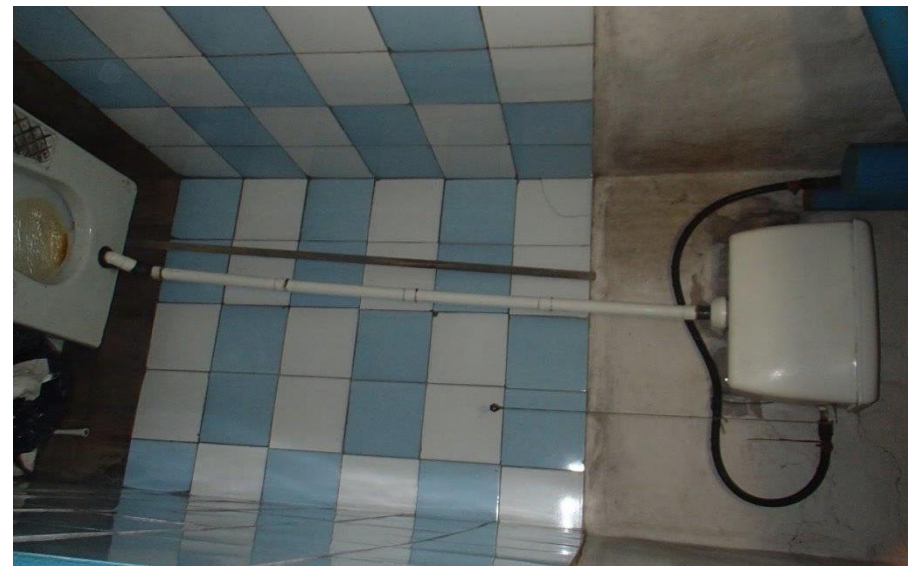

**после**



# Выполнение программы «Гигиена»



ArcelorMittal

КХП УПЦ. АБК санузел

**до**



**после**





# Выполнение программы «Гигиена»



ArcelorMittal

КХП. СБК-2. душевая 1 этаж



# Выполнение программы «Гигиена»

КХП ЦХУ. Сульфатное отделение



ArcelorMittal



# Выполнение программы «Гигиена»



ArcelorMittal

ЦР и ОО ГПМ. Душевая 1 этаж

до



после



# Выполнение программы «Гигиена»



ArcelorMittal

ЦГЦА АБК душевые

**до**



**после (работы в процессе)**



# Угольный департамент. ТОО «Курылысмет».

## План 2018г



ArcelorMittal

№ п/п	Наименование объекта	Структурное подразделение	Площадь м <sup>2</sup>	Сумма по тендеру	Наименование подрядной организации	Сроки начала и окончания работ	% выполненной работы на 31.12.2018
1	ш. Тентекская	Раздевалка (чистая) душевая санузел маленький санузел женский санузел мужской	840,0 259,0 8,0 23,0 26,0	53 500 000,00	ТОО «ТСВА»	Август - Декабрь 2018 г	75%
2	ФЛЦ	3 Санузла	100,0	1 582 600,00	ТОО «Ампир Декор»	Август - Декабрь 2018	0%
<b>Итого:</b>				<b>55 082 600,00</b>			

## Факт 2018г

№ п/п	Наименование объекта	Структурное подразделение	Площадь м <sup>2</sup>	Сумма по тендеру	Наименование подрядной организации	Сроки начала и окончания работ	% выполненной работы на 20.02.2019
1	ш. Тентекская	Раздевалка (чистая) душевая санузел маленький санузел женский санузел мужской	840,0 259,0 8,0 23,0 26,0	53 500 000,00	ТОО «ТСВА»	Сентябрь 2018- Февраль 2019	100%
2	ФЛЦ	3 Санузла	100,0	1 582 600,00	ТОО «Ампир Декор»	Январь 2019- Март 2019	40%
<b>Итого:</b>				<b>55 082 600,00</b>			

# Выполнение программы «Гигиена»




ArcelorMittal

Шахта «Тентекская»

душевая



санузел мужской

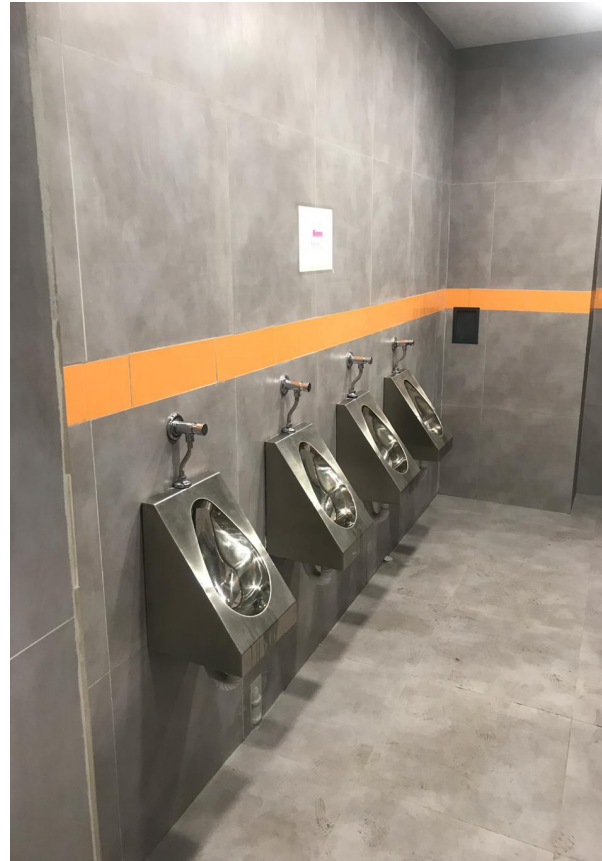

санузел маленький



# Выполнение программы «Гигиена»



Шахта «Тентекская»

ArcelorMittal

Санузел женский

Раздевалка чистая

