



ArcelorMittal

Программа «Гигиена».
Статус выполнения по итогам 2018 года

Февраль 2019 г



Стальной департамент. План 2018 г.

| № п/п | Наименование объекта | Структурное подразделение | Площадь м ² | Сумма по тендеру | Наименование подрядной организации | Сроки начала и окончания работ | % выполненных работ на 31.12.2018 |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | КХП ЦХУ | Сульфатное отделение, ремонт санузла | 5,0 | 2 250 000,00 | ТАМА-ТЖУ | Август - Декабрь 2018 г | 90% |
| 2 | КХП КЦ | СБК-2. Душевая 1 этаж | 310,0 | 22 100 000,00 | ТОО "FERA PLAST" | Август - Декабрь 2018 г | 80% |
| 3 | КХП УПЦ | Ремонт санузла АБК | 12,0 | 4 521 783,00 | ТОО "FERA PLAST" | Август - Декабрь 2018 г | 100% |
| 4 | КХП УОЦ | СБК-5, 1 этаж | 615,0 | 26 170 000,00 | ТОО "Темирмет ЛТД" | Август - Декабрь 2018 г | 40% |
| Итого: | | | | 55 041 783,00 | | | |

Стальной департамент. Факт 2018 г.

| № п/п | Наименование объекта | Структурное подразделение | Площадь м ² | Сумма по тендеру | Наименование подрядной организации | Сроки начала и окончания работ | % выполненной работы на 20.02.2019г |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | КХП ЦХУ | Сульфатное отделение, ремонт санузла | 5,0 | 2 250 000,00 | ТАМА-ТЖУ | Октябрь 2018г. - Февраль 2019г. | 100% |
| 2 | КХП КЦ | СБК-2. Душевая 1 этаж | 310,0 | 22 100 000,00 | ТОО "FERA PLAST" | Сентябрь 2018г. - Март 2019г. | 85% |
| 3 | КХП УЩ | Ремонт санузла АБК | 12,0 | 4 521 783,00 | ТОО "FERA PLAST" | Сентябрь 2018г. - Ноябрь 2018г. | 100% |
| 4 | КХП УОЦ | СБК-5, 1 этаж | 615,0 | 26 170 000,00 | ТОО "Темирмет ЛТД" | Ноябрь 2018г. - Март 2019г. | 65% |
| 5 | ЛЩЦ-3 | АБК душевая № 5 | 1440,0 | 16 044 176,00 | ТОО "FERA PLAST" | Октябрь 2018г. - Февраль 2019г. | 97% |
| 6 | ЛЩЦ-3 | АБК-2, санузел | 30,0 | 6 263 513,00 | ТОО "FERA PLAST" | Октябрь 2018г. - Январь 2019г. | 100% |
| 7 | ТЭЦ ПВС | здание ГЩУ (санузлы, производственные комнаты) | 5,0 | 3 800 000,00 | ТОО "Прокатремонт" | Ноябрь 2018г. - Декабрь 2018г. | 85% |
| 8 | ТЭЦ ПВС | Мужская душевая ХВО-2 | 102,0 | 9 300 000,00 | ТОО "Прокатремонт" | Ноябрь 2018г. - Декабрь 2018г. | 40% |
| 9 | ЛЩЦ-1 | Душевые, туалет, помещения | 300,0 | 34 700 000,00 | ТОО "ТемирВторРесурсы" | Октябрь 2018г. - Февраль 2019г. | 95% |
| 10 | ЦГЦА | Моечные отделения душевых | 112,0 | 13 496 395,00 | ТОО "FERA PLAST" | Октябрь 2018г. - Март 2019г. | 67% |
| 11 | ЦР и ОО ГПМ | Ремонт душевой 1эт | 400,0 | 19 599 570,00 | ТОО "Крипт" | Октябрь 2018г. - Февраль 2019г. | 85% |
| Итого: | | | | 138 645 867,00 | | | |

ПРИЧИНЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ по КХП в 2018 г:

- В связи с аварийной ситуацией в ноябре 2018г. были задержаны подписи по тендерам.

Выполнение программы «Гигиена»




ArcelorMittal

ЛПЦ 3. АБК- 2 мужской, женский санузлы

ДО



ПОСЛЕ

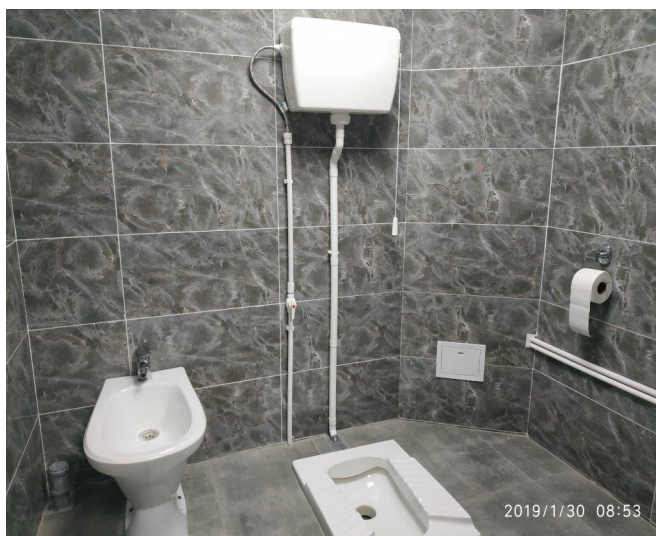

4



Выполнение программы «Гигиена»

ЛПЦ 3. АБК душевая № 5

ДО



ПОСЛЕ



Выполнение программы «Гигиена»

ЛПЦ 1. АБК душевые

до



после



Выполнение программы «Гигиена»



ArcelorMittal

ТЭЦ ПВС. ГЩУ санузел

до



после



Выполнение программы «Гигиена»



ArcelorMittal

КХП УПЦ. АБК санузел

до



после



Выполнение программы «Гигиена»



ArcelorMittal

КХП. СБК-2. душевая 1 этаж



Выполнение программы «Гигиена»

КХП ЦХУ. Сульфатное отделение



ArcelorMittal



Выполнение программы «Гигиена»




ArcelorMittal

ЦР и ОО ГПМ. Душевая 1 этаж

до



после

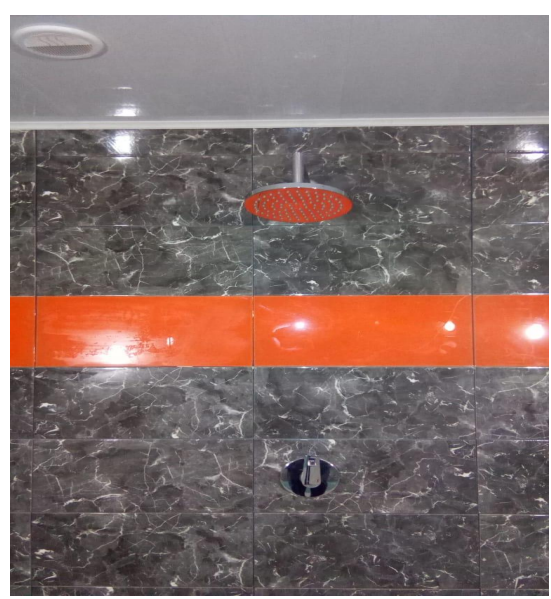

Выполнение программы «Гигиена»



ArcelorMittal

ЦГЦА АБК душевые

до



после (работы в процессе)



Угольный департамент. ТОО «Курылысмет».

План 2018г



ArcelorMittal

| № п/п | Наименование объекта | Структурное подразделение | Площадь м ² | Сумма по тендеру | Наименование подрядной организации | Сроки начала и окончания работ | % выполненной работы на 31.12.2018 |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | ш. Тентекская | Раздевалка (чистая) душевая санузел маленький санузел женский санузел мужской | 840,0 259,0 8,0 23,0 26,0 | 53 500 000,00 | ТОО «ТСВА» | Август - Декабрь 2018 г | 75% |
| 2 | ФЛЦ | 3 Санузла | 100,0 | 1 582 600,00 | ТОО «Ампир Декор» | Август - Декабрь 2018 | 0% |
| Итого: | | | | 55 082 600,00 | | | |

Факт 2018г

| № п/п | Наименование объекта | Структурное подразделение | Площадь м ² | Сумма по тендеру | Наименование подрядной организации | Сроки начала и окончания работ | % выполненной работы на 20.02.2019 |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | ш. Тентекская | Раздевалка (чистая) душевая санузел маленький санузел женский санузел мужской | 840,0 259,0 8,0 23,0 26,0 | 53 500 000,00 | ТОО «ТСВА» | Сентябрь 2018- Февраль 2019 | 100% |
| 2 | ФЛЦ | 3 Санузла | 100,0 | 1 582 600,00 | ТОО «Ампир Декор» | Январь 2019- Март 2019 | 40% |
| Итого: | | | | 55 082 600,00 | | | |

Выполнение программы «Гигиена»




ArcelorMittal

Шахта «Тентекская»

душевая



санузел мужской

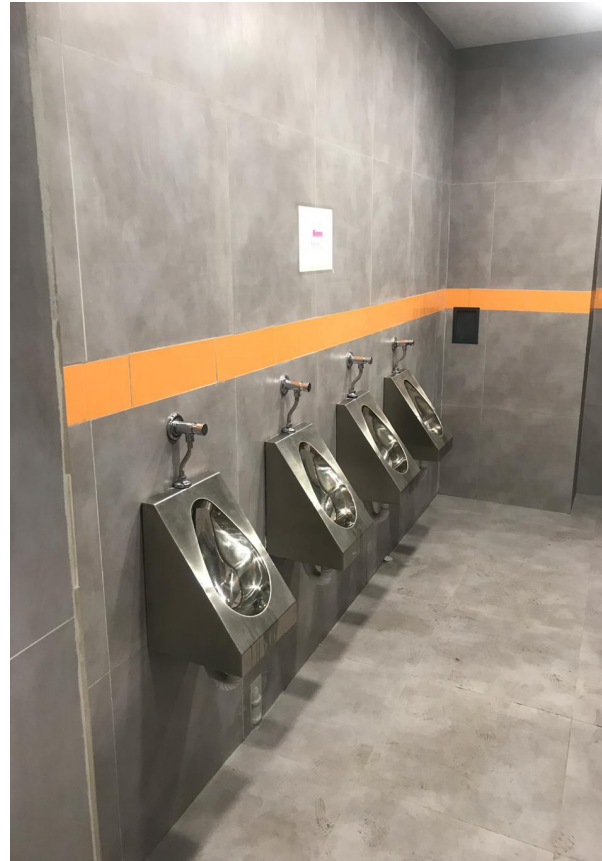

санузел маленький



Выполнение программы «Гигиена»



Шахта «Тентекская»

ArcelorMittal

Санузел женский

Раздевалка чистая

