



ArcelorMittal

Программа «Гигиена».
Статус выполнения по итогам 2019 года

Июль 2019 г

Стальной департамент. План-Факт 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта	Структурное подразделение	Площадь м ²	Сумма по тендеру	Наименование подрядной организации	% выполненной работы на 31.12.2019
1	КХП ЦРОО	участок вулканизации, ремонт санузла 1эт.	20	2 192 331,00	На тендере	-
2	КХП ЦРОО	санузел СО	11,7	1 369 242,00	На тендере	-
3	КХП КХЛ	ремонт душевой 2 эт.	22,42	4 379 160,00	На тендере	-
4	КХП КХЛ	ремонт санузла 3 эт.	10,44	1 784 753,00	На тендере	-
5	ЦРОО (ЦРМО-3)	ремонт комнаты приема пищи	14	1 607 331,00	На тендере	-
6	Газовый цех	душевая, санузел (нафтолино-очистка)	39,2	5 442 727,00	Ферро-пласт	80%
7	Газовый цех	душевая, санузел (ГПС)	57,3	4 370 000,00	Тама ТЖУ	95%
8	КУОБПП (Копровый цех)	душевая муж. 4 эт.	720	47 000 000,00	Темир-Втор-Ресурсы	68%
9	Кислород-ный цех	душевая муж. АБК-2	320	8 462 756,00	ТОО Планета-М	-
10	АГП	ремонт душевой 1 эт. АБК УШП	29,5	2 155 993,00	На тендере	-

Стальной департамент. План-Факт 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта	Структурное подразделение	Площадь м ²	Сумма по тендеру	Наименование подрядной организации	% выполненной работы на 31.12.2019
11	ЛПЦ-2	ремонт санузлов ЛО	50,71	9 460 106,00	ТОО SKS Tehnology	100%
12	ЛПЦ-2	устройство потолка столовая №35	388,6	2 769 000,00	ТОО КМК STEEL	100%
13	ЛПЦ-2	ремонт санузлов	18,72	5 234 365,00	ТОО АмбирДекор	10%
14	ЛПЦ-2	ремонт санузлов НТА	16,93	3 620 952,00	ТОО АльПром Трейд	100%
15	ЛПЦ-2	ремонт санузлов АБК	32,4	3 908 198,00	ТОО АльПром Трейд	100%
16	УЖДТ	ремонт душевых, санузлов здания поста Ремонтная	96,95	16 245 227,00	На тендере	-
17	СПЦ	ремонт помещений 1эт.	241,47	7 427 812,00	На тендере	-
18	СПЦ	ремонт помещений 2эт.	229,96	6 467 855,00	На тендере	-
19	ЛПЦ-3	душевая №3 2эт.	540	26 871 728,00	ТОО FERA PLAST	5%
20	Доменный цех	ремонт душевых АБК-1	669,33	50 555 781,00	На тендере	-
21	ЦПКОР	ремонт комнаты приема пищи	20,5	11 147 285,00	На тендере	-
			3550,13	207 228 063,00		

ТОО «Курылысмет».


План 2019г



ArcelorMittal

№ п/п	Наименование объекта	Структурное подразделение	Площадь м ²	Сумма по тендеру	Наименование подрядной организации	% выполненной работы на 31.12.2019
1	ПР №1 РГТО	Участок №9 (баня)	263	12 500 000,00	ТОО "Capital Stroi Garant"	Оформление контракта
2	ПР №1 НОММ	Участок №9 (4 санузла)	10,5	1 456 000,00	ТОО "СМУ-7"	Оформление контракта
Итого:			273,5	13 956 000,00		


Анализ помещений СД по программе «Гигиена»

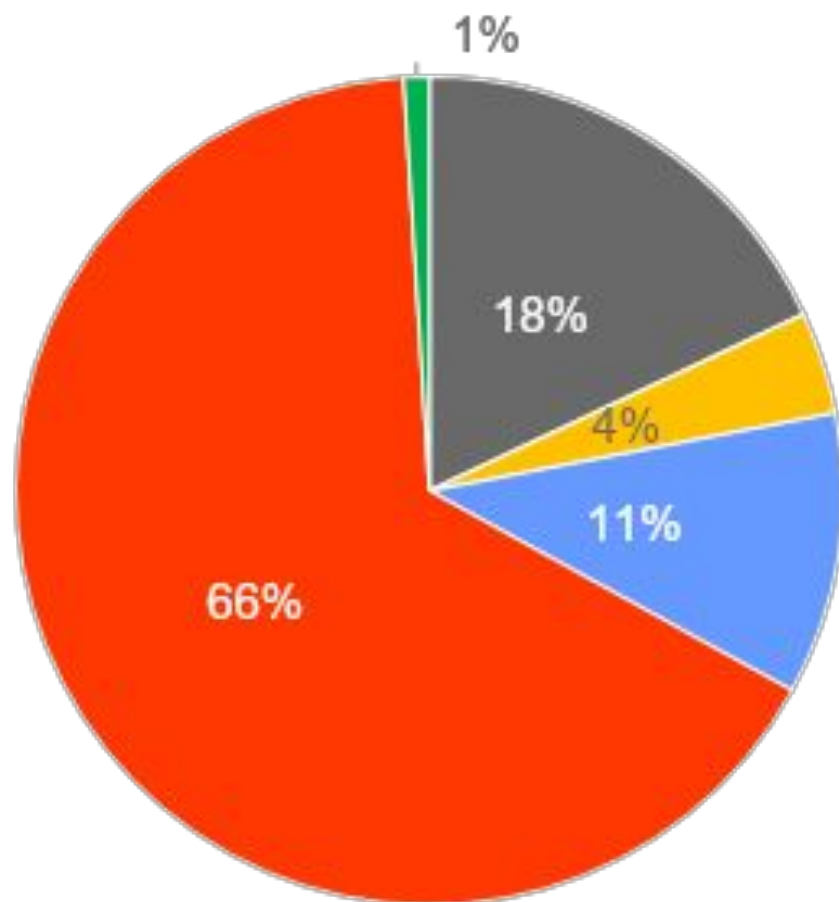

- 1 - ремонт не требуется
- 2 - ремонт требуется через 2 - 5 лет
- 3 - ремонт требуется через 1 год
- 4 - ремонт требуется в 2019 г
- 5 - ремонт требуется в 2018 г

Выделение денежных средств на программу «Гигиена» по годам

Затраты 2012 – 2019 г.г. План

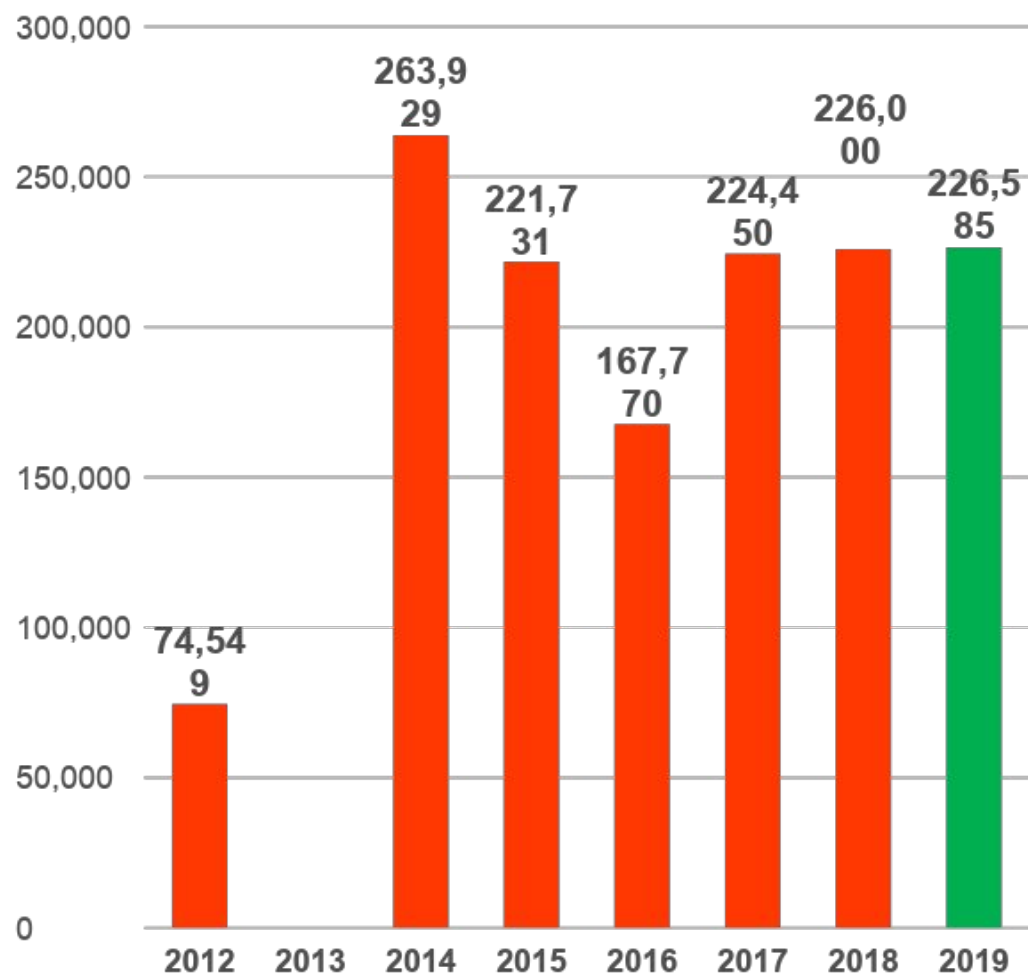

□ Плановые затраты ремонтных работ по программе «Гигиена» на 2019 г.:
Стальной департамент –
21 объект
