


Национальный проект «БКАД»

По состоянию на 13.07.2020

ФП «Дорожная сеть»

Финансовое обеспечение реализации работ

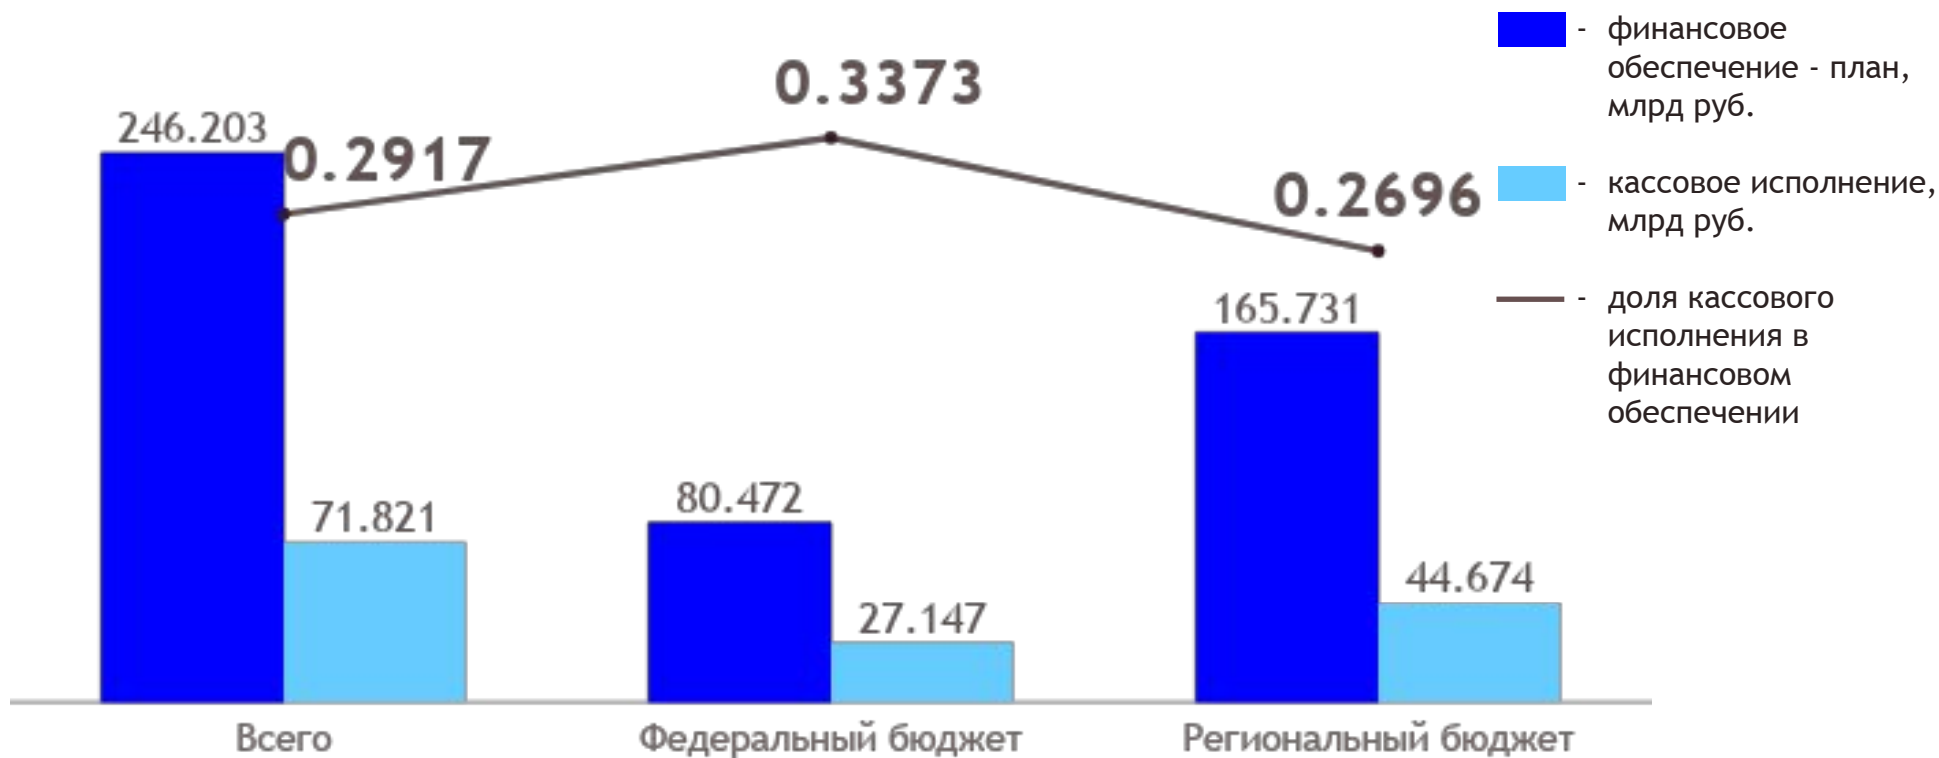

**В СОУ «Эталон» отсутствуют данные по освоению бюджета в Московской области (в 2020 году на ФП «Дорожная сеть» регионом предусмотрено 10,8 млрд руб.)*

Планирование работ

Выполнение плана работ на 2020 год



Не обеспечивают минимальную протяженность объектов, необходимую для достижения целевых показателей

2 субъекта РФ

на а/д регионального значения

Отклонение: - 61,1 км

9 субъектов РФ

на дорожной сети городских агломераций

Отклонение: -212,95 км

Контрактация объектов в 2020 году

Объекты	Запланировано	Включено в план-график	Заключено контрактов по объектам	Отклонение от плана, абс.	Выполнение плана, %
Линейные объекты	5 090 ед.	5 013 ед.	4 997 ед.	- 93	98,0%
	14 727,9 км		14 316,8 км	- 411,1	97,2%
Прочие объекты	782 ед.	766 ед.	748 ед.	- 38	95,4%
Всего	5 912 ед.	5 814 ед.	5 781 ед.	- 131	97,8%




Объекты	Запланировано	Включено в план-график	Заключено контрактов по объектам	Отклонение от плана, абс.	Выполнение плана, %
<i>Объекты экономии*</i>	115 ед.	114 ед.	104 ед.	- 11	90,4%

*Линейные и прочие объекты, запланированные к реализации за счет средств, сэкономленных в результате конкурсных процедур

■ - отклонение от плана; ■ - соответствие плану


Выполнение задания текущего года

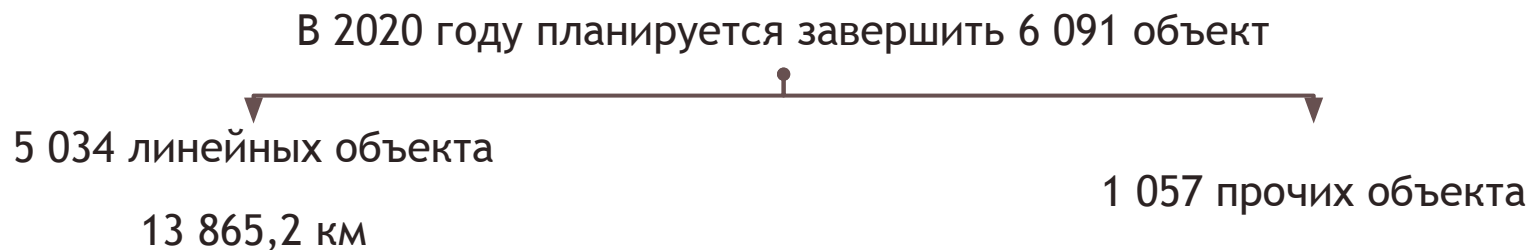

К настоящему моменту завершены работы на **925 объектах**. Введенная протяженность линейных объектов – **1 475,1 км**.


Выполнение работ на объектах текущего года

Объем выполнения дорожных работ в 2020 году

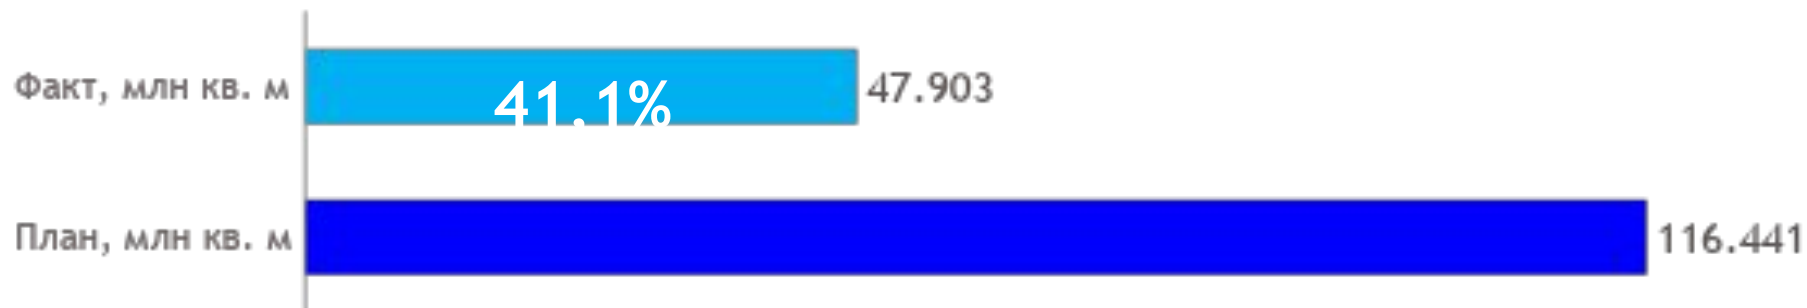


Планирование работ

Количество контрактов на принципах КЖЦ (факт)

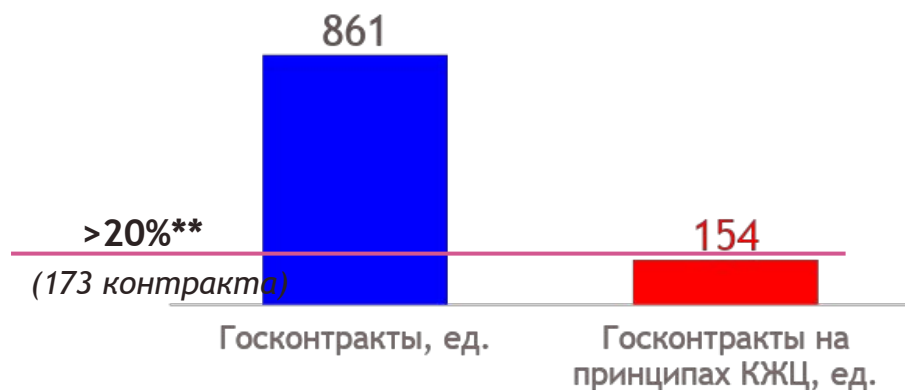

Количество контрактов с использованием НИИТ* (факт)

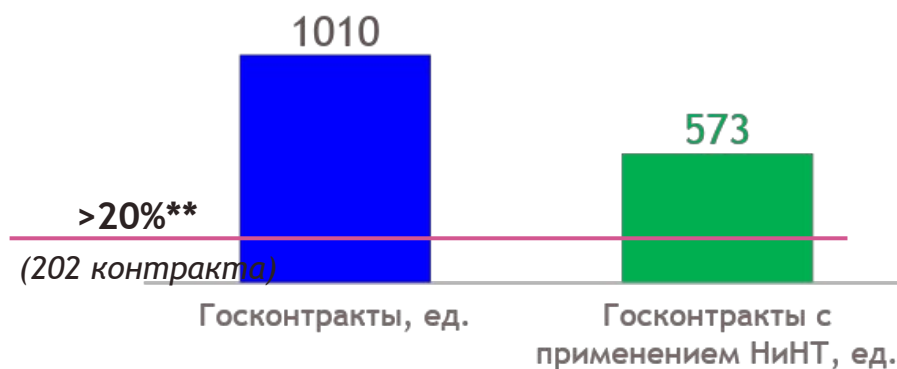


В 2020 году предусмотрено выполнение работ:

Показатель	План на 2020 год	Выполнено субъектом РФ	Откл., абс.	Выполнение, %
Размещение АПВГК на автомобильных дорогах	143	13	- 130	9,9%
Установка камер фотовидеофиксации	2 430	484	- 1 946	19,9%
Внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем	26	1	- 25	3,8%

*Новые и наилучшие технологии **Целевое значение показателя в 2020 году


■ - отклонение от плана; ■ - соответствие плану

Достижение прогнозных показателей числа погибших в ДТП (на 30.06.2020)

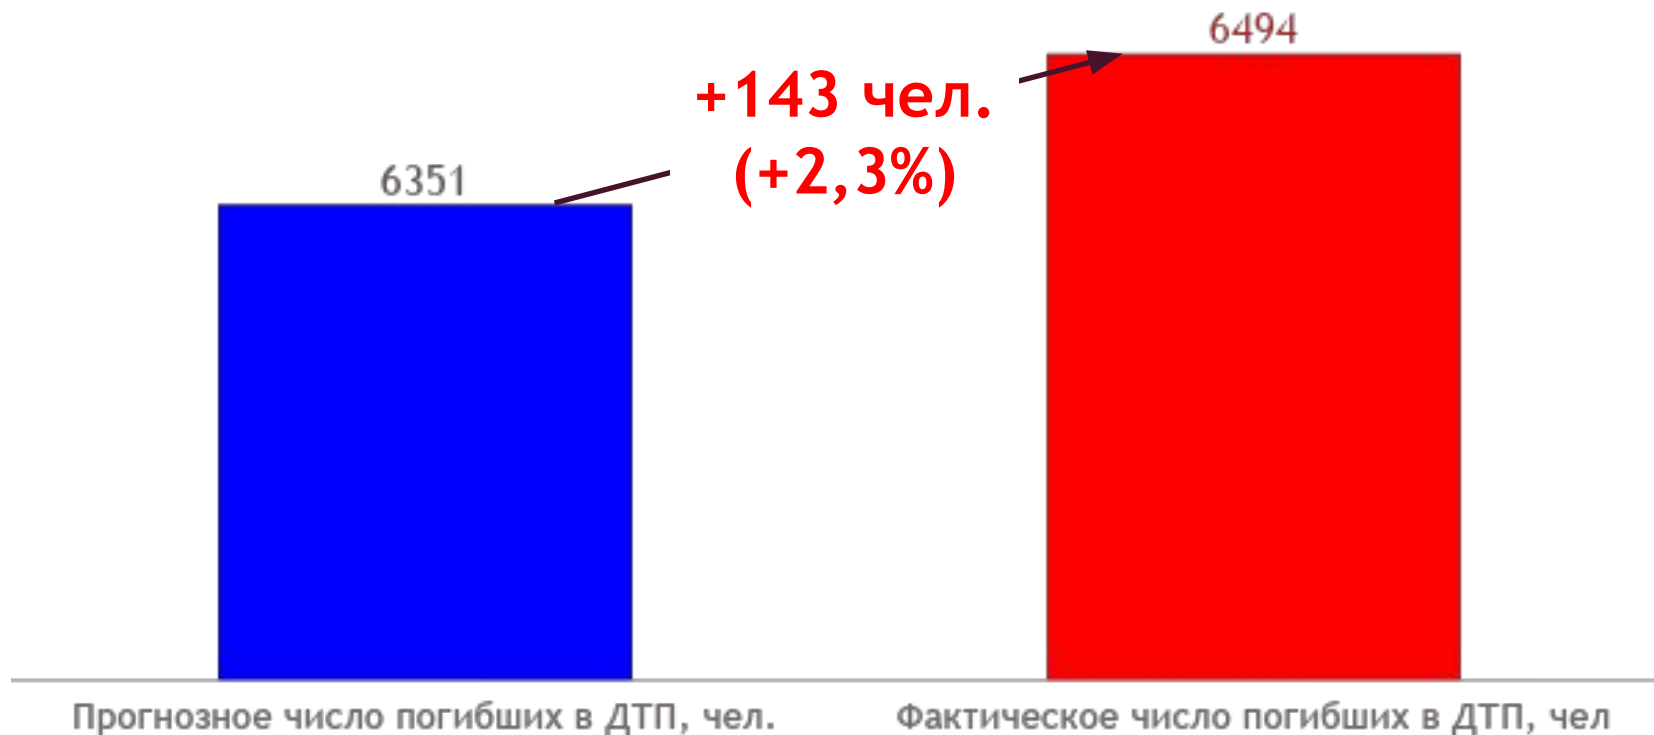

По состоянию на 30.06.2020 прогнозное значение показателя погибших в ДТП **превышено на 2,3%**. Существует риск недостижения целевого показателя. Риск недостижения показателя отмечен в 46 субъектах Российской Федерации

Финансовое обеспечение реализации работ (на 02.07.2020)

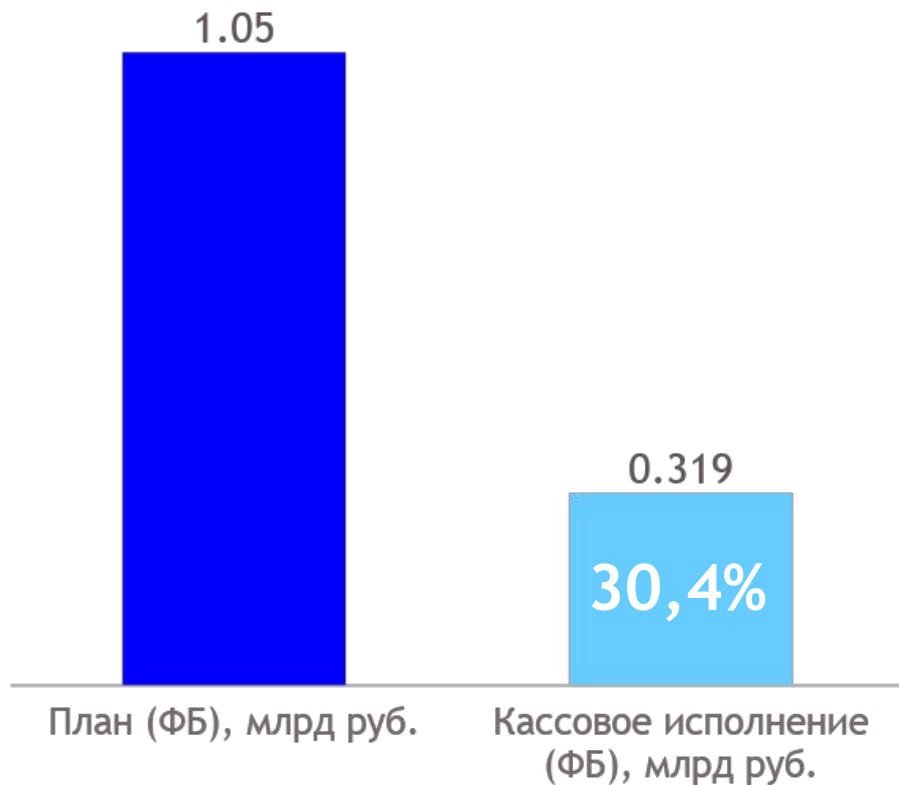

Выполнение задания текущего года (на 02.07.2020)

