


Национальный проект «БКАД»

По состоянию на 13.07.2020

ФП «Дорожная сеть»

Финансовое обеспечение реализации работ

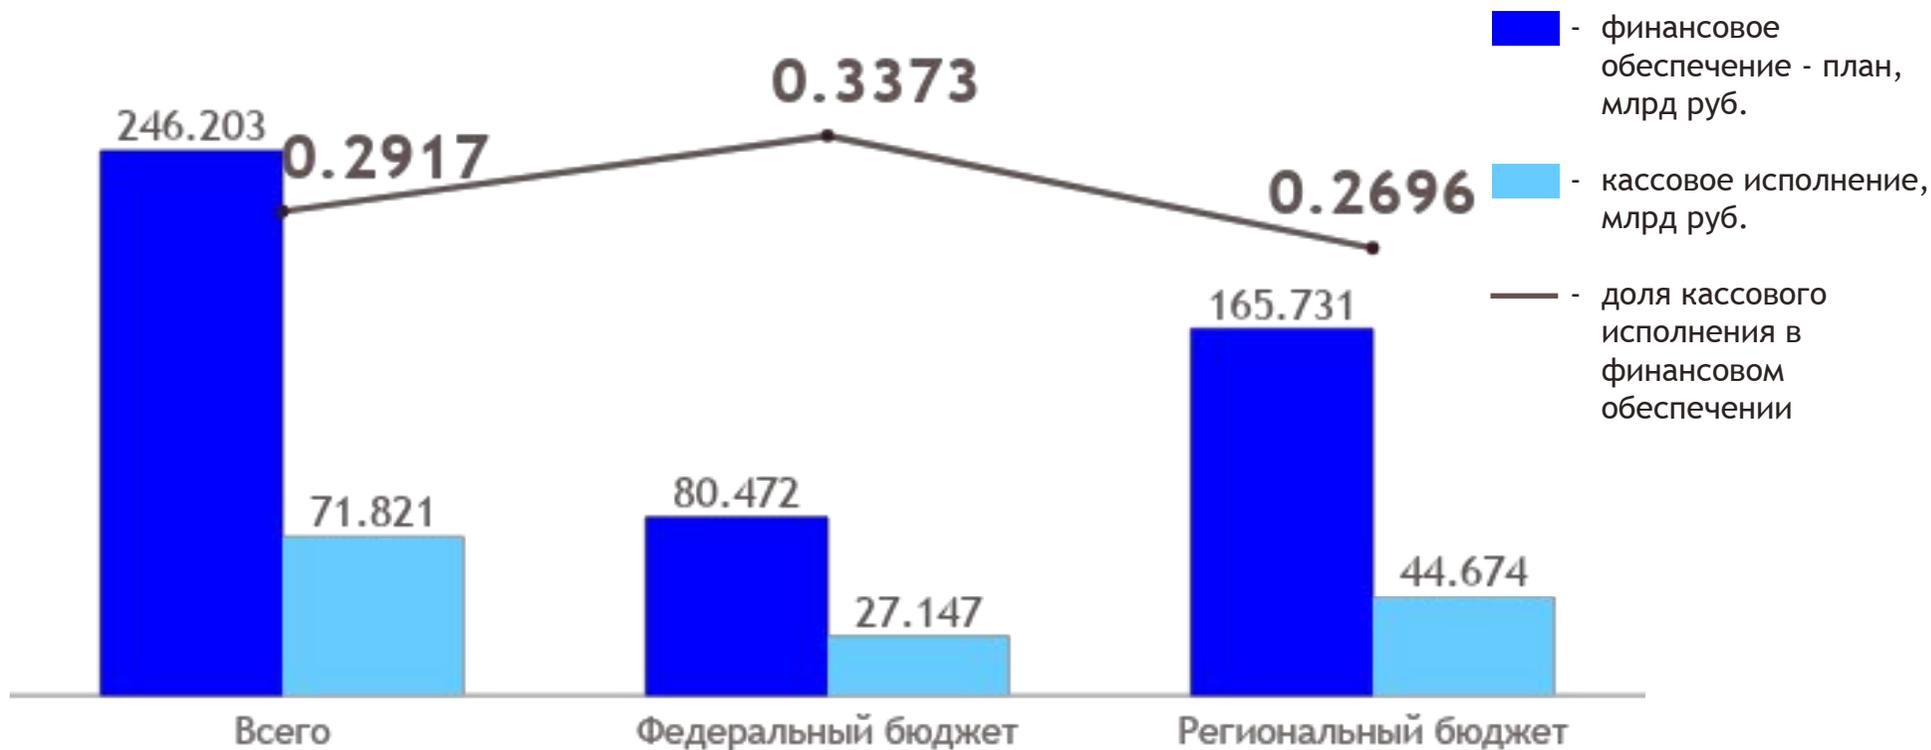

*В СОУ «Эталон» отсутствуют данные по освоению бюджета в Московской области (в 2020 году на ФП «Дорожная сеть» регионом предусмотрено 10,8 млрд руб.)

Планирование работ

Выполнение плана работ на 2020 год



Не обеспечивают минимальную протяженность объектов, необходимую для достижения целевых показателей

2 субъекта РФ

на а/д регионального значения

Отклонение: - 61,1 км

9 субъектов РФ

на дорожной сети городских агломераций

Отклонение: -212,95 км

Контрактация объектов в 2020 году

Объекты	Запланировано	Включено в план-график	Заключено контрактов по объектам	Отклонение от плана, абс.	Выполнение плана, %
Линейные объекты	5 090 ед.	5 013 ед.	4 997 ед.	- 93	98,0%
	14 727,9 км		14 316,8 км	- 411,1	97,2%
Прочие объекты	782 ед.	766 ед.	748 ед.	- 38	95,4%
Всего	5 912 ед.	5 814 ед.	5 781 ед.	- 131	97,8%



Объекты	Запланировано	Включено в план-график	Заключено контрактов по объектам	Отклонение от плана, абс.	Выполнение плана, %
<i>Объекты экономики*</i>	<i>115 ед.</i>	<i>114 ед.</i>	<i>104 ед.</i>	<i>- 11</i>	<i>90,4%</i>

*Линейные и прочие объекты, запланированные к реализации за счет средств, сэкономленных в результате конкурсных процедур

■ - отклонение от плана; ■ - соответствие плану


Выполнение задания текущего года



К настоящему моменту завершены работы на **925 объектах**. Введенная протяженность линейных объектов – **1 475,1 км**.


Выполнение работ на объектах текущего года

Объем выполнения дорожных работ в 2020 году

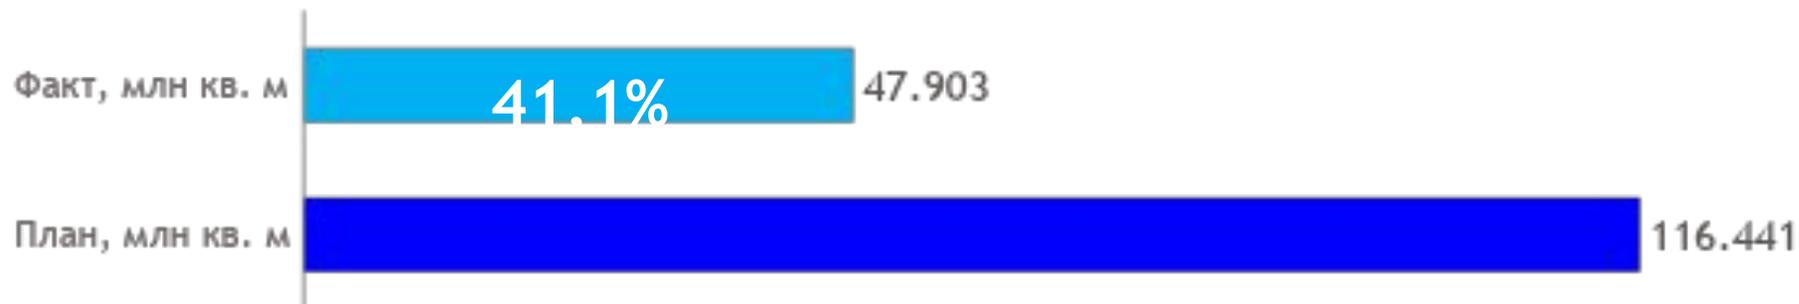


Планирование работ

Количество контрактов на принципах КЖЦ (факт)

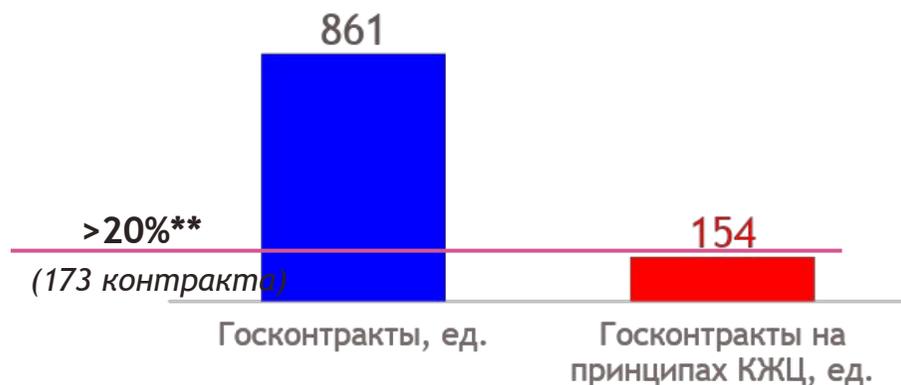

Количество контрактов с использованием НИИТ* (факт)

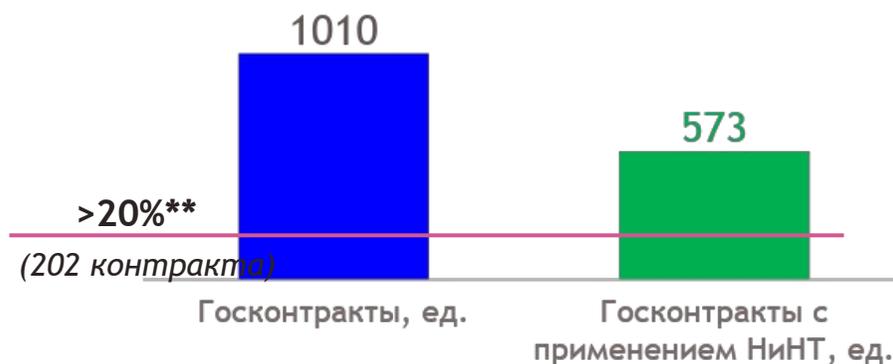


В 2020 году предусмотрено выполнение работ:

Показатель	План на 2020 год	Выполнено субъектом РФ	Откл., абс.	Выполнение, %
Размещение АПВГК на автомобильных дорогах	143	13	- 130	9,9%
Установка камер фотовидеофиксации	2 430	484	- 1 946	19,9%
Внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем	26	1	- 25	3,8%

*Новые и наилучшие технологии **Целевое значение показателя в 2020 году


■ - отклонение от плана; ■ - соответствие плану

Достижение прогнозных показателей числа погибших в ДТП (на 30.06.2020)

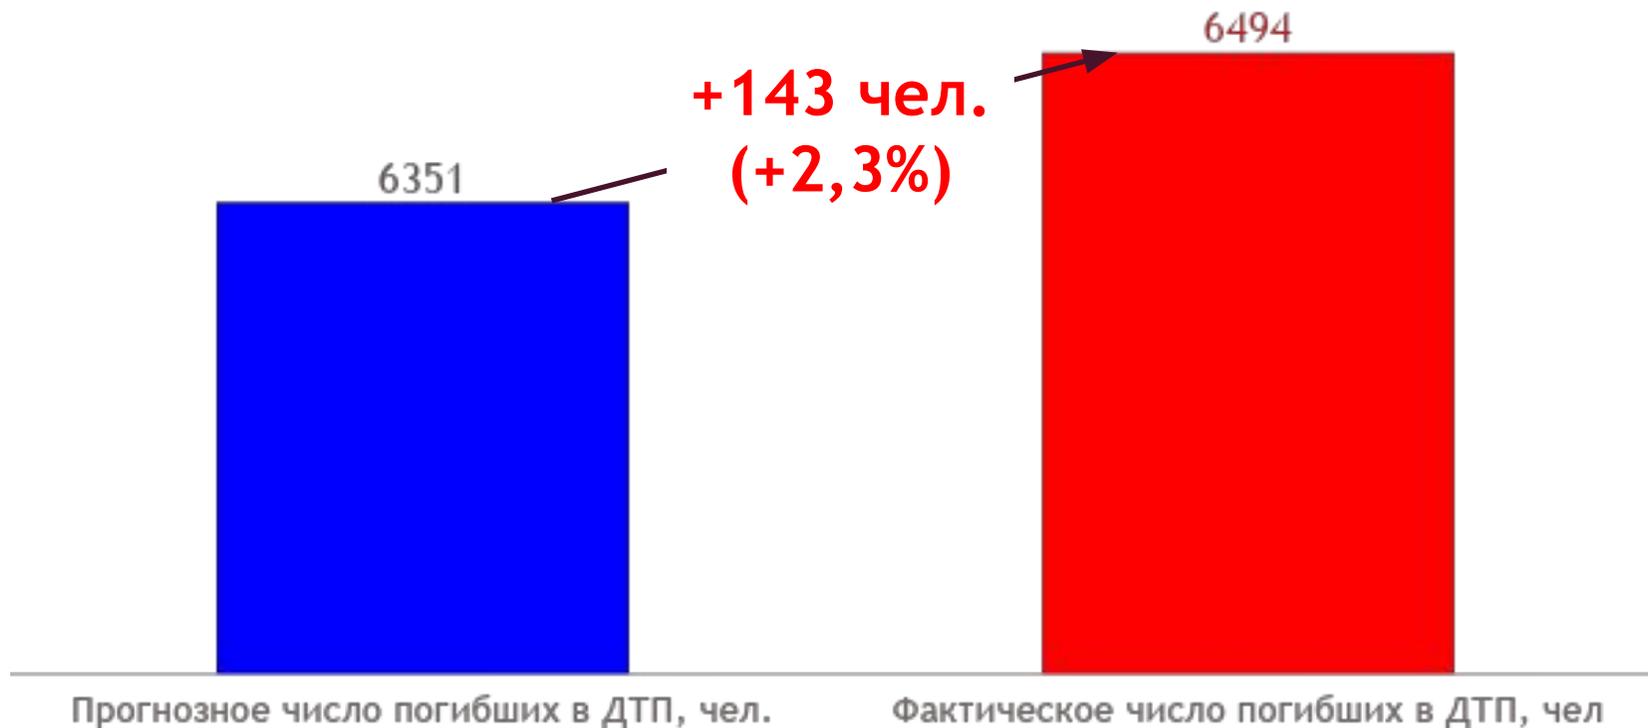

По состоянию на 30.06.2020 прогнозное значение показателя погибших в ДТП **превышено на 2,3%**. Существует риск недостижения целевого показателя. Риск недостижения показателя отмечен в 46 субъектах Российской Федерации

Финансовое обеспечение реализации работ (на 02.07.2020)

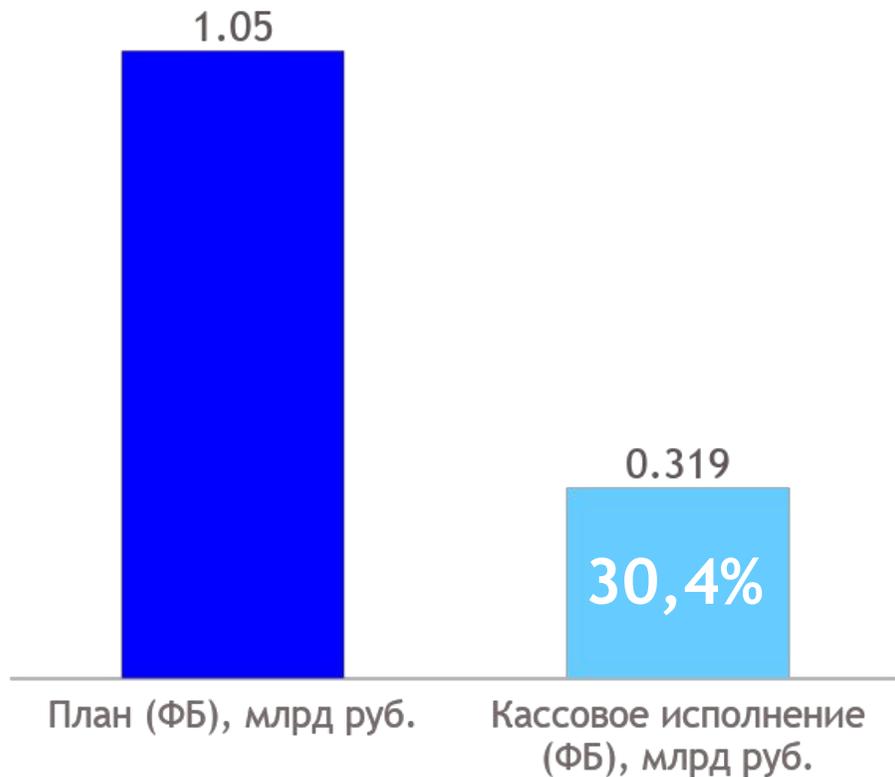

Выполнение задания текущего года (на 02.07.2020)

