


ЭЧ-16 ППС-39 км

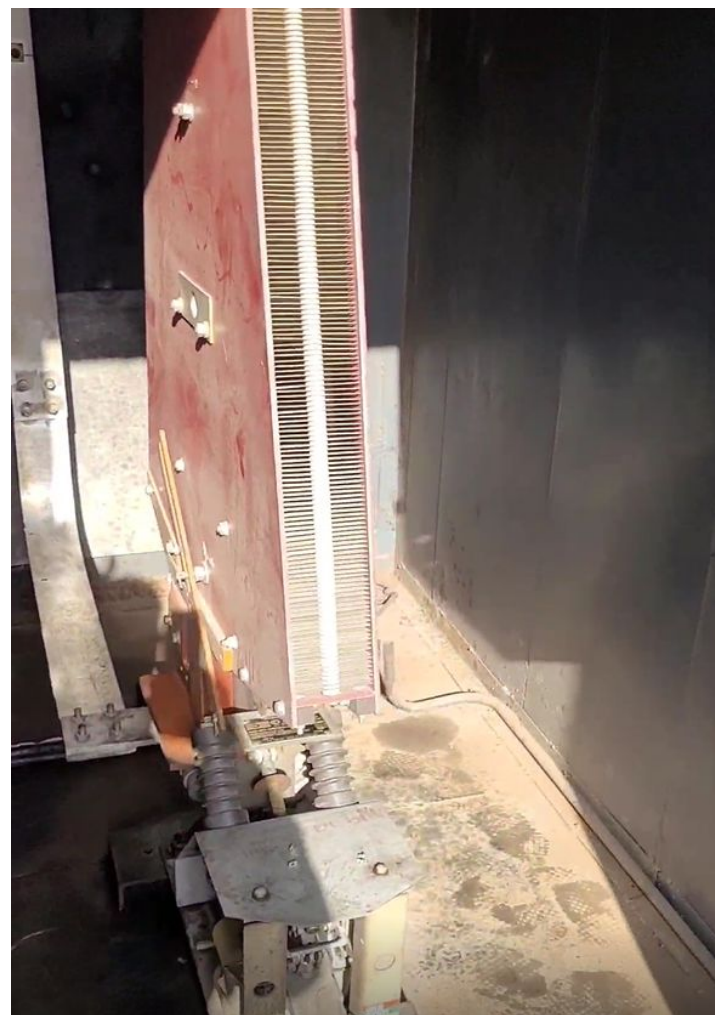

ЭЧ-16 ППС-39 км

- Мероприятия:
- 1.обеспечить наличие оперативно- технической документации
- 2.обеспечить наличие оперативных наименований на всех коммутационных аппаратах
- 3.восстановить работоспособность блокировочных устройств
- 4.обеспечить контроль отключенного положения С1, С2
- 5.отремонтировать заземляющий нож
- 6. восстановить освещение
- 7.совместно с техническим центром провести расчет пропускной способности при выводе из работы ППС

ЭЧ-16

ППС-39 км

Акт осмотра и проверки оборудования ППС –39 км от 13.10.2022 г.

Во исполнение телеграфного указания за № ИСХ-13088/МОСК от 07.10.2022 г. проведено комиссионное обследование пунктов параллельного соединения (далее ППС) на предмет наличия и работоспособности блокировочных устройств, препятствующих самостоятельному открытию входных дверей ППС обслуживающим персоналом без включения заземляющих устройств и полного отключения электроустановки, на наличие технической документации на эксплуатируемом электрооборудовании, утвержденных однолинейных и оперативных схем и ознакомления обслуживающего персонала с безопасными условиями труда в случаях изменения любых конструктивных решений ППС, на предмет использования и правильности применения средств индивидуальной и коллективной защиты, производственного оборудования и инструмента, соблюдение технологических процессов обслуживающим персоналом.

В ходе обследования ППС – 39 км перегона Овражки - Гжель выявлено следующее:

- блокировка безопасности на отключение ППС от земляной защиты при открытии входной двери ППС неисправна и демонтирована;
- заземляющий нож неисправен;
- отсутствует оперативная и однолинейная схема ППС;
- отсутствует оперативный журнал;
- отсутствует освещение внутри ППС;
- отопление ППС отключено;

- вентиляционная решетка в ППС не закрыта;

- отсутствует схема блокировки ППС;

- лестница для подъема на ППС закрыта на навесной замок, отсутствует электромагнитная блокировка.

Зам.НГ

Некрасов П.Д.

Нач.отд.НБТ

Головастов В.В.

ЭЧЗп-16



Журавлев О.А.

РРУ

Кошелев Д.В.
