



Федеральное агентство по обустройству
государственной границы Российской Федерации



**«О ходе строительства и проектирования
пунктов пропуска в целях обеспечения
подготовки и проведения саммита АТЭС
2012 года во Владивостоке»**



Доклад руководителя ФГКУ Росгранстрой С.В. Сазонова₁



Объекты ФГКУ Росгранстрой в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 в г. Владивосток

Проектирование

(5 проектов на рассмотрении в ФГУ «Главгосэкспертиза России»)

Строительство

(начато 27 января 2011 года)

АПП «Краскино»

МПП «Восточный»

МПП «Находка»

МПП «Владивосток»

(проектная документация утверждена государственным заказчиком)

ВПП «Владивосток»

ВПП «Хабаровск»

АПП «Пограничный»



Контракт № 36СМР от 21.12.2010

на выполнение работ по разработке рабочей документации на строительство, выполнение строительно-монтажных работ и оснащение МАПП «Краскино».

Начало – 27.01.2011

Окончание – 10.12.2011

Ввод в эксплуатацию – 21.12.2011



Землеотвод

- выделен и оформлен земельный участок **8,1 га**;
- ведется **оформление** земельных участков, примыкающих к пункту пропуска на въезд–выезд;
- решается вопрос по переводу земель из категории особо охраняемых в земли промышленности и иного специального назначения.



Проектирование

19.01.2011 проектная документация по объекту передана Генеральному подрядчику установленным порядком.

Положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России»

№ 25-1-5-0054-09 от 02.06.2009г.



Состояние обустройства МАПП «Краскино»

Строительство

27.01.11 строительная площадка передана подрядчику.

04.03.11 начало строительства объекта зарегистрировано в органах Государственного строительного надзора (№08/03).

<i>Персонал и техника на объекте (в среднем в сутки)</i>	<i>ед.</i>
Рабочий персонал (чел.)	63
ИТР на стройплощадке (чел.)	10
Техника (бульдозеры – 4, экскаваторы – 2, катки – 2, самосвалы – 6, фронтальный погрузчик – 1).	15



Состояние обустройства МАПП «Краскино»

7

Строительство



Здание № 4



Состояние обустройства МАПП «Краскино»

8

Строительство



Здание № 7



Состояние обустройства МАПП «Краскино»

9

Строительство

Здание № 8






Строительство



Здание № 10

Строительная готовность МАПП «Краскино» на 25 мая 2011 года

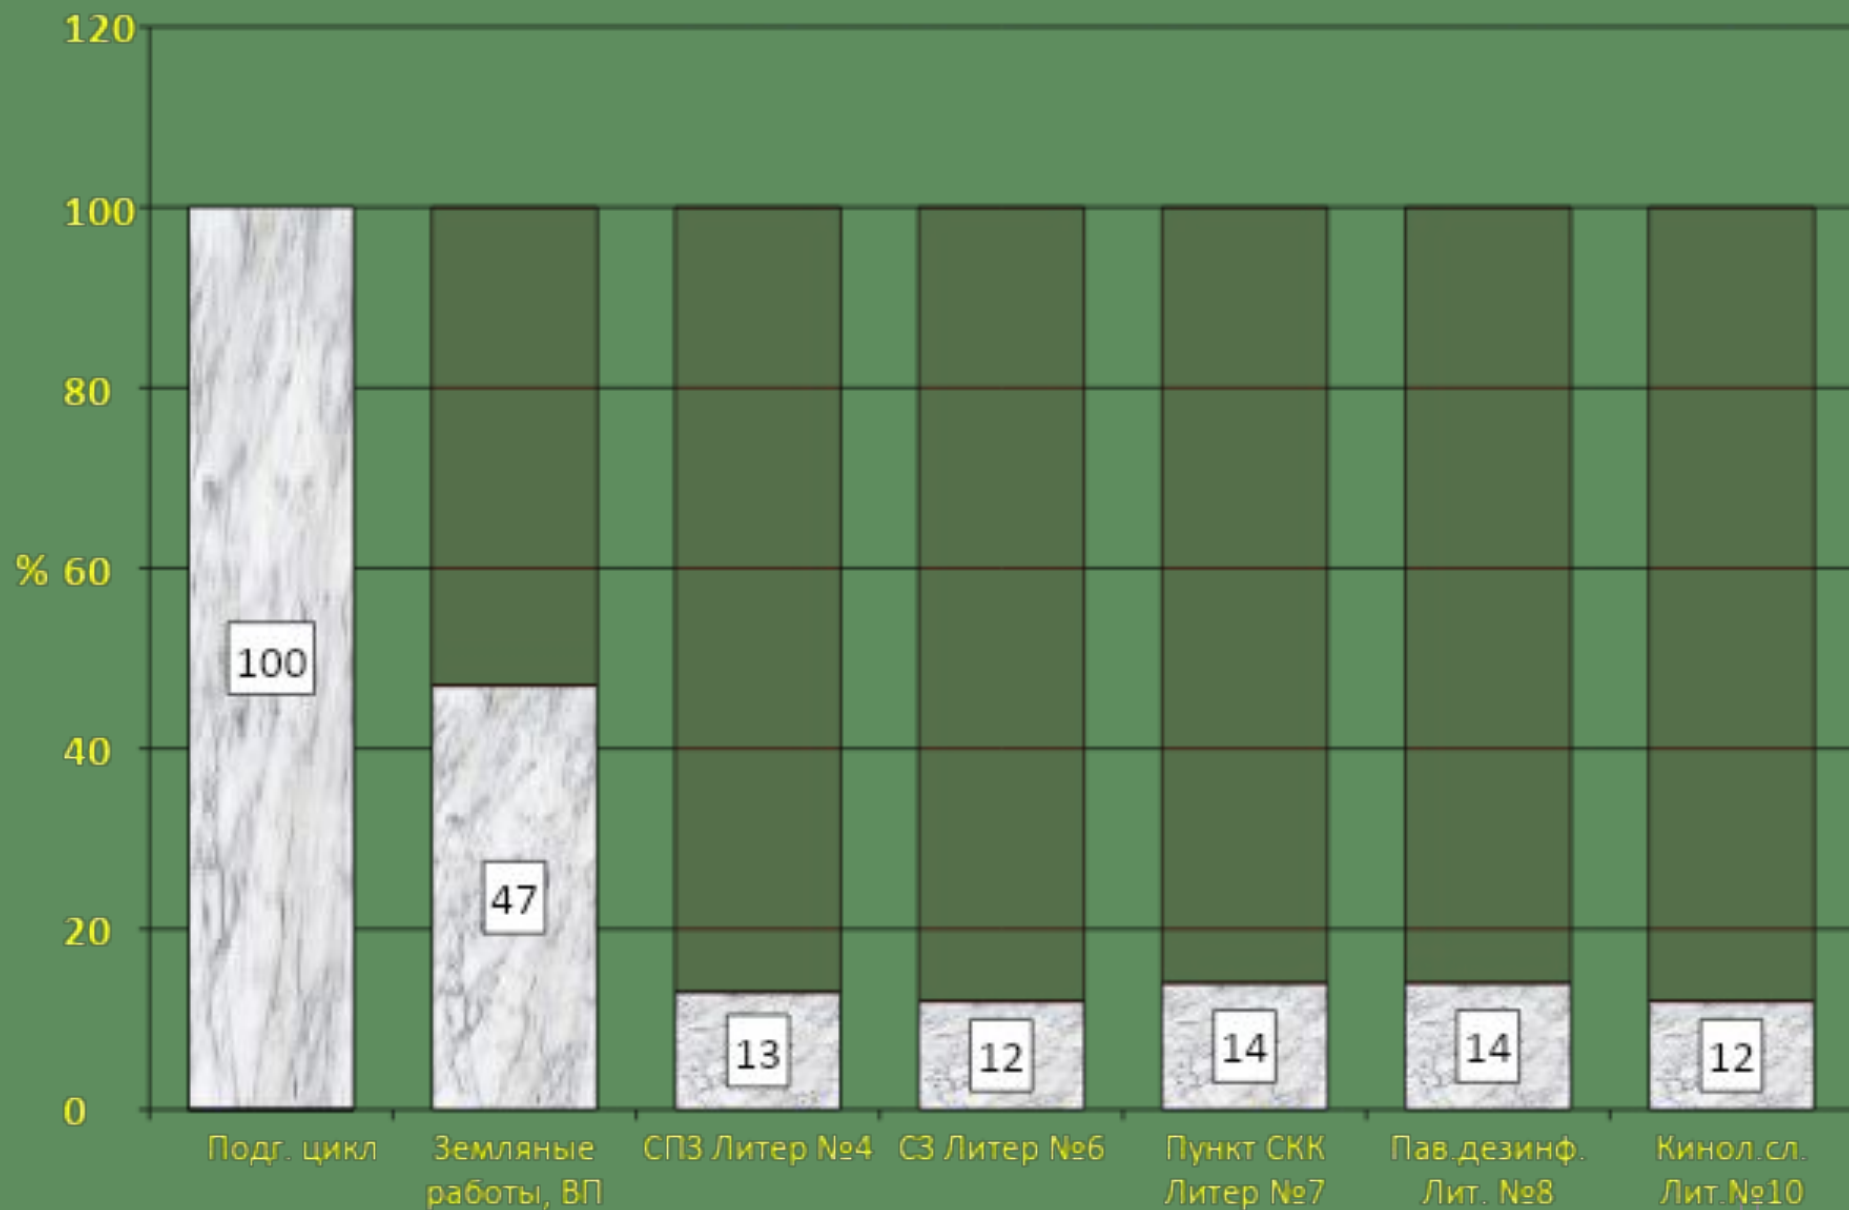



ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПО МАПП «КРАСКИНО»

Не завершено оформление **дополнительных земельных участков** для обустройства въезда-выезда МАПП «Краскино», а также **перевод земель** из категории особо охраняемых в земли промышленности и иного специального назначения

Согласование измененной схемы генплана и благоустройства, выполнения каркаса служебно-административного здания из металлоконструкций, а ограждающих конструкций – из сендвич-панелей с базальтовым утеплителем, подразумевает увеличение затрат на строительство, выполнение дополнительных теплотехнических расчетов, а также **повторное прохождение Главгосэкспертизы.**

Необходимо проработать возможность обеспечения МАПП «Краскино» и «Пограничный» электроэнергией **от промышленной сети со стороны Китайской Народной Республики**

Необходимо активное участие Приморского края, а также Росавтодора, в оборудовании **подъездных дорог** к МАПП «Краскино»



Федеральное агентство по обустройству
государственной границы Российской Федерации



**«Строительство и проектирование пунктов
пропуска в целях обеспечения подготовки
и проведения саммита АТЭС 2012 года во
Владивостоке»**



Доклад руководителя ФГКУ Росгранстрой
С.В. Сазонова
