



Информация об объемах выполненных работ на 20 июля

1

№ п/п	МО	Всего лимит, млн.руб.	Вып. объемы работ, млн. руб.	% вып. работ от лимита	№ п/п	МО	Всего лимит, млн.руб.	Вып. объемы работ, млн. руб.	% вып. работ от лимита
1		2	3	4		1	2	3	4
1	Агрызский	24,89	22,14	88,95	13	Буинский	26,09	24,59	94,24
2	Азнакаевский	87,38	81,28	93,01	14	Верхнеуслонский	3,97	3,74	94,35
3	Аксубаевский	6,51	5,48	84,16	15	Высокогорский	19,61	17,53	89,43
4	Актанышский	11,01	11,01	100,00	16	г. Казань	1 311,21	1 052,89	80,30
5	Алексеевский	8,05	6,45	80,20	17	г. Наб. Челны	1 060,87	985,91	92,93
6	Алькеевский	0,89	0,87	97,36	18	Дрожжановский	1,87	1,87	100,00
7	Альметьевский	223,50	195,66	87,55	19	Елабужский	112,59	97,10	86,24
8	Апастовский	2,34	2,34	100,00	20	Заинский	72,43	63,21	87,27
9	Арский	15,97	15,97	100,00	21	Зеленодольский	188,00	167,12	88,90
10	Бавлинский	30,28	25,85	85,39	22	К-Устьинский	7,85	7,46	94,93
11	Балтасинский	4,99	4,44	88,99	23	Кукморский	17,84	16,63	93,23
12	Бугульминский	194,18	157,38	81,05	24	Лаишевский	16,85	16,70	99,12



Информация об объемах выполненных работ на 20 июля

2

№ п/п	МО	Всего лимит, млн.руб.	Вып. объемы работ, млн. руб.	% вып. работ от лимита	№ п/п	МО	Всего лимит, млн.руб.	Вып. объемы работ, млн. руб.	% вып. работ от лимита
	1	2	3	4		1	2	3	4
25	Лениногорский	116,44	106,61	91,56	35	Сабинский	9,50	8,66	91,19
26	Мамадышский	14,60	13,97	95,64	36	Сармановский	40,21	38,67	96,17
27	Менделеевский	37,26	33,88	90,91	37	Спасский	8,01	7,99	99,76
28	Мензелинский	19,73	17,78	90,13	38	Тетюшский	9,16	8,02	87,47
29	Муслюмовский	4,83	4,70	97,36	39	Тукаевский	29,33	27,00	92,06
30	Нижнекамский	432,76	378,09	87,37	40	Тюлячинский	1,02	1,02	100,00
31	Новошешминский	3,67	3,57	97,09	41	Черемшанский	2,01	1,88	93,52
32	Нурлатский	54,51	53,48	98,11	42	Чистопольский	90,07	80,05	88,87
33	Пестречинский	5,06	5,06	100,00	43	Ютазинский	24,29	21,93	90,30
34	Р-Слободский	4,96	4,87	98,21	Итого по РТ		4 356,59	3 800,84	87,24



Информация об **актах** **выполненных работ** на 20 июля

3

№ п/п	МО	Сумма КС-2, млн. рублей	% принятых КС-2 от выполненных работ	№ п/п	МО	Сумма КС-2, млн. рублей	% принятых КС-2 от выполненных работ
1	2	3		1	2	3	
1	Агрызский	15,86	71,63	13	Буинский	15,32	62,28
2	Азнакаевский	74,51	91,67	14	Верхнеуслонский	1,61	42,98
3	Аксубаевский	4,66	85,05	15	Высокогорский	13,79	78,66
4	Актанышский	11,01	100,00	16	г. Казань	543,72	51,64
5	Алексеевский	5,27	81,69	17	г. Наб. Челны	505,14	51,24
6	Алькеевский	0,87	100,00	18	Дрожжановский	1,87	100,00
7	Альметьевский	109,25	55,84	19	Елабужский	68,48	70,53
8	Апастовский	2,34	100,00	20	Заинский	35,60	56,32
9	Арский	13,39	83,84	21	Зеленодольский	101,76	60,89
10	Бавлинский	16,23	62,78	22	Камско-Устьинский	5,98	80,21
11	Балтасинский	3,86	86,90	23	Кукморский	14,20	85,40
12	Бугульминский	66,41	42,19	24	Лаишевский	12,93	77,43



Информация об **актах** **выполненных работ** на 20 июля

4

№ п/п	МО	Сумма КС-2, млн. рублей	% принятых КС-2 от выполненных работ		МО	Сумма КС-2, млн. рублей	% принятых КС-2 от выполненных работ
25	Лениногорский	80,68	75,68	35	Сабинский	8,02	92,51
26	Мамадышский	11,70	83,80	36	Сармановский	20,03	51,79
27	Менделеевский	19,96	58,91	37	Спасский	7,79	97,42
28	Мензелинский	10,55	59,35	38	Тетюшский	4,44	55,42
29	Муслюмовский	3,21	68,21	39	Тукаевский	18,76	69,47
30	Нижнекамский	190,87	50,48	40	Тюлячинский	1,02	100,00
31	Новошешминский	2,82	79,12	41	Черемшанский	0,82	43,77
32	Нурлатский	40,72	76,15	42	Чистопольский	49,44	61,77
33	Пестречинский	4,55	89,93	43	Ютазинский	13,93	63,53
34	Рыбно-Слободский	4,08	83,85		Итого по РТ	2 137,45	56,24



Информация о **завершенных домах** на 20 июля

№ п/п	МО	Кол-во домов по Программе	Кол-во завершенных домов	Кол-во домов, принятых ГЖИ	№ п/п	МО	Кол-во домов по Программе	Кол-во завершенных домов	Кол-во домов, принятых ГЖИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Агрызский	11	3	2	11	Бугульминский	50	13	5
2	Азнакаевский	22	15	10	12	Верхнеуслонский	2	1	
3	Актанышский	3	3		13	Высокогорский	7	3	2
4	Алексеевский	11	9	7	14	г. Казань	202	48	
5	Алькеевский	1	1		15	г. Наб. Челны	161	81	7
6	Альметьевский	24	5		16	Дрожжановский	2	2	2
7	Апастовский	1	1	1	17	Елабужский	24	12	2
8	Арский	7	7	2	18	Зеленодольский	36	18	11
9	Бавлинский	5	1	1	19	К-Устьинский	4	2	
10	Буинский	9	5		20	Кукморский	6	3	



Информация о **завершенных домах** на 20 июля

№ п/п	МО	Кол-во домов по Программе	Кол-во завершенных домов	Кол-во домов, принятых ГЖИ	№ п/п	МО	Кол-во домов по Программе	Кол-во завершенных домов	Кол-во домов, принятых ГЖИ
	1	2	3	4		1	2	3	4
21	Лаишевский	8	8		31	Сабинский	4	3	
22	Лениногорский	20	4		32	Сармановский	15	8	
23	Мамадышский	6	3		33	Спасский	2	2	2
24	Менделеевский	3	1		34	Тетюшский	5	2	
25	Мензелинский	3	3		35	Тукаевский	14	9	
26	Нижнекамский	105	43	5	36	Тюлячинский	1	1	
27	Новошешминский	1	1		37	Черемшанский	7	1	
28	Нурлатский	12	7	4	38	Чистопольский	14	1	
29	Пестречинский	2	2		39	Ютазинский	13	7	
30	Р-Слободский	2	1		Итого по РТ		825	340	63



Финансирование программ капитального ремонта

Источники финансирования	Лимит, тыс. рублей	Перечислено на счета УК и ТСЖ, тыс. рублей	%
ФОНД	769 893,0	766 274,9	99
РТ	1 373 131,0	685 297,7	50
МО	1 200 907,6	686 832,3	57
СОБСТВЕННИКИ	1 382 928,6	785 805,3	57
ИТОГО	4 726 860,2	2 924 210,3	62



Перечисление средств бюджетов МО на счета УК и ТСЖ на 20 июля

8

№ п/п	МО	Лимит, млн. руб.	Перечислено на УК и ТСЖ, млн. руб.	%	№ п/п	МО	Лимит, млн. руб.	Перечислено на УК и ТСЖ, млн. руб.	%
1	2	3	4		1	2	3	4	
1	Агрызский	6,40	6,40	100,00	13	Буинский	3,97	3,97	100,00
2	Азнакаевский	18,57	13,42	72,28	14	В-Услонский	0,95	0,95	100,00
3	Аксубаевский	1,79	1,79	100,00	15	Высокогорский	7,92	7,92	100,00
4	Актанышский	4,00	4,00	100,00	16	Дрожжановский	0,27	0,27	100,00
5	Алексеевский	1,92	1,92	100,00	17	Елабужский	31,54	28,38	90,00
6	Алькеевский	0,37	0,37	100,00	18	Заинский	15,98	15,98	100,00
7	Альметьевский	88,50	55,20	62,37	19	Зеленодольский	48,93	36,72	75,04
8	Апастовский	0,77	0,77	100,00	20	г. Казань	409,21	135,50	33,11
9	Арский	2,61	2,61	100,00	21	К-Устьинский	1,71	1,71	100,00
10	Бавлинский	7,61	7,61	100,00	22	Кукморский	4,39	4,39	100,00
11	Балтасинский	1,13	1,13	100,00	23	Лаишевский	5,68	4,51	79,47
12	Бугульминский	49,22	33,86	68,81	24	Лениногорский	27,07	27,07	100,00



Перечисление средств бюджетов МО на счета УК и ТСЖ на 20 июля

№ п/п	МО	Лимит, млн. руб.	Перечислено на УК и ТСЖ, млн. руб.	%	№ п/п	МО	Лимит, млн. руб.	Перечислено на УК и ТСЖ, млн. руб.	%
	1	2	3	4		1	2	3	4
25	Мамадышский	4,27	2,68	62,73	35	Сабинский	2,25	2,25	100,00
26	Менделеевский	12,92	8,00	61,92	36	Сармановский	9,13	9,13	100,00
27	Мензелинский	6,30	6,30	100,00	37	Спасский	1,51	1,51	100,00
28	Муслюмовский	1,92	1,92	100,00	38	Тетюшский	1,83	1,83	100,00
29	г. Наб. Челны	267,35	164,34	61,47	39	Тукаевский	6,72	4,66	69,35
30	Нижнекамский	104,51	55,44	53,05	40	Тюлячинский	0,15	0,15	100,00
31	Новошешминский	1,38	1,38	100,00	41	Черемшанский	0,62	0,62	100,00
32	Нурлатский	11,29	11,29	100,00	42	Чистопольский	19,79	10,39	52,53
33	Пестречинский	2,46	2,46	100,00	43	Ютазинский	4,66	4,66	100,00
34	Р-Слободский	1,40	1,40	100,00	Итого по РТ		1 200,91	686,83	57,19



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ на 20 июля

№ п/п	МО	Прогноз на 6 месяцев	Зачислено на счета ГИСУ	№ п/п	МО	Прогноз на 6 месяцев	Зачислено на счета ГИСУ
1	2	3		1	2	3	
1	Агрызский	5,53	5,57	13	Буинский	5,80	6,97
2	Азнакаевский	19,41	20,28	14	В-Услонский	0,88	0,87
3	Аксубаевский	1,45	1,47	15	Высокогорский	4,35	4,63
4	Актанышский	1,90	2,30	16	Дрожжановский	0,41	0,42
5	Алексеевский	1,94	1,94	17	Елабужский	30,08	30,88
6	Алькеевский	0,17	0,19	18	Заинский	16,08	16,52
7	Альметьевский	64,70	66,38	19	Зеленодольский	41,75	46,44
8	Апастовский	0,52	0,69	20	К-Устьинский	1,74	2,15
9	Арский	3,55	3,70	21	Кукморский	3,96	4,20
10	Бавлинский	6,72	7,85	22	Лаишевский	3,74	3,82
11	Балтасинский	1,11	1,07	23	Лениногорский	28,24	30,59
12	Бугульминский	43,12	47,26	24	Мамадышский	3,24	3,65



Перечисление средств граждан на счета ГИСУ на 20 июля

№ п/п	МО	Прогноз на 6 месяцев	Зачислено на счета ГИСУ	№ п/п	МО	Прогноз на 6 месяцев	Зачислено на счета ГИСУ
	1	2	3		1	2	3
25	Менделеевский	10,71	10,56	35	Спасский	1,79	1,73
26	Мензелинский	4,38	4,75	36	Тетюшский	2,03	2,60
27	Муслюмовский	1,07	1,73	37	Тукаевский	6,51	7,66
28	Нижнекамский	115,80	117,94	38	Тюлячинский	0,23	0,25
29	Новошешминский	0,82	0,91	39	Черемшанский	0,58	0,65
30	Нурлатский	10,71	10,81	40	Чистопольский	20,00	21,17
31	Пестречинский	1,12	1,30	41	Ютазинский	4,94	5,53
32	Р-Слободский	1,10	1,10	42	Казань	337,65	218,35
33	Сабинский	2,11	2,17	43	Наб. Челны	235,60	260,77
34	Сармановский	8,93	10,46	Итого по РТ		1 056,52	990,4



Информация об оформлении актов сверок на 18 июля

МО	Общее кол-во управляющих организаций	Получено web-кабинетов	Наличие актов сверки за июнь	%	МО	Общее кол-во управляющих организаций	Получено web-кабинетов	Наличие актов сверки за июнь	%
Агрызский	5	5	3	60	Буинский	9	9	8	89
Азнакаевский	9	9	8	89	Верхнеуслонский	1	1	1	100
Аксубаевский	8	8	5	63	Высокогорский	13	13	7	54
Актанышский	1	1	0	0	г. Казань	673	18	12	7
Алексеевский	10	10	10	100	г. Наб. Челны	24	22	9	38
Алькеевский	1	1	1	100	Дрожжановский	1	1	1	100
Альметьевский	40	40	20	50	Елабужский	26	26	25	96
Апастовский	3	3	3	100	Заинский	9	9	8	89
Арский	1	1	1	100	Зеленодольский	67	67	67	100
Бавлинский	2	2	1	50	К-Устьинский	3	3	2	67
Балтасинский	2	2	1	50	Кукморский	1	1	1	100
Бугульминский	12	12	11	92	Лаишевский	4	4	3	75



Информация об оформлении актов сверок на 18 июля

МО	Общее кол-во управляющих организаций	Получено web-кабинетов	Наличие актов сверки за июнь	%	МО	Общее кол-во управляющих организаций	Получено web-кабинетов	Наличие актов сверки за июнь	%
Лениногорский	28	23	9	32	Сабинский	1	1	1	100
Мамадышский	1	1	0	0	Сармановский	9	9	7	78
Менделеевский	3	3	1	33	Спасский	2	2	0	0
Мензелинский	4	4	3	75	Тетюшский	1	1	1	100
Муслюмовский	1	1	1	100	Тукаевский	20	20	2	10
Нижнекамский	30	30	21	70	Тюлячинский	1	1	1	100
Новошешминский	1	1	1	100	Черемшанский	2	2	1	50
Нурлатский	9	9	7	78	Чистопольский	4	4	2	50
Пестречинский	2	2	1	50	Ютазинский	6	6	5	83
Р-Слободский	4	4	1	25	Итого по РТ	1 056	394	274	26



Оформление **актов сверки** (за июнь)

Управляющие организации		Акты сверки представили		%	
УК	ТСЖ, ЖСК	УК	ТСЖ, ЖСК	УК	ТСЖ, ЖСК
204	852	109	165	53	19
Итого: 1 056		Итого: 274		Итого: 26	



Количество представленных кадастровых паспортов

№ п/п	МО	Кол-во паспортов всего	Представлено, шт.	№ п/п	МО	Кол-во паспортов всего	Представлено, шт.
1	2	3	3	1	2	3	3
1	Агрызский	78	78	14	Верхнеуслонский	22	20
2	Азнакаевский	145	145	15	Высокогорский	86	73
3	Аксубаевский	25	25	16	Дрожжановский	22	15
4	Актанышский	32	32	17	Елабужский	155	152
5	Алексеевский	45	40	18	Заинский	127	127
6	Алькеевский	13	12	19	Зеленодольский	204	186
7	Альметьевский	244	234	20	г. Казань	928	698
8	Апастовский	19	19	21	К-Устьинский	46	44
9	Арский	55	54	22	Кайбицкий	7	6
10	Бавлинский	69	59	23	Кукморский	55	48
11	Балтасинский	22	22	24	Лаишевский	113	113
12	Бугульминский	272	270	25	Лениногорский	228	219
13	Буинский	77	75	26	Мамадышский	79	69



Количество представленных кадастровых паспортов

№ п/п	МО	Кол-во паспортов всего	Представлено, шт.	№ п/п	МО	Кол-во паспортов всего	Представлено, шт.
1	2	3	3	1	2	3	3
27	Менделеевский	85	84	36	Сабинский	70	65
28	Мензелинский	77	64	37	Сармановский	85	85
29	Муслюмовский	28	28	38	Спасский	37	37
30	Наб.Челны	786	786	39	Тетюшский	29	28
31	Нижнекамский	510	508	40	Тукаевский	194	158
32	Новошешминский	32	29	41	Тюлячинский	8	6
33	Нурлатский	75	75	42	Черемшанский	22	22
34	Пестречинский	46	46	43	Чистопольский	146	94
35	Р-Слободский	44	36	44	Ютазинский	82	75
Итого по РТ						5 524	5 061



Наличие кадастровых паспортов по дополнительной ПКР на 2012 год

МО	Кол-во паспортов всего	Представлено, шт.	Не представлено, шт.
Альметьевский	3	3	0
г. Казань	61	58	3
Лаишевский	1	1	0

Капитальный ремонт фасадов и кровли многоквартирных домов, расположенных в зонах гостеприимства Универсиады 2013



Подрядные организации на производство работ:

- по объектам ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» – 17 подрядных организаций;
- по объектам Исполнительного комитета МО г. Казани – 10 подрядных организаций

Заказчик	Всего домов	Работы начаты	% начатых работ
ГИСУ РТ	116	72	62
Исполком МО г. Казани	124	102	82
ВСЕГО	240	174	73

Капитальный ремонт фасадов и кровли многоквартирных домов, расположенных в зонах гостеприимства Универсиады 2013

Срок завершения работ – 30.09.2012

Г

Заказчик	Общее количество домов-памятников	Работы начаты	Работы не ведутся
ГИСУ РТ	9	4	5
Исполком МО г. Казани	6	4	2
ВСЕГО	15	8	7



Информация о выполнении Программы установки 2-х контурных котлов (ПКМ РТ от 21.05.№397)

МО	Кол-во кв. по программе	Фасадный газопровод	Внутр. газоснабжение	Внутр. отопление	МО	Кол-во кв. по программе	Фасадный газопровод	Внутр. газоснабжение	Внутр. отопление
Агрызский	250	249	216	83	Мамадышский	64	32	32	10
Азнакаевский	12				Менделеевский	152			
Алексеевский	818	781	680	539	Новошешминский	22	24	21	21
Балтасинский	102	60	76	52	Пестречинский	1	1	1	1
Буинский	8				Рыбно-Слободский	379	267	216	217
Бугульминский	350	281	227	154	Сабинский	397	280	282	205
Верхнеуслонский	129	82	72	72	Сармановский	652	610	582	375
Высокогорский	147	52	89	38	Спасский	54	54	36	34
Дрожжановский	10				Тетюшский	158	7	7	7
Елабужский	160	28	41	46	Тюлячинский	14	14	14	10
Заинский	6				Чистопольский	498	411	355	293
Зеленодольский	77				Ютазинский	10			
Кукморский	96	96	96	96					
Лениногорский	561	389	347	239	ИТОГО: Динам. за 2 недели:	5092	3718 +288	3390 +271	2492 +495



Сбор заявлений и договоров Программы установки 2-х контурных котлов (ПКМ РТ от 21.05.№397)

МО	Кол-во квартир по программе	Кол-во заявлений от населения	% сбора заявлений	МО	Кол-во квартир По программе	Кол-во заявлений от населения	% сбора заявлений
Агрызский	250	179	72	Мамадышский	64	50	78
Азнакаевский	12	12	100	Менделеевский	152	130	86
Алексеевский	819	791	96	Новошешминский	21	21	100
Балтасинский	101	101	100	Пестречинский	1	1	100
Буинский	8	8	100	Рыбно-Слободский	379	256	67
Бугульминский	350	350	100	Сабинский	397	366	92
Верхнеуслонский	79	79	100	Сармановский	652	630	97
Высокогорский	147	147	100	Спасский	52	52	100
Дрожжановский	10	10	100	Тетюшский	158	7	4
Елабужский	160	125	78	Тюлячинский	14	14	100
Заинский	6	6	100	Чистопольский	514	475	92
Зеленодольский	77	55	71	Ютазинский	10	4	40
Кукморский	96	96	100	ИТОГО:	5092	4509	80
Лениногорский	561	533	95	Динамика за 2 нед.:		+88	



Информация по проектированию и строительству объектов водоснабжения на 2012г.

22

МО	Количество объектов водоснабжения	Наличие ПСД	Наличие экспертизы	Построено водопроводов по состоянию на 05.07 (м.)	Пробурено скважин (шт.)
Азнакаевский	8	5	4	6000	1
Акубаевский	2	1		400	1
Актанышский	1			3 000	
Алексеевский	2	1	1	*	1
Агрызский	1	1	1	200	
Алькеевский	3	1	1	1 700	
Альметьевский	3	2		5 619	
Апастовский	2	1		4 000	1
Арский	7			2 900	1
Атнинский	1	1	1	3 400	1
Бавлинский	2	2	2	6 520	
Балтасинский	4	1	1	2 000	2
Бугульминский	3			1 500	
Буинский	2	2	2	1 200	1
Верхнеуслонский	2	1		1 620	
Высокогорский	2			700	1



Информация по проектированию и строительству объектов водоснабжения на 2012г.

МО	Количество объектов водоснабжения	Наличие ПСД	Наличие экспертизы	Построено водопроводов по состоянию на 05.07 (м.)	Пробурено скважин (шт.)
Дрожжановский	1	1		500	
Елабужский	1	1	1	300	
Заинский	3	1		3 700	1
Зеленодольский	10			500	5
Камско-Устьинский	2	1	1	4 419	
Кайбицкий	5	3	2	3 766	
Кукморский	1	1		*	
Лаишевский	2	1		4 462	2
Лениногорский	3	2		2 431	
Мамадышский	1	1		2 000	
Менделеевский	3	2	1	800	2
Мензелинский	3	1	1	2 300	2
Муслюмовский	1			520	
г.Набережные Челны	8			3 400	
Нижнекамский	2	1		2 000	
Новошешминский	3	1		4 515	



Информация по проектированию и строительству объектов водоснабжения на 2012г.

МО	Количество объектов водоснабжения	Наличие ПСД	Наличие экспертизы	Построено водопроводов по состоянию на 05.07 (м.)	Пробурено скважин (шт.)
Нурлатский	6			2 665	
Пестречинский	2			2 200	1
Рыбно-Слободский	3	1	1	300	
Сабинский	2	2	2	10 333	1
Сармановский	4			4 728	
Спасский	2			1 950	
Тетюшский	2	1		800	
Тукаевский	2	1	1	6 700	
Тюлячинский	4	3	1	4 419	2
Черемшанский	5	5	5	23 150	
Чистопольский	4	4	4	2 877	
Ютазинский	4	2	2	800	
г.Казань	7	2	1	2 670	
ИТОГО	141	63	36	140 422	24
Динамика за 2 нед.		+4	+1	+37 744	0



Кадровый состав жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан на 1 января 2012 г.

25

✓ **Численность работников ЖКХ** – 34,5 тыс.чел.,

в том числе:

- работников УК и подрядных организаций – 17,7 тыс.чел.;
- работников предприятий коммунального хозяйства – 16,8 тыс.чел.;

Обучено и повысили квалификацию в 2011 г. - 852 специалиста ЖКХ
(КИСИ- 38 чел.; КГЭУ- 162 чел., РИТЦ – 452 чел., СРО – 200 чел.)

в том числе:

- работников УК и подрядных организаций – 601 чел.;
- работников предприятий коммунального хозяйства – 251чел.



Общая схема работы Интернет-сервиса КАДРОВЫЙ УЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ЖКХ


26



СРО РНП



Интернет-сервис
«Кадровый потенциал»

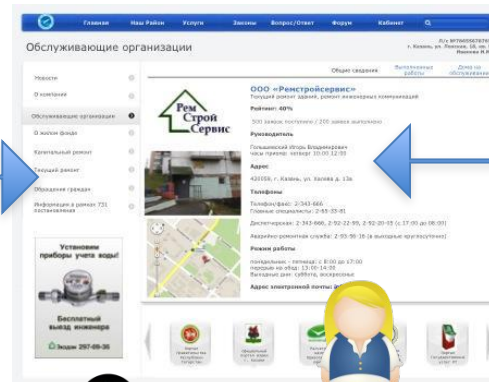

Вышестоящие
органы

Учебные
заведения



Организации
(Упр. организации,
Подрядчики,
Обслуживающие
организации и т.п.)



Внутренняя
система кадрового
учета (1С)

- ✓ Подсистема сбора и обработка данных о кадровом потенциале
- ✓ Реестр открытых вакансий (план потребности в кадрах, активные вакансий)
- ✓ Реестр предприятий сферы ЖКХ
- ✓ Реестра учебных заведений
- ✓ Подсистема обеспечения планирования обучения, повышения квалификации и аттестации специалистов
- ✓ Подсистема учета истории обучения и повышения квалификации
- ✓ Подсистема обеспечения информационного взаимодействия с системой кадрового учета



Offline передача данных (USB,CD)



Отчеты для Муниципального образования.

Пример отчета по сотрудникам (в разрезе организации)

Экспорт в эксель

Перетяните заголовок колонки, чтобы сгруппировать

#	Район	Краткое наименование	ИНН	Телефон	Должность	ФИО сотрудника	Стаж (лет)	Стаж (месяцев)	Стаж (дней)	Коммунал. услуги/Электр.
	Зеленодольский	ООО УК "Жилкомплекс"	1648026138	8(84371)4-97-47	Директор	Хайруллов Марат Галиевич	2	10	0	Нет
	Зеленодольский	ООО УК "Жилкомплекс"	1648026138	8(84371)4-97-47	Заместитель директора по техническим вопросам	Исаева Ирина Евгеньевна	23	0	0	Нет
	Зеленодольский	ООО УК "Жилкомплекс"	1648026138	8(84371)4-97-47	Заместитель директора по общим вопросам	Мельников Юрий Григорьевич	10	0	0	Нет
	Зеленодольский	ООО УК "Жилкомплекс"	1648026138	8(84371)4-97-47	Главный инженер	Мишанов Георгий Федорович	22	0	0	Нет
	Зеленодольский	ООО УК "Жилкомплекс"	1648026138	8(84371)4-97-47	Главный бухгалтер	Закирова Алсу Сулеймановна	2	9	0	Нет
	Зеленодольский	ООО УК "Жилкомплекс"	1648026138	8(84371)4-97-47	Специалист по кадрам	Махрова Елена Константиновна	2	10	0	Нет
	Зеленодольский	ООО УК "Жилкомплекс"	1648026138	8(84371)4-97-47	Секретарь	Чернецова Екатерина Александровна	1	4	0	Нет
	Зеленодольский	ООО УК "Жилкомплекс"	1648026138	8(84371)4-97-47	Ведущий экономист	Камаева Ирина Ивановна	24	0	0	Нет
	Зеленодольский	ООО УК "Жилкомплекс"	1648026138	8(84371)4-97-47	Ведущий специалист	Алексеева Наталья Яковлевна	10	0	0	Нет
	Зеленодольский	ООО УК	1648026138	8(84371)4-97-	Специалист 1	Волчкова Оксана	2	5	0	Нет



Информация о работе МО в интернет-сервисе «Кадровый учет предприятий ЖКХ»

Показатели	Значение
Количество зарегистрированных МО:	45
Количество зарегистрированных организаций	430
Количество сотрудников, человек	18 623
Количество сотрудников, по которым информация внесена полностью, человек	11 912
Количество сотрудников, которые имеют дополнительное образование или прошли курсы переподготовки, человек	447 (2,4%)



КАДРОВЫЙ УЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ЖКХ. Образование

Показатель	Значение
Уровень образования: - высшее - среднее специальное - среднее	31 % 44 % 25 %
Не соответствуют занимаемой должности по основному образованию	40%
Уникальные специализации	Ветеринарный фельдшер Агроном Бисквитчик Вокальное искусство Воспитатель Дошкольный работник Зооинженер Кондитер Логопед Пчеловод Учитель



ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА ДОЛЖНОСТЕЙ

Показатель	Значение
<p>Разнообразие должностей</p>	<p>БУХГАЛТЕР - 37 видов ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - 46 видов ДВОРНИК - 17 видов ЗАМ.ДИРЕКТОРА - 33 вида ИНЖЕНЕР - 135 видов МАСТЕР - 89 видов СЛЕСАРЬ - 96 видов УБОРЩИК - 88 вида</p>



Представление МО заявок на обучение работников организаций ЖКХ

МО	чел.	МО	чел.
Агрызский район	0	Кукморский район	10
Азнакаевский район	55	Лаишевский район	7
Аксубаевский район	2	Лениногорский район	35
Актанышский район	10	Мамадышский район	0
Алексеевский район	7	Менделеевский район	3
Алькеевский район	0	Мензелинский район	0
Альметьевский район	101	Муслюмовский район	1
Апастовский район	3	Набережные Челны	177
Арский район	5	Нижнекамский район	91
Атнинский район	6	Новошешминский район	0
Бавлинский район	2	Нурлатский район	13
Балтасинский район	0	Пестречинский район	0
Бугульминский район	14	Рыбно-Слободский район	4
Буинский район	3	Сабинский район	0
Верхне-Услонский район	0	Сармановский район	5
Высокогорский район	0	Спасский район	0
Дрожжановский район	3	Тетюшский район	0
Елабужский район	0	Тукаевский район	7
Заинский район	19	Тюлячинский район	0
Зеленодольский район	3	Черемшанский район	1
Казань	42	Чистопольский район	6
Кайбицкий район	0	Ютазинский район	0
Камско-Устьинский район	0	ИТОГО	635



ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Всеми районами приняты и утверждены муниципальные программы подготовки кадров в ЖКХ на 2012-2016 годы, кроме:

**Бугульминского МО
Елабужского МО
Менделеевского МО
Мензелинского МО
Чистопольского МО
г.Набережные Челны
г.Казань**



Программа «Строительство, капитальный и текущий ремонт учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2012 год

Заказчик-застройщик	ГКУ «ГИСУ РТ»
Проектировщик	ГУП «ТИГП»
Стоимость, млн. руб.	330,0
Новое строительство	62 (+10)
Капитальный и текущий ремонт для размещения ФАПов в школах	8 (+2)
Капитальный и текущий ремонт врачебных амбулаторий	35
Капитальный и текущий ремонт существующих ФАПов	399 (+99)



Строительство учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2012 год

Поставщик		ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Количество ФАПов		62	
Стоимость млн. руб.		131,3	
Начало строительства		апрель 2012г.	
Срок завершения строительства		ноябрь 2012г.	
Период	ПЛАН (шт.)	ФАКТ (шт.)	% выполнения
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 21.07.2012 г.	8	8	100,00



Размещение ФАПов в зданиях школ и проведение капитального и текущего ремонта

Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Проектировщик		ГУП «ТИГП»	
Количество объектов		8	
Стоимость млн. руб.		4,0	
Начало капитального ремонта		Апрель 2012г.	
Срок завершения ремонта		Август 2012г.	
Период	ПЛАН (шт.)	ФАКТ (шт.)	% выполнения
С НАЧАЛА КАП.РЕМОНТА НА 07.07.2012 г.	8	8	100,0



Капитальный ремонт врачебных амбулаторий

Заказчик-застройщик	ГКУ «ГИСУ РТ»
Проектировщик	ГУП «ТИГП»
Количество объектов	35
Стоимость млн. руб.	70,0
Начало капитального ремонта	Июль 2012г.
Срок завершения ремонта	Октябрь 2012г.



Капитальный и текущий ремонт существующих фельдшерско-акушерских пунктов

Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Проектировщик		ГУП «ТИГП»	
Количество объектов, в т.ч дополнительно 99 ФАПов		399	
Стоимость млн. руб.		39,9	
Начало капитального ремонта		Апрель 2012г.	
Срок завершения ремонта		Август 2012г.	
Период	ПЛАН (шт.)	ФАКТ (шт.)	% выполнения
С НАЧАЛА КАП.РЕМОНТА НА 21.07.2012 г.	300	248	82,7



Программа капитального ремонта общеобразовательных учреждений на 2012 год

№ п/п	Наименование	Сумма финансирования, на 2012 год, тыс. руб.
1	Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных школ	1 925 358,9
2	Капитальный ремонт специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов	254 044,4
3	Разработка проектно-сметной документации	25 000,0
	ИТОГО:	2 204 403,3



Информация о количестве **выявленных и устраненных нарушений** при проведении капитального ремонта общеобразовательных школ

№	Муниципальное образование	Количество объектов	Количество выявленных нарушений	Устранено нарушений
1	Агрызский	5	33	28
2	Азнакаевский	3	19	9
3	Аксубаевский	4	11	6
4	Актанышский	2	16	4
5	Алексеевский	3	3	-
6	Алькеевский	2	11	3
7	Альметьевский	3	36	30
8	Апастовский	1	1	1



Информация о количестве **выявленных и устраненных нарушений** при проведении капитального ремонта общеобразовательных школ

№	Муниципальное образование	Количество объектов	Количество выявленных нарушений	Устранено нарушений
9	Арский	1	3	2
10	Атнинский	1	0	0
11	Бавлинский	2	9	4
12	Балтасинский	3	0	0
13	Бугульминский	6	31	13
14	Буинский	4	21	0
15	Верхнеуслонский	1	6	1
16	Высокогорский	2	0	0



Информация о количестве **выявленных и устраненных нарушений** при проведении капитального ремонта общеобразовательных школ

№	Муниципальное образование	Количество объектов	Количество выявленных нарушений	Устранено нарушений
17	Дрожжановский	1	0	0
18	Елабужский	2	13	1
19	Заинский	6	40	8
20	Зеленодольский	4	19	11
21	Кайбицкий	1	2	0
22	Камско-Устьинский	1	3	3
23	Кукморский	2	8	8
24	Лаишевский	3	9	9



Информация о количестве **выявленных и устраненных нарушений** при проведении капитального ремонта общеобразовательных школ

№	Муниципальное образование	Количество объектов	Количество выявленных нарушений	Устранено нарушений
25	Лениногорский	3	21	2
26	Мамадышский	4	37	12
27	Менделеевский	1	9	3
28	Мензелинский	3	21	3
29	Муслюмовский	4	56	37
30	Нижнекамский	10	129	103
31	Новошешминский	2	3	0
32	Нурлатский	4	10	8



Информация о количестве **выявленных и устраненных нарушений** при проведении капитального ремонта общеобразовательных школ

№	Муниципальное образование	Количество объектов	Количество выявленных нарушений	Устранено нарушений
33	Пестречинский	3	0	0
34	Рыбно-Слободский	1	0	0
35	Сабинский	2	0	0
36	Сармановский	2	16	3
37	Спасский	2	7	3
38	Тетюшский	2	2	2
39	Тукаевский	2	0	0
40	Тюлячинский	1	0	0



Информация о количестве **выявленных и устраненных нарушений** при проведении капитального ремонта общеобразовательных школ

№	Муниципальное образование	Количество объектов	Количество выявленных нарушений	Устранено нарушений
41	Черемшанский	1	4	1
42	Чистопольский	2	2	2
43	Ютазинский	1	5	1
44	г. Наб.Челны	8	143	42
45	г.Казань	44	212	32



МО, отстающие от графиков выполнения работ по капитальному ремонту общеобразовательных школ

№ п/п	МО	Адрес	Кол-во школ	Подрядчик
1	Алькеевский			ИП «Шагимарданов А. Р.»
	<i>МБОУ «Новосалмановская общеобразовательная средняя школа»</i>	<i>с.Н. Салманы ул. Школьная, д.16</i>	1	
2	Балтасинский		1	ООО «Ильяс Плюс»
	<i>МБОУ «Кушкетбашская начальная общеобразовательная школа»</i>	<i>д. Кушкетбаш, Школьная, д.1</i>		
3	Елабужский		1	ООО «Евроальянсстрой»
	<i>МБОУ «Мортовская средняя общеобразовательная школа»</i>	<i>с.Морты, ул. Молодежная, д.2-20</i>		
4	Зеленодольский		1	ООО «Татинвестстрой»
	<i>МБОУ «Ходяшевская начальная школа»</i>	<i>с.Ходяшево, ул. Советская</i>		



МО, отстающие от графиков выполнения работ по капитальному ремонту общеобразовательных школ

№ п/п	МО	Адрес	Кол-во школ	Подрядчик
5	Мамадышский		1	ООО «Мамадышское ЖКУ»
	МБОУ «Омарская СОШ»	с.Омары, ул. Молодежная, д.1		
6	г.Казань		6	
	Гимназия 27	ул.Эсперанто д.48		ООО «Реставрация»
	СОШ №133	ул. Гагарина, д.26а		ООО «Талига»
	Лицей №121	ул. А.Кутуя, д.84		ООО «Крейт»
	Гимназия №20	ул. Пионерская, 10а		ООО «Крейт»
	Школа №48	Ул. Актайская, д.5		ООО «Энергострой+»
	Школа №144	Ул. Кулагина, д.2		ООО «Энергострой+»



Шалинская начальная образовательная школа до и после капитального ремонта (Пестречинский район)

До ремонта



После ремонта





Перечень объектов КР специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов на 2012 год

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выделенный займ	Средний % готовности
1	Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 11	г.Казань, ул. Халезова, 24	22 250,0	6 675,00	21
2	Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат им.Е.Г. Ласточкиной	г.Казань, ул. Попова, 21	66 180,0	19084,0	9
		г.Казань, ул. Космонавтов, 29	23 694,38	7 108,00	
3	Лаишевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат	г.Лаишево, ул. Матросова, 24	46 082,0	13 825,00	14



Перечень объектов КР специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов на 2012 год

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Лимит финансирования, тыс. руб.	Выделенный займ	Средний % готовности
4	Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 7	г.Казань, ул. Окольная, 25	43 515,0	13 825,00	19
5	Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1	г.Казань, ул. Тимирязева, 3	52 323,0	15 696,00	15
		Итого	254 044,4	76 213	16
