



**Об исполнении поручений заседания Градостроительного совета от
21.03.2019 г. под председательством Губернатора области О.А.
Кувшинникова**

1.1 О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р. ШЕКШУ В СТВОРЕ УЛ. АРХАНГЕЛЬСКОЙ



Начало работ – март 2019 г.

Окончание работ – август 2022 г.

Сделано 9 опор из 15


Длина моста – 1131,9 м

Ширина моста– 31,1 м

Число полос движения– 6

Ширина полосы движения – 3,5 м

1.2 О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р. ШЕКСНУ В СТВОРЕ УЛ. АРХАНГЕЛЬСКОЙ

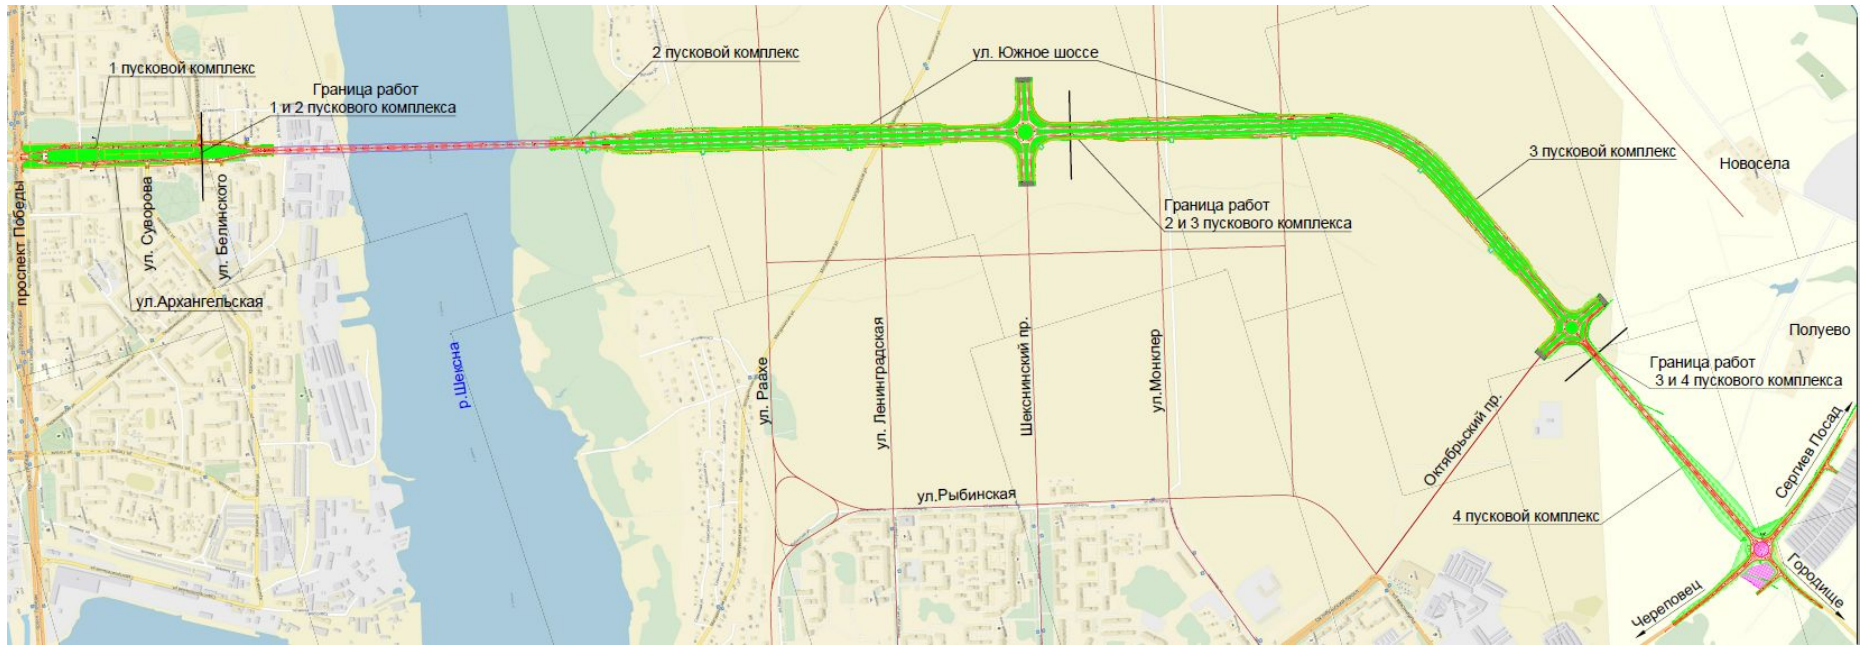

Число полос движения – 6/4

Ширина полосы движения – 3,5 м

Число полос движения на дублерах – 2

2. О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ



В 2019 г.:



25 автобусов «метан» по программе Губернатора (**179** млн. руб.)



10 природоохранных мероприятий крупных предприятий города на сумму **8,8** млрд. руб.




снижение выбросов на **7,6%** (**25,6** тыс. тонн) (план **2%**)

В 2020 г. подписано соглашение о снижении выбросов к 2024 г. на **22%**

3. О РЕМОНТЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ

Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», %

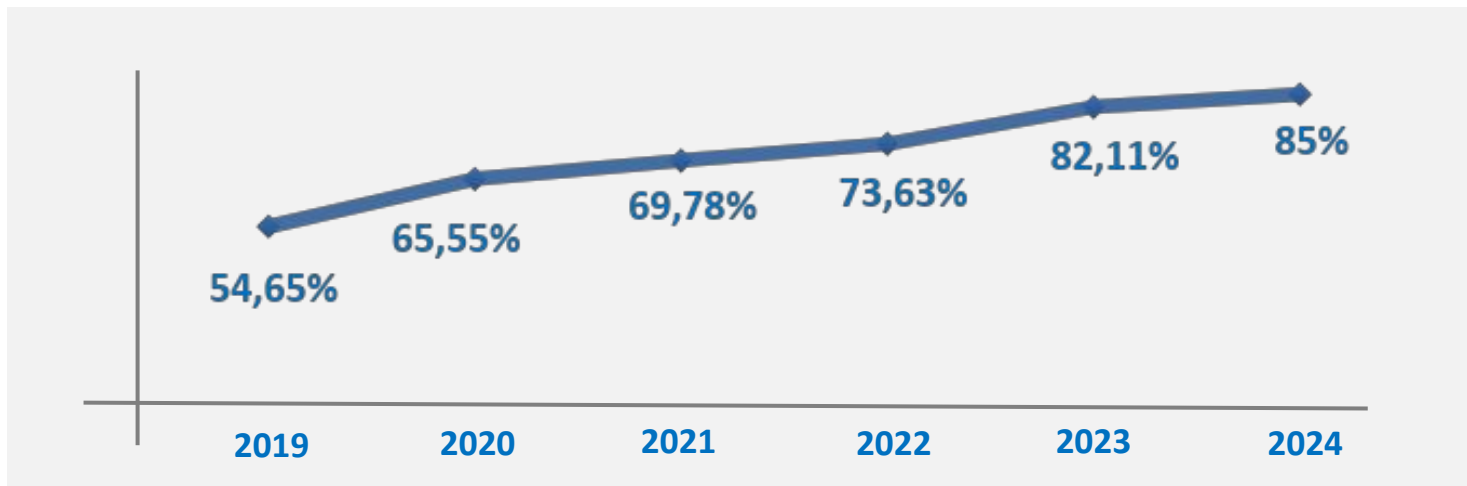

Выделено на 2020 г.:

БКД – 220 млн. руб.

Дорожный фонд – 312 млн. руб.

Дороги, планируемые к ремонту в 2020 г.:

- ул. Юбилейная,
 - ул. Судостроительная (ул. Красная – пр. Победы),
 - ул. Краснодонцев (ул. Олимпийская – ул. Гоголя)
-
- ул. Наседкина (ул. Любецкая – Октябрьский пр.),
 - ул. Любецкая (Октябрьский пр. – ул. Городецкая),
 - ул. Сазонова
-
- ул. Боршодская (ул. Олимпийская – ул. Гоголя),
 - ул. Молодежная (ул. Моченкова – Кирилловское шоссе),
 - ул. Партизана Окинина,
 - ул. Ветеранов
-
- ул. Комарова

Выделено на 2021 г.:


БКД – 220 млн. руб.

Дорожный фонд – 312 млн. руб.

Дороги, планируемые к ремонту в 2021 г.:

- ул. Красная,
 - ул. Суворова,
 - ул. Гоголя
-
- пр. Октябрьский,
 - ул. Годовикова
-
- ул. Сталеваров,
 - пр. Московский,
 - ул. Вологодская,
 - ул. М. Горького (пр. Московский – пр. Победы)

4. О ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО РЕМОНТУ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ

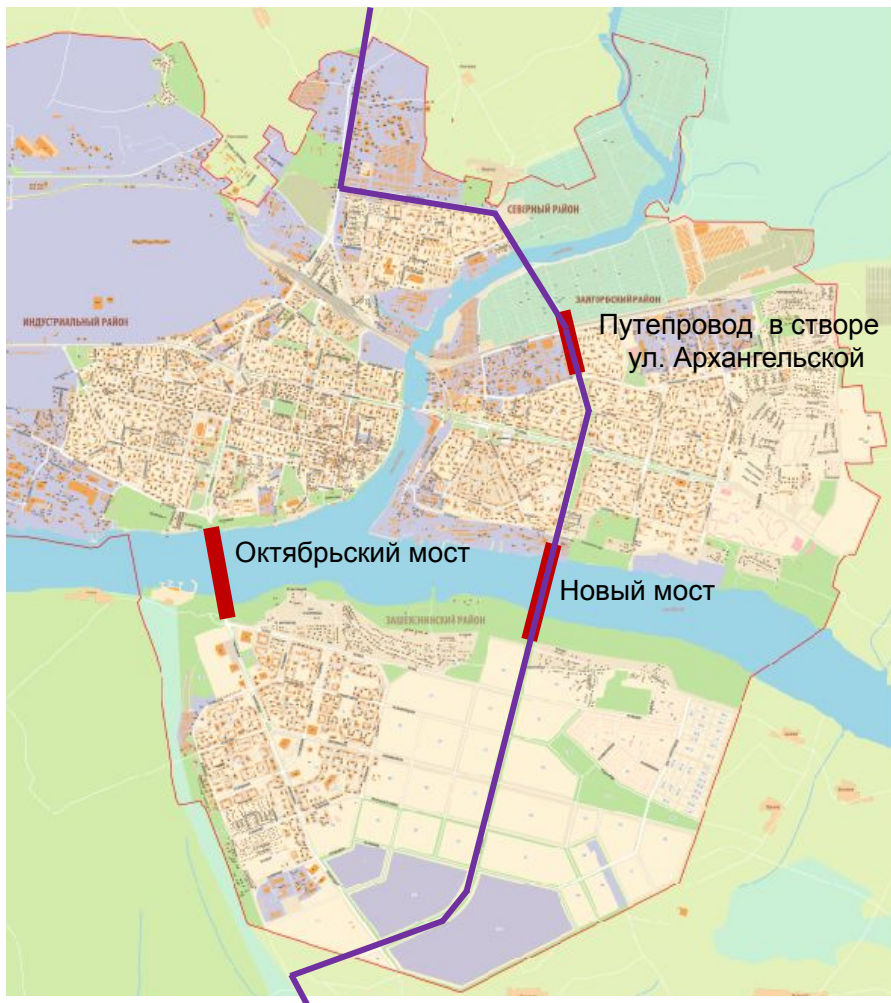

Решения:


Для исключения транспортных заторов и пробок в городе, синхронизации работ со строительством нового моста в створе ул. Архангельской:

1. Капитальный ремонт Октябрьского моста (в том числе 4 съездов) провести в 2022-2024 г. после пуска нового мостового перехода.
2. В 2020-2021 г. выполнить капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской




5. О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЕВЕРНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ И РЕКОНСТРУКЦИИ УЛ. МИРА

Схема поэтапного выполнения работ по строительству Северной объездной дороги
Стоимость 1 этапа – 468 млн. руб.

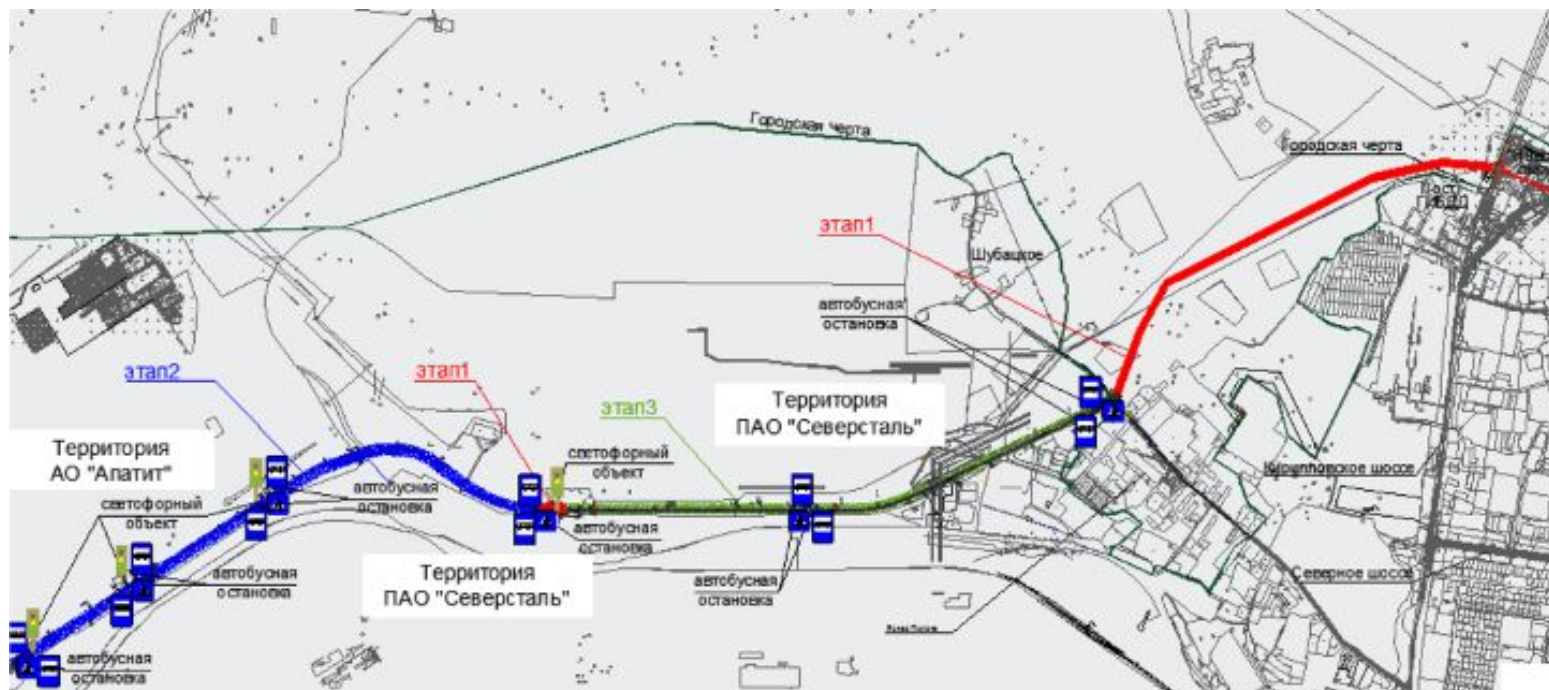

Реконструкция ул. Мира (от пр-та Победы до ул. Устюженская)

Выполняется разработка проектно-сметной документации силами МКУ «УКСиР».
Срок выполнения ПСД – 2021 год.

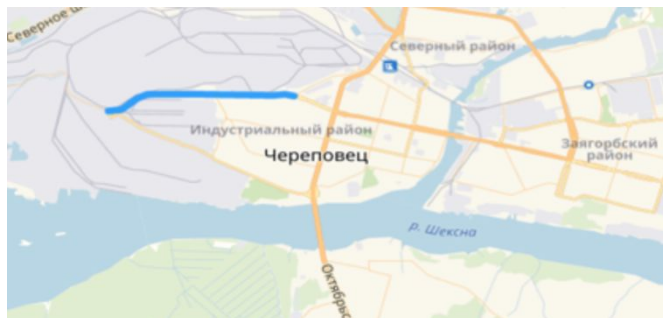

6. ОБ УСТАНОВКЕ СВЕТОФОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ



В 2020 год - 10 светофоров

Установлено – 6

- Советский пр-т, 113,
- Кирилловское ш. 80,
- ул. Бардина,
- пр-т Победы 135,
- пр-т Победы 131-134,
- ул. М. Горького
(между домами 61-71).

Планируется установить - 4

- Олимпийская-Краснодонцев,
- Красная-Гоголя,
- пр-т Победы 12,
- Северная автодорога
(п. Новые углы).

В 2020 году установлено – 19 ИДН



В 2021 г. планируется установить 14 светофоров

7. О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №24 В 112 МКР., ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 144, 112 МКР.

Средняя общеобразовательная школа №24 в 112 мкр. на 1500 мест



Детский сад в 144 мкр. на 420 мест



Детский сад в 112 мкр. на 420 мест



Результаты:

1. Снижение очереди в детские сады на **840** человек.
Очередь на 01.07.2020 г. – **2 500** человек.
2. Снижение процента учащихся во вторую смену с **37%** до **26,4%** (по Зашекснинскому району).

8. О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ШКОЛЫ НА 1500 МЕСТ В 106 МКР. ДВУХ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ САДОВ В 103 И 105 МКР.

Школа на 1500 мест в 106 мкр. (стоимость – 1,8 млрд. руб., плановый срок окончания строительства – 2022 г.)



Детский сад в 105 мкр. на 420 мест (стоимость – 405 млн. руб., срок окончания строительства – 2021 г.)



Детский сад в 103 мкр. на 220 мест (стоимость – 220 млн. руб., срок окончания строительства – 2021 г.)



9. О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ЗАШЕКСНИНСКОМ РАЙОНЕ



Стоимость работ – 117 млн. руб.

Срок окончания работ по контракту – 30.08.2020 г.

Открытие объекта – 4 ноября 2020 г.

10. О КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТАХ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Выполнено:


- ✓ Капитальный ремонт соматического корпуса, отделения главного корпуса БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2»;
- ✓ Капитальный ремонт поликлинического отделения № 2 БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 1»;
- ✓ 1 этап капитального ремонта здания БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 2»;
- ✓ Приобретение и ввод в эксплуатацию линейного ускорителя в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2».

В работе:


- ✓ 2 этап капитального ремонта здания БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №2».

11. О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

«Площадь МБУК «Дворец металлургов»

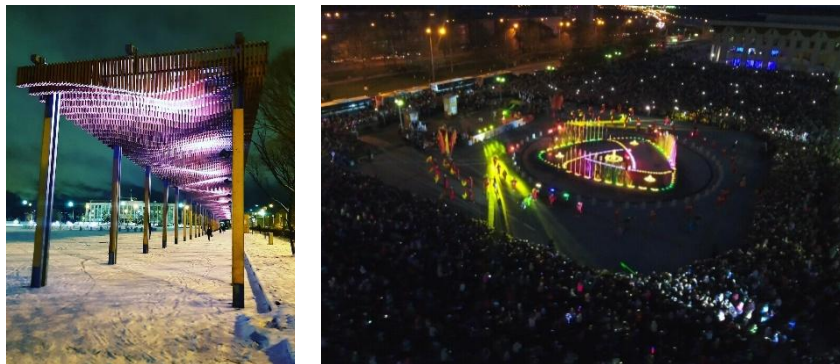

«Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных с прилегающей территорией»

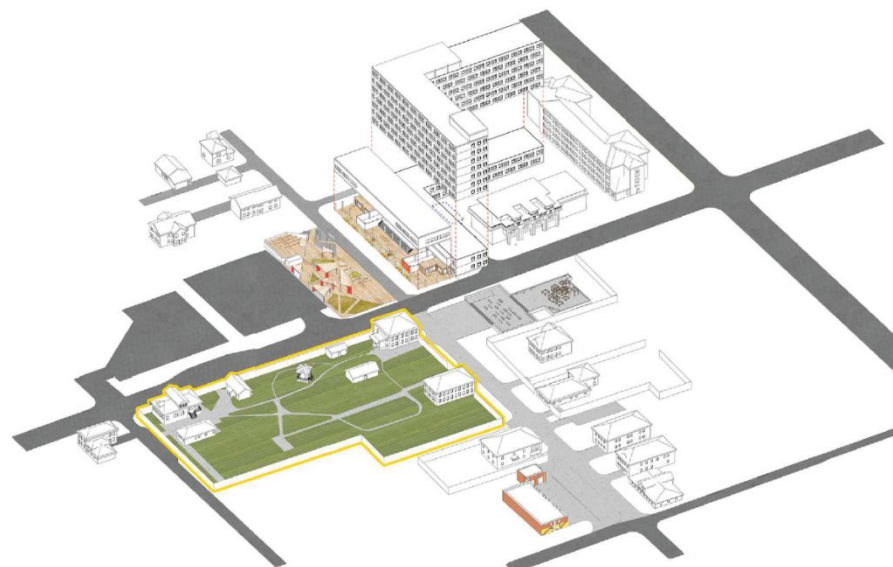

Стоимость работ – 54 млн. руб.
Срок окончания работ по контракту – 17.09.2020 г.
Открытие объекта – 4 ноября 2020 г.

12. О ПАРКАХ

В 2020 г.:

Парк 200-летия г. Череповца:


- косметический ремонт входной группы,
- спил аварийных и сухих деревьев,
- точечная установка скамеек.

Парк «Пуловский лес»:

- спил аварийных и сухих деревьев,
- отсыпка дорожек граншлаком.



13. О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБУСТРОЙСТВУ СИСТЕМ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

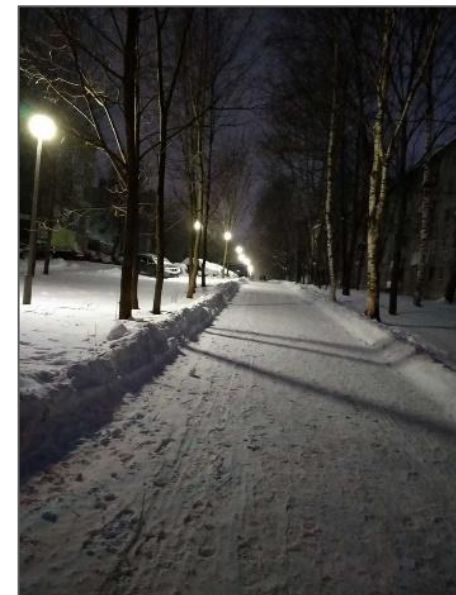

В 2019 г.:

- Установлено - **1604** светильника;
- Построено линий наружного освещения – **46,6** км.

Финансирование – 52,7 млн. руб.

На 2020 г. выделено 55,5 млн. руб.

В связи с COVID-19 средства заморожены
