



Благоустройство Городского парка

Начальник управления : Хомутова Л.М.

<https://admbrk.ru/blagoustrojstvo/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/>

г.Березники 2020 г.

Схема зонирования парка



Реконструкция парка с **2015** года



Технико-экономические показатели I очереди



Наименование показателя	Количество
Площадь участка благоустройства, м ² /га	102853,0/10,3
Площадь асфальтового покрытия, м ²	13122,0
Площадь покрытия тротуарной плиткой, м ²	6560,0
Площадь покрытия спортивной и детской площадок, м ²	980,0
Площадь озеленения, м ²	72191,0

Финансирование реконструкции парка




2015 - 2017 годы – 50 млн. руб.

2018 год – 23,0 млн. руб.

2019 год – 19,9 млн. руб.


2020 год – 12,0 млн. руб.

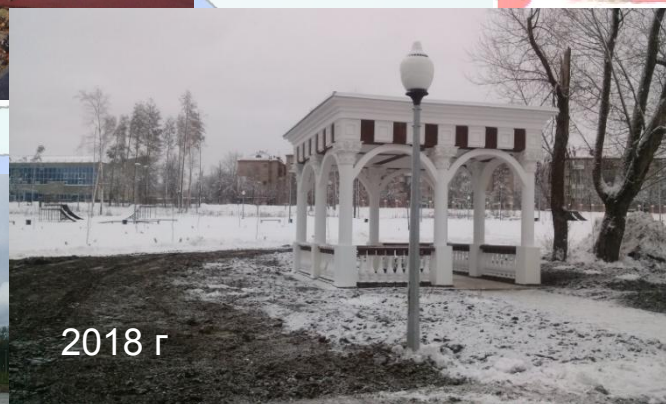

Стоимость реконструкции
всего 319,5 млн. руб.
(в ценах 2015 г.)





Реконструкция II очереди парка

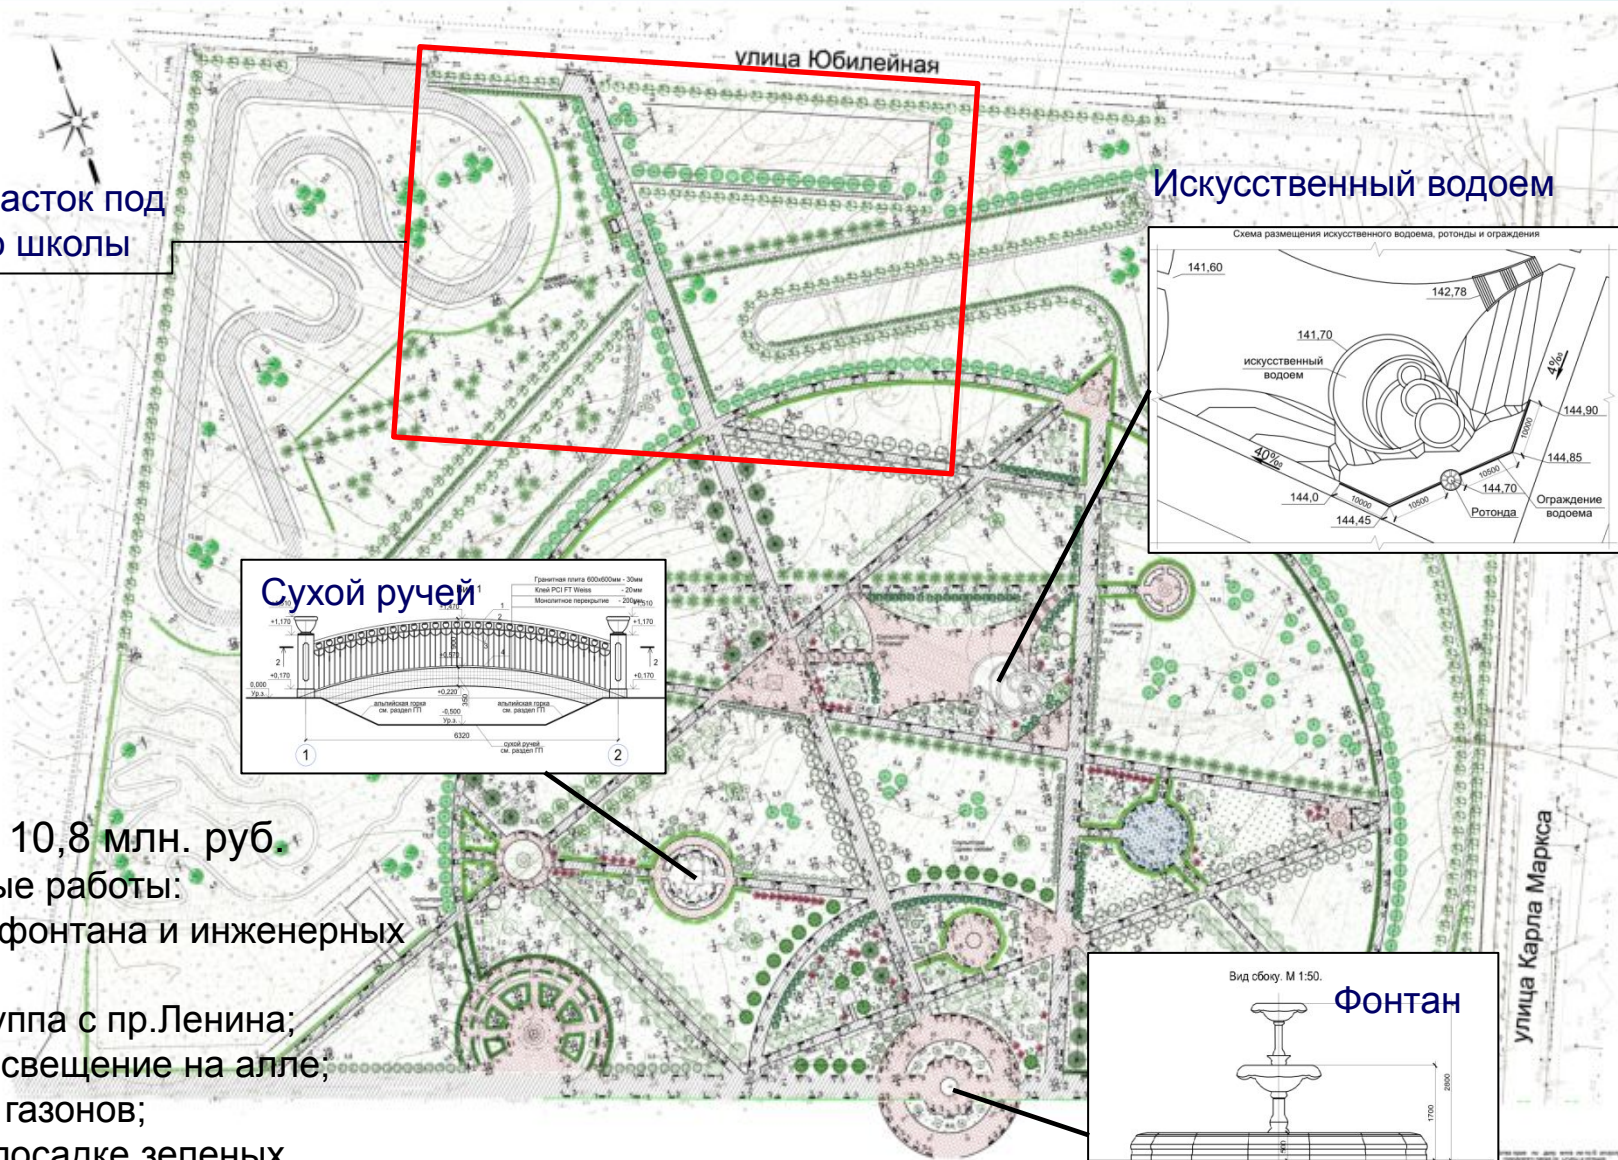

Земельный участок под строительство школы

Искусственный водоем

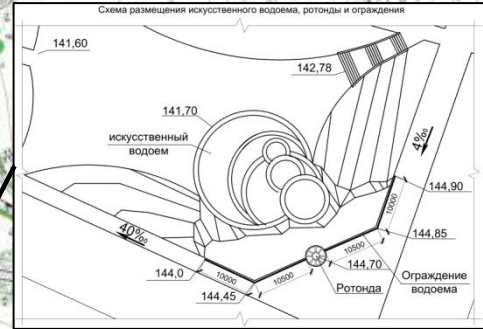

2021 год – 10,8 млн. руб.

Планируемые работы:

- Устройство фонтана и инженерных сетей;
- входная группа с пр.Ленина;
- наружное освещение на аллее;
- устройство газонов;
- работы по посадке зеленых насаждений.



Музей техники в городском парке



Общая стоимость работ составляет 11,2 млн. руб.

Участники проекта:

- Администрация города;
- промышленные предприятия: ПАО «Уралкалий», ПАО «УралХим», ОАО «БСЗ», ПАО «ВСМПО – АВИСМА».

