



**ТОО «Bassel Group LLS»**

*От энергии мечты к энергии созидания*

# **ТОО «Bassel Group LLS»**

## **Ремонтная программа на 2021 год**

### **Котельный цех**



# Проведенные ремонтные работы за 2020г

Наименование оборудования	Вид ремонта	Исполнитель	Примечание
к/а №9	КР	КЦ TOO «Компания «КазПромСервис»	- Ремонт предвключенного барабана и заключение экспертизы -Замена водопускных труб --Ремонт ШБМ10А, ДС10А/Б
к/а №10	РТР	КЦ подрядчик	Контроль трубопроводов ГПК, ГПЗ; ЭБП тройника на ПСК; гибы
к/а №11	ТР	КЦ TOO «Станкония», TOO «ПромСпецСнаб.KZ»	Замена 1ст. ВЗП Продление срока основного, предвключенного барабана
Мостовой кран №2, подкрановые пути	Экспертиза	TOO «КазПромСтрой экспертиза»	Продление до 07.2022
Дымовая труба №3	Экспертиза	TOO «КазПромСтрой экспертиза»	Продлен срок эксплуатации
Багерные и мазутные насосы	ТР	КЦ	Ремонт багерный насос №1,2
Ремонт и обследование мазутного резервуара №7	Экспертиза	TOO «Промышленная экспертиза»	Продлен срок эксплуатаций
Наращивание дамбы золоотвала	КР	TOO «ПТП Аргос»	Наращивание дамбы золоотвала




# График ремонта основного оборудования КЦ на 2021 год.

Наименование оборудования <sup>17</sup>	Вид ремонта	Кол-во дней	2021 год												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Котел ПК-10 ст. №9	ТР	30									7	5			
											↔				
Котел ПК-10 ст. №10	ТР	30				17	16								
						↔									
Котел ПК-10 ст. №11	РТР	60						1	30						
								↔							
Останов на «0»	КР	10						11-20							
								↔							



## Запланированные ремонтные работы основного оборудования в цеху на 2021г.

Наименование оборудования	Вид ремонта	Исполнитель	Примечание	Бюджет		
				Работа	Материалы	Всего
к/а №9	ТР	КЦ Подрядчик	Для подрядчика: - Продление срока службы основного барабана. - Техническое освидетельствование к/а	7 457 139	21 829 366	29 286 505
к/а №10	ТР	Подрядчик КЦ	Для подрядчика: - Продление срока службы основного и предвключенного барабана - Техническое освидетельствование к/а - Ремонт боровов	13 171 319	43 027 843	56 199 162
к/а №11	РТР	Подрядчик КЦ	Для подрядчика: - Замена экранов 37тн. - Замена змеевиков 1ст. ВЭК 1,2,3 секции -65,5тн.(ИНВЕСТ.) - Ремонт обмуровки - 102,5 м <sup>3</sup> , заливка бетона -23 м <sup>3</sup> --Замена брони ШБМ с выгрузкой и загрузкой шаров - Перезаливка подшипников ШБМ 2шт. - Ремонт боровов - Замена водоперепускных труб 5,5т - Продление срока службы основного барабана. - Техническое освидетельствование к/а	38 843 300	128 303 765	167 147 065
<b>Итого:</b>						

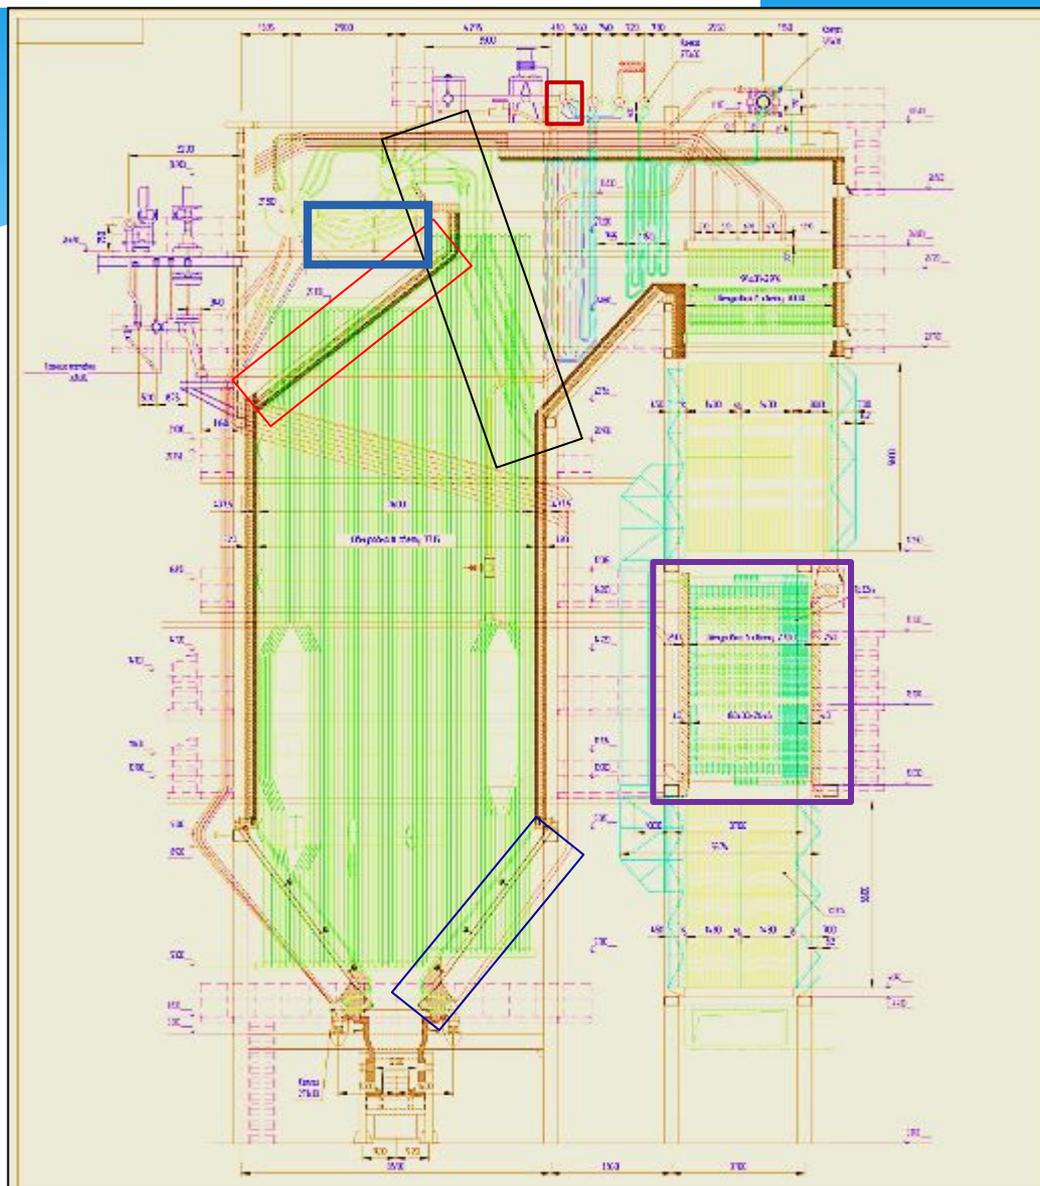

Последняя замена 2004г.  
Забиты более 70%

Наклонный потолок

(на 08.20г. более 8 шт. свищей – язвенная коррозия)

Фестон, газовая перегородка

(имеется 2 случая разрыва в бетоне с большим его повреждение в связи с чем произвели отглушку. Согласно вырезкам язвенная коррозия и утонения 30%)

ГПЗ (1ПП)

Холодная воронка Тылового экрана  
(утонение стенки по язвинам сост. 68%)

ВЭК 1ст. (более 10% отглушены.  
Идет интенсивный золовой износ)



# График ремонта

# вспомогательного оборудования КЦ на 2021 год.

Наименование оборудования	Вид ремонта	исполнитель	2021 год											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ремонт б/н, м/н, н/д	ТР	КЦ		1 ←→ 31								1 31 ←→		
Мазутный резервуар №1	КР	подрядчик					1 30 ←→							
Замена компенсаторов пит. коллектора		подрядчик						11 20 →→						
ГПМ	ТР	КЦ			1 30 ←→									
Ремонт ш/п №1	ТР	подрядчик						1 ←→ 31						



# Запланированные

# ремонтные работы вспомогательного оборудования в цеху на 2021г.

Наименование оборудования	Вид ремонта	Исполнитель	Примечание	Бюджет		
				Работа	Материалы	Всего
Ремонт багерных и мазутных насосов, НД фосфата и гидр.	ТР	КЦ		0	5 859 159	5 859 159
Очистка от донных отложений, обследование и ремонт мазутного резервуара №1	КР	Подрядчик	Повторное обследование провести в 30.05.21г. Заключение №3ЭПБ/007-ЭП-2016	2 110 613	794 104	2 904 717
Питательный коллектор (компенсаторы)		Подрядчик	- Замена компенсаторов, переварка стыков	1 376 453	501 402	1 877 855
Ремонт ГПМ	КР	КЦ				1 000 000
<b>Итого:</b>				<b>3 487 066</b>	<b>7 154 665</b>	<b>11 641 731</b>



## Запланированные ремонтные работы по зданиям и сооружениям на 2021г.

Наименование	Исполнитель	Примечание	Бюджет
Замена окон оси 19-33, ряд «Е»	Подрядчик	Частичный ремонт	
Ремонт помещение багерных насосов	Подрядчик	Разработан местный проект 2019г.	
Восстановление колонны мастерской АБК	КЦ		
Ремонт, восстановление вентиляций АБК КЦ	Подрядчик		
Замена крыши ось 19-33, ряд «Е-Ж»	Подрядчик	Коррозионный износ	
Ремонт МР №1	Подрядчик	Очистка от донных отложений, ремонт, продление срока	
Итого:			



## Запланированные ремонтные работы по шламопроводу №1,2 на 2021г.

Наименование	Исполнитель	Вид работы	Место работы	Бюджет		
				Работа	Материалы	Всего
ш/п № 1		Замена участка	№ 56-60 – 40м, 104-109 – 50м, 198-200 – 20м, 203-205 – 20м,	2 228 882	6 960 666	9 189 548
ш/п №2		Замена участка	№78-82 – 40м, 192-193 – 30м,			
Опоры		Ремонт, замена	№ 173, 243, 172			
<b>Итого:</b>						



**TOO «Bassel Group LLS»**

*От энергии мечты к энергии созидания*





# TOO «Bassel Group LLS»

*От энергии мечты к энергии созидания*

