

Дата: 15.03.18

Номер заявки по NAV: 39-837887

Акт технического обследования объекта.

Контактная информация

- 1) Наименование объекта: опт. ч. Кд Фокус
- 2) Юр. Наименование: _____
- 3) Адрес: г. СПб пр. Новокосинский 17
- 4) Координаты контактных лиц: Максим 779

Работы проведенные в рамках обследования:

- 1) Выезд по городу по области на удаление в _____ км
- 2) Площадь объекта до 200 кв.м до 600 кв.м более 600 кв.м

Общие данные по объекту

- 1) Наличие охранной сигнализации: есть нет
- 2) Наличие пожарной сигнализации: есть нет
- 3) Наличие КТС: есть нет
- 4) Наличие СКУД: есть нет
- 5) Наличие СВН: есть нет
- 6) Стройготовность: полная частичная нет стройготовности
- 7) Ориентировочный срок монтажа в часах: 12
- 8) Наличие 220В рядом с местом установки КП: есть нет
- 9) Высота потолка 2,8 метров
- 10) Тип потолка бетон армстронг натяжной гипсокартон

Обследование ОТС, АПС

- 1) Охранная сигнализация: проводная беспроводная адресная
- 2) Пожарная сигнализация: проводная беспроводная адресная
- 3) КТС: радиус действия менее 100м более 100м
- 4) КТС: кол-во брелков один два три или более

Обследование СКУД

- 1) Система КУД локальная с выводом на ПК с учетом рабочего времени
- 2) Ключи доступа ключи ТМ прокси-карточки прокси-брелки
- 3) Количество точек прохода _____
- 4) Количество и типы замков: электромагнитные _____, электромеханические _____
- 5) Количество доводчиков: _____

Обследование СВН

- 1) Тип системы видеонаблюдения: Аналоговое Аналоговое АHD IP
- 2) Высота потолка: ниже 3-х метров выше 3-х метров 2,8 м.
- 3) Картинка: общий вид; детальный
- 4) Тип камеры: уличная внутренняя
(нужное подчеркнуть): - цилиндрическая - количество 1
- купольная - количество _____
- 5) Время записи истории (в сутках): _____
- 6) Наличие монитора: есть; нет не требуется

- 7) Удаленный доступ: требуется; не требуется; требуется внутри локальной сети
- 8) Наличие проводного интернета: есть; нет
- 9) Наличие свободного порта в маршрутизаторе: есть; нет
- 10) Расстояние от видеорегистратора до точки подключения к маршрутизатору: _____

Фотоотчет (фотографии входов в помещение, запасных входов, общий план помещений, фотография объекта с улицы, фотография контрольной панели, неизвестных извещателей и панелей):
Выполнено.

Возможность переключения объекта с заменой коммутатора:

- Да, Союз GSM Да, Контакт-RT3 Нет Не известно

Наименование имеющегося оборудования на объекте

№ п/п	Название и тип оборудования	Кол-во	Аренда (да\нет\неизвестно)
1	КОНТАКТ 5-2	1	А
2	КВ 1-2	1	Р
3	УЧ	3	Е
4	ОПС	2	Н
5	КТС носимая	1	О
6			
7	Камера iZetta HR-BT2050EP-2	1	А
8			
9			
10			

ДОЗ МОЖНО НЕ АРЕНДА

Наименование необходимого оборудования для установки на объект

№ п/п	Название и тип оборудования	Кол-во
1	КОНТАКТ 5-2	1
2	КВ 1-2	1
3	УЧ	3
4	ОПС	3
5	СМК	2
6	БАР в корпусе ЗАУ	1
7	АКБ 40-1 А4	
8	АСС 40-1	1
9	УЧ 0,5 / ЧВВП / каб. канал 20x10	100/5/6
10		

Краткий справочник условных обозначений:

	контрольная панель		датчик магнитно-контактный		сенсор пожарной датчик
	клавиатура удаленно программируемая		ИК датчик обьектный		сенсор пассивный инфракрасный
	клавиатура удаленно не программируемая		ИК датчик встраиваемый		датчик разбития стекла
	передатчик на N-кан		кнопка тревожной сигнализации (КТС)		вибрационный датчик
	пассивный ИК датчик		КТС-нажимная		датчик температуры
	блок беспроводного датчика		дымоходный пассивный датчик		датчик Z


Карта монтажа

Заказ №

объекта

КП Видео - если камера в аренду

- 1 камера - IP Zete HR-ВТ2030АР2-1шт
- 2 УТП сое 5е-30м
- 3 ш ВВП - 30м
- 4 БАП 12В 1,5А 70ч - 1шт
- 5 АКБ ЭАУ
- 6 RJ45 коннектор - 2шт
- 7 Настройка удалённого доступа

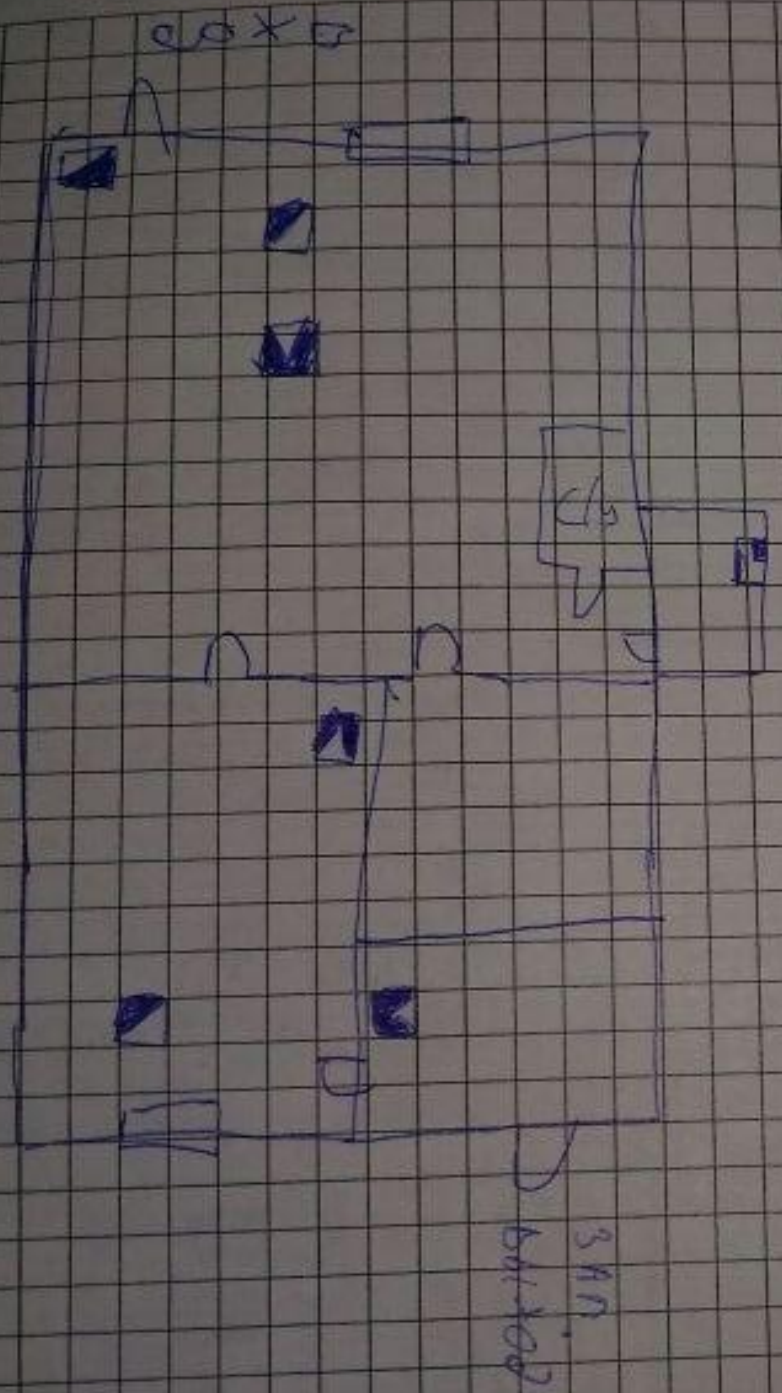

- 1. Представитель Подрядчика
- 2. Представитель Заказчика

(подпись)

ПАРДОВ АА
(ф.и.о.)
