




О проблемах реализации ПРП «Дорога к дому» в 2021 году и перспективах проекта на 2022 год



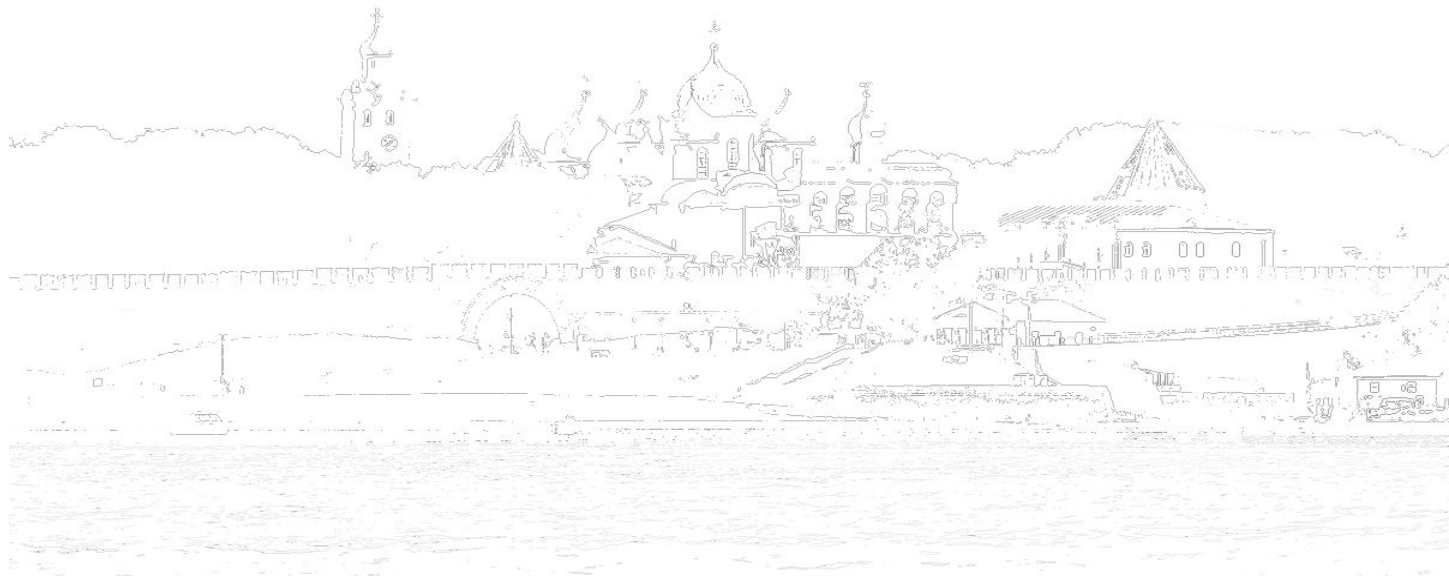

НПА проекта «Дорога к дому»



Поручение Губернатора Новгородской области от 17 октября 2020 года №136/ОС (пункт 12)



Государственная программа Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 09.07.2020 №212




Паспорт приоритетного регионального проекта «Дорога к дому»



Рабочий план приоритетного регионального проекта «Дорога к дому»



Аудитория / Исполнитель проекта

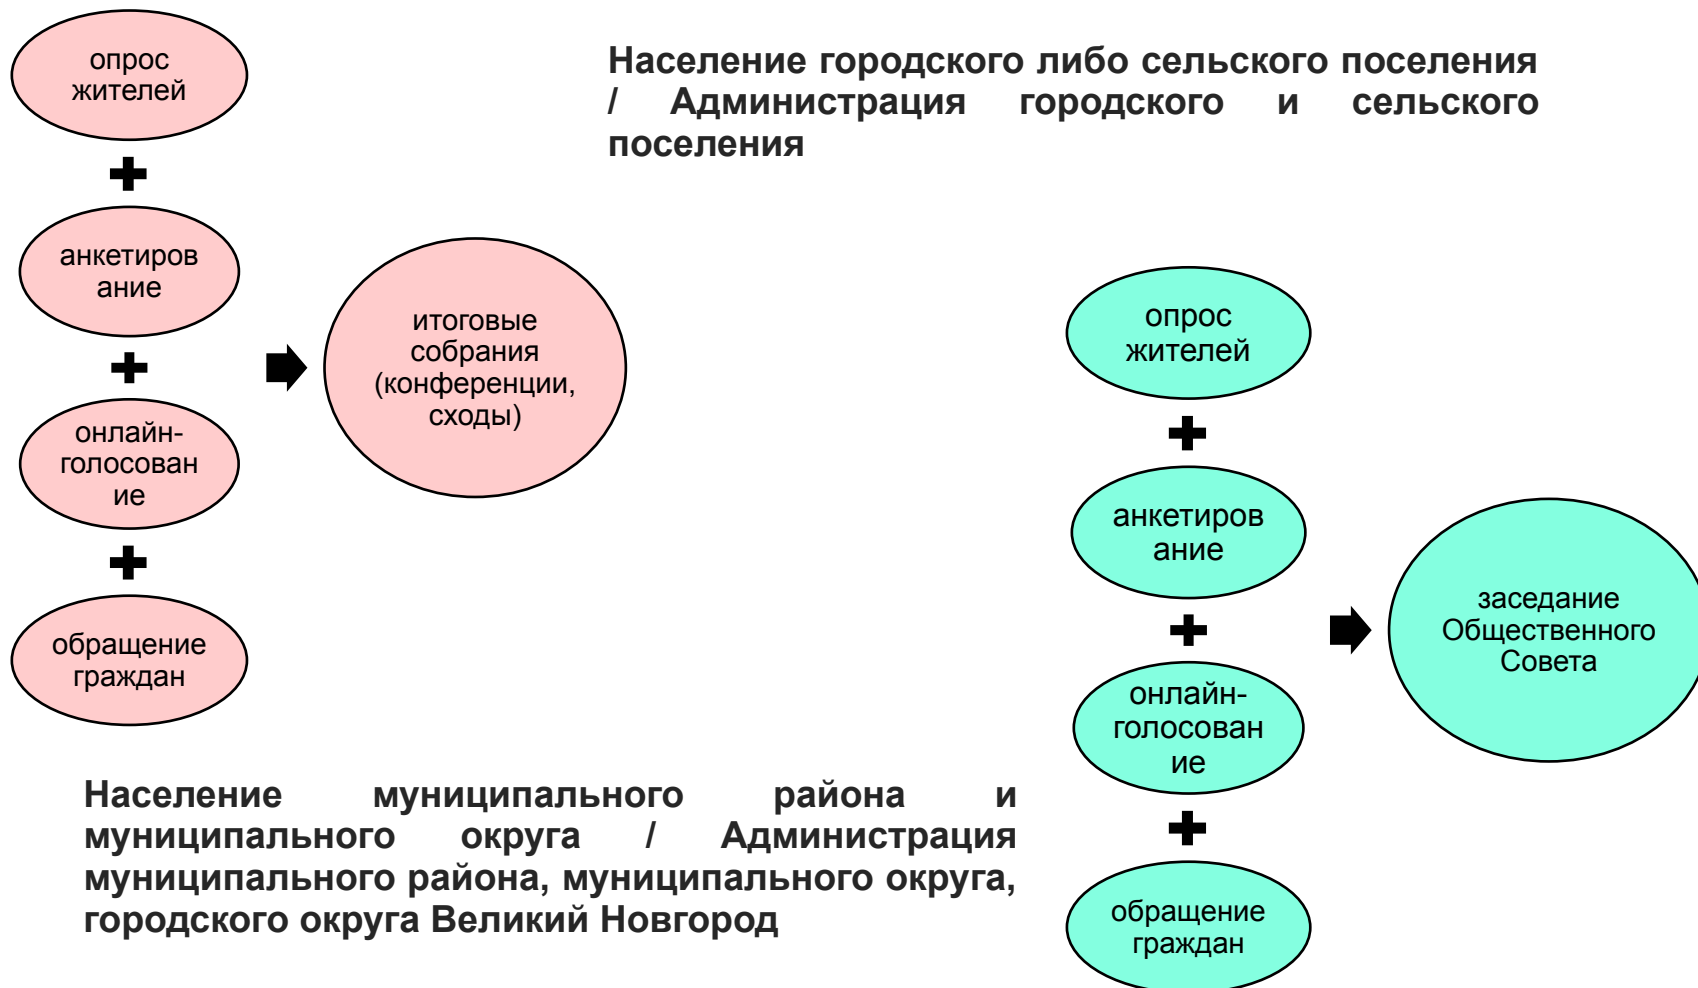



Предварительные результаты проекта по состоянию на 01.08.2021 года

Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, км	100	46,7
Доля граждан, принявших участие в выборе объекта, от числа постоянно проживающих, обладающих активным избирательным правом, %	10	12,01
Уровень одобрения граждан реализации ПРП «Дорога к дому», %	90	91,77
Уровень осведомлённости граждан о реализации ПРП «Дорога к дому», %	40	85,1
Количество уникальных публикаций, ед.	36	41
Охват населения новостным контентом, ед. просмотров Ссылка: https://vk.com/ppmi53	54 000	17 156
Уровень социальной вовлеченности, %	20	41,43









План



Факт



Проблемы реализации проекта

-  В предварительном мониторинге проблем доля жителей, принявших участие, ниже планового **(9,6%)** показателя в Крестецком, Окуловском, Чудовском и Шимском районах
-  Не представили видеофиксацию проведения собраний (**7** муниципальных образований)
-  **Низкий охват населения новостным контентом (просмотров)**
-  На аукционы не вышли **11** муниципальных образований
-  **Необоснованное включение услуг по строительному контролю, проектированию**
-  Несоблюдение уникальности проекта *(на собраниях нельзя выбирать один и тот же объект!)*



Перспективы проекта на 2022 год



Сервис электронной подачи заявки ПРП «Дорога к дому»

Предварительный мониторинг ПРП

Ориентировочно до 15 февраля 2022 года представить материалы по выбору объектов для ремонта:



1. копии протоколов заседаний рабочей группы по подведению итогов предварительного мониторинга, листов регистрации участников рабочей группы с подписями; свод заполненных анкет, опросов жителей, онлайн-голосования;

2. копии протоколов собраний (конференций, сходов) жителей, листов регистрации участников (если делегаты – то протоколы собраний по их выбору или подписные листы с подписями);

3. фото и видеофиксацию проведения итоговых собраний (конференций или сходов)



Спасибо за внимание!

