


Смена флага документа Репутационный на Особо Важный

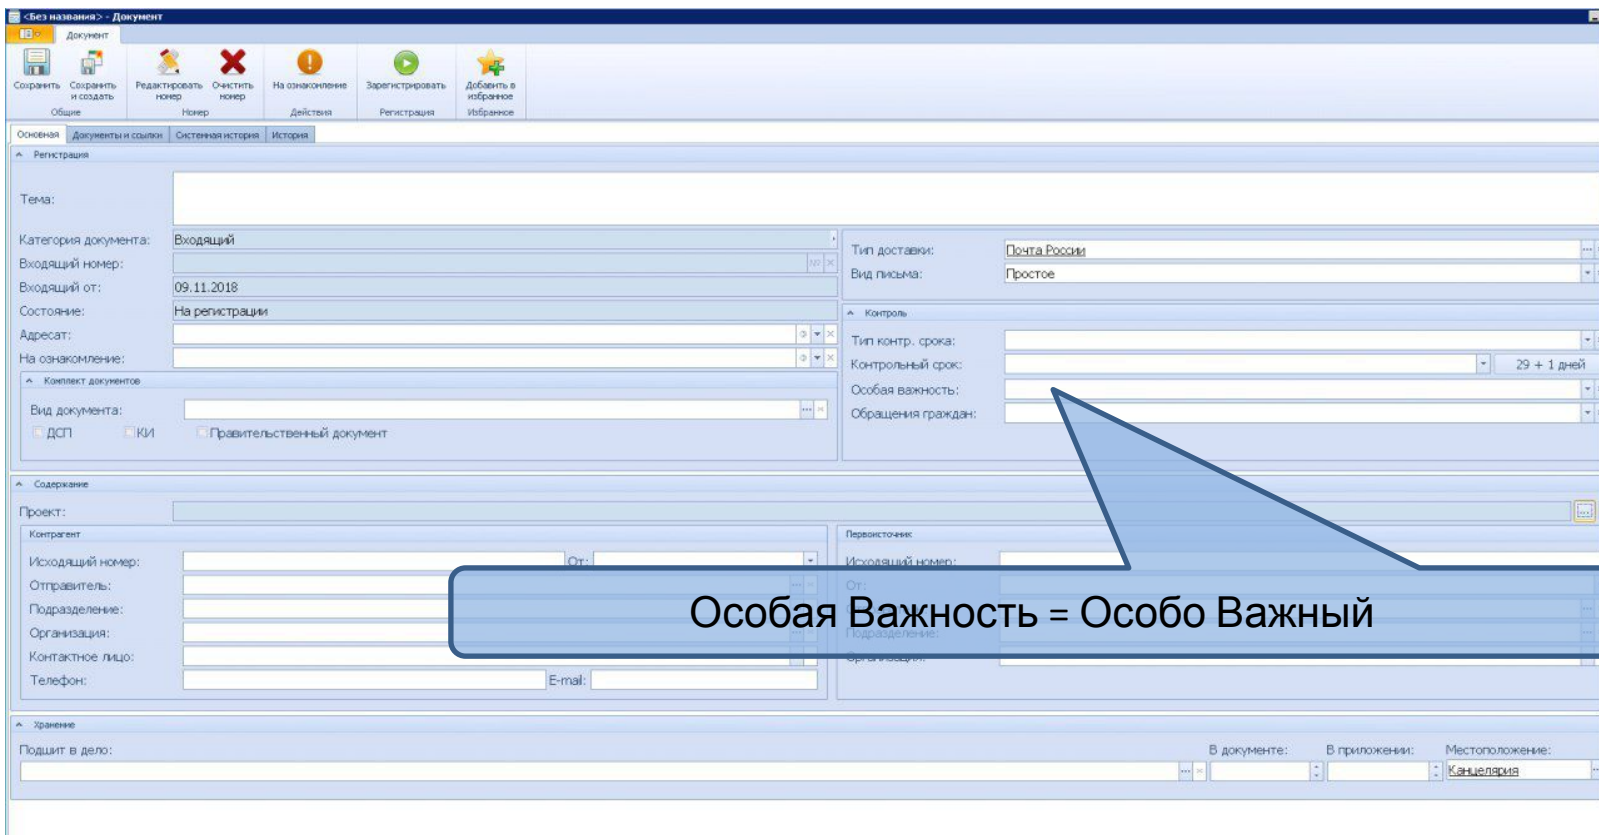

The screenshot shows the 'Документ' (Document) form in the Docsvision system. The form is divided into several sections: 'Регистрация' (Registration), 'Копирует документ' (Copies document), 'Содержание' (Content), and 'Хранение' (Storage). In the 'Регистрация' section, the 'Особая важность' (Special importance) field is highlighted with a blue callout box. The callout box contains the text 'Особая Важность = Особо Важный' (Special Importance = Especially Important). The 'Особая важность' field is currently empty, and the callout box points to it from the right. The 'Контроль' (Control) section shows 'Тип контр. срока' (Control type) set to '29 + 1 дней' (29 + 1 days). The 'Хранение' section shows 'Местоположение' (Location) set to 'Канцелярия' (Clerk's office).

Особая Важность = Особо Важный

Отчет по флагу «Особо важный» и подтверждение флага Генеральным Директором и/или его заместителями

Входящий №4855 - О предоставлении в ВПО информации об обеспечении проектов из состава транспортной части КТММИ строительными, материальными и трудовыми ресурсами (во исполнение поручения Правительства РФ от 23.10.2018 № ДМ-П9-7234р)

Установка флага из карточки документа

Входящий №4855 от 01.11.2018

Тема: О предоставлении в ВПО информации об обеспечении проектов из состава транспортной части КТММИ строительными, материальными и трудовыми ресурсами (во исполнение поручения Правительства РФ от 23.10.2018 № ДМ-П9-7234р)

Проект: Проекты/1. Проектная деятельность/1.14. Ведомственный проектный офис

Вид документа: Организационно-распорядительный документ

Документ: Входящий №4855 от 01.11.2018

Исполнитель: Карлик Д. А.

Контролер: Медведев Т. С.

Доставка: Тип: "ОСЗД Минтранс в работу"

Резолюция ОСЗД: Отсутствует

Организация контрагента: Минтранс России

Отправитель / Подразделение контрагента: Алафинов И. С. / Первый заместитель Министра

История

Исполнитель	Дата получения	Заданный процесс	Дата действия	Завершил	Доп. информация
Регистрация (цикл №1)					
Груздева И. Д.	01.11.2018 10:41	Документ зарегистрирован	01.11.2018 10:41	Груздева И. Д.	Контрольная дата: 09.11.2018 18:00
Наложение резолюции (цикл №1)					
Генеральный директор (в командировке с 31.10.2018 по 01.11.2018, замещает по функции: Карлик Д. А.)	01.11.2018 10:41 Срок: 02.11.2018 10:41 (1 р.д.)	На исполнение резолюции	Срок: 09.11.2018 18:00 Пролонгирован на 1 р.д. 6 ч.	Гудков И. Э.	Направлено: Карлик Д. А.; Подписант: Гудков И. Э.; Замечание: менять подписанта
Работа по документу главного исполнителя (цикл №1)					
Карлик Д. А.	05.11.2018 18:25 Срок: 06.11.2018 18:00 (1 р.д.)	Резолюция на исполнение	06.11.2018 10:43	Карлик Д. А.	Направлено: Кочергина А. С.;
Кочергина А. С. (в отпуске с 26.10.2018 по 05.11.2018, замещает по функции: Карлик Д. А.)	06.11.2018 10:43 Срок: 09.11.2018	Принят в работу	06.11.2018 10:55	Щеголева К. А.	Направлено: Щеголева К. А.;

Действия доступны Генеральному Директору

Входящий №4855 - "test 2.2"

Особо Важный
 Утвердить Особо Важный
 Снять Особо Важный

Комментарий:

Готово Закрыть

Обязательный ввод комментария


Установка флага Генеральным Директором, Заместителями или Советниками Генерального Директора

В зависимости от состояния флага доступны следующие действия:

В документе флаг не установлен.

Система предоставляет возможность установки с обязательным указанием причины установки.

Описание установки флага должно быть кратким.



Входящий №0084 - 'тест 2.2'

Особо Важный

Комментарий:

Файлы

Готово Закрыть

Утверждение или снятие установленного флага Генеральным Директором

В зависимости от состояния флага доступны следующие действия:

В документе флаг установлен.

Система предоставляет возможность утверждения или снятия флага с обязательным указанием причины. В системе отображается кто установил флаг, с указанием даты и время

Доступно только для Генерального Директора.

Описание установки флага должно быть кратким.



Входящий №0084 - 'тест 2 2'

Утвердить Особо Важный

Снять Особо Важный

Комментарий:

Флаг установлен: Автоматически 02.11.2018 14:33

Файлы

Работа с флагом «Особо Важный»

Отображения флага

№ Документа	Тема	От	Резолюция	Доп.резолюции	Приближение срок	Контрольный срок	Особо важный	Соисполн
Карлик Д. А. (Элементов: 6)								
Входящий (Элементов: 3)								
4647	Требование от 17.10.2018 № 10-13/183699 о предоставлении документов, подтверждающих применение налоговой льготы по коду 201200 по налогу на имущество Учреждения за 1-ое полугодие 2018 г.	23.10.2018	На исполнение	Подготовить исходящий документ	Приближение срока	02.11.2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Басирова
	О предоставлении в ДЭФ предложений к проекту ФЗ "О защите и поощрении"						<input type="checkbox"/>	

Изменение флага

Отображение флага

Отчет по исполнительной дисциплине

Организация	ФКУ "Остранинтервенция"
Период отчета	август - сентябрь 2018
Главный исполнитель	Карлик Д. А.

Отчет по исполнительной дисциплине

Организация	ФКУ "Остранинтервенция"
Период отчета	август - сентябрь 2018
Главный исполнитель	Карлик Д. А.

Открытые

Документ	Проект	Дата документа	Контроль срок	Резолюция	Особо Важный	Примечание/ссылка	Комментарий исполнителя	Комментарий контролера	Требуется лишение ГД	Состояние документа
Входящий №3260 - "Об участии 23.07.2018 в 4:00 в совещании Правительства РФ на вопросы о рассмотрении предложений по 3 вариантам проектов в Волжский тип модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в части видовой трансформации)"	Проект №1. Проектная деятельность, 09. ПП ФАИТ	25.07.2018 00:00	25.07.2018 18:00	Срок истек лично	нет	Внешняя объективная причина	Не было описано доказывать, пока не было дано производственного результата.		Нет	
Входящий №3341 - "О необходимости составления рецензий при инициации работ ГД № 0719/10/14 от 19.03.2014 на выполнение 2 эскизных работ с разработкой РД по объекту "Комплексное развитие МТУ" (по исполнению п. 2 Распоряжения Правительства РФ от 06.07.2018 № 1389-р)"	Проект №1. Проектная деятельность, 01. Мемский транспортный свп	12.07.2018 00:00	11.08.2018 18:00	Подготовить исходящий документ	нет	Внешняя объективная причина	Направили как только получили актуальный график от подрядчика.	Функционал истребования продлен срок исполнения не использовался	Нет	
Получение №0024 - "Оформить почтовый и провозить саму документацию для предоставления по МТУ. Засчитать величину задолженности по контракту на текущую дату и на конец года, с учетом имеющегося финансирования в наем ФАИТ"	Проект №1. Проектная деятельность, 01. Мемский транспортный свп	07.06.2018 17:59	14.06.2018 18:00	Подготовить служебные записки	да	Внешняя объективная причина	Расчет информации не был был проведен до получения от подрядчика авторизованного графика выполнения работ. Расчет направлен в Мемск сразу после получения точечного графика производства работ и проведения организационного совещания с СУ, Давид и ПТЭС.		Нет	

Открытые документы

Вид документа	Всего документов	Не просрочено	Просрочено	Просрочено (за отчетный период)	Всего просрочено Особо Важных	Вина ГИ	Вина СИ	Проблема взаимодействия внутри подразделения	Внешняя объективная причина	Несоответственность с ГД	Ошибка программы	Требуют внимания ГД
Входящий	2	0	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0
Получение	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Итого	3	0	3	1	1	0	0	0	3	0	0	0

Отображение флага

Закрываемые документы

Вид документа	Всего документов	Не просрочено	Всего просрочено	Просрочено Особо Важных	Вина ГИ	Вина СИ	Проблема взаимодействия внутри подразделения	Внешняя объективная причина	Несоответственность с ГД	Ошибка программы	Требуют внимания ГД
Входящий	67	54	13	1	1	0	5	7	0	0	0
Получение	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Служебная записка в адрес ГД (И. О. ГД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	68	54	14	1	1	0	5	8	0	0	0

Вывод установленного флага «Особо важный» в шапку листа истории (п.4)

Выделение названия документа красным цветом

Входящий №4652 от 23.10.2018

Тема	#test#		
Проект	Проекты/4. Внутрихозяйственная деятельность/4.02. Официальный сайт ФКУ		
Вид документа	Финансовый документ (смета, лимиты бюджета)		
Документ	Входящий №4652 от 23.10.2018	Состояние	Исполнен
Исходящий	№ 123 от 23.10.2018	Срок исполнения	22.11.2018 18:00 (Разовый)
Основной исполнитель	Кудрина М. В.	Соисполнители	
Доставка	Тип: "Почта России"	Особо важный	Да
Организация контрагента	Док.Ру		
Отправитель / Подразделение контрагента	Смирнов А. Е.		

История

Вывод в шапку документа

Отображение флага в отчетах

Отчет по исполнительской дисциплине

Организация	ФКУ "РоСтранс модернизация"
Период отчета	август - сентябрь 2018
Главный исполнитель	Карлик Д. А.

Открытые

№	Документ	Проект	Дата документа	Контрольный срок	Резолюция	Особо Важный	Причина просрочки	Комментарий исполнителя	Комментарий контролера	Требуется внимание ГД	Состояние документа
1	Входящий №03260 - "Об участии 25.07.2018 в 14:00 в совещании Правительства РФ по вопросу о рассмотрении предложений по включению проектов в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в части водного транспорта)"	Проекты/1. Проектная деятельность/1.09. ГТ/ФАИП	25.07.2018 00:00	25.07.2018 18:00	Доложить лично	нет	Внешняя объективная причина	Смысла докладывать, пока не будет получен положительный результат.		Нет	
2	Входящий №03041 - "О необходимости согласования решений при изменении условий ГК № РТМ-19/14 от 19.03.2014 на выполнение строительных работ с разработкой РД по объекту "Комплексное развитие МТУ" (во исполнение п. 2 Распоряжения Правительства РФ от 06.07.2018 № 1380-р)"	Проекты/1. Проектная деятельность/1.01. Мурманский транспортный узел	12.07.2018 00:00	11.08.2018 18:00	Подготовить исходящий документ	нет	Внешняя объективная причина	Направили как только получили согласования от подрядчика.	Функционал истрезован, продления срока исполнения не использовался	Нет	
3	Поручение №0264 - "Сформировать принципы и проверить саму законность индексации для госконтракта по МТУ. Рассчитать величину удорожания госоконтракта на текущую дату и на конец года, с учетом имеющегося финансирования в нашем ФАИП"	Проекты/1. Проектная деятельность/1.01. Мурманский транспортный узел	07.06.2018 17:59	14.06.2018 18:00	Подготовить служебную записку	да	Внешняя объективная причина	Расчет индексации не мог быть произведен из-за отсутствия подрячика актуализации выполнения работ. РД после получения Минтранс составил уточненного графика производств работ и проведенное согласительного совещания с СК, Главной и ГТЛК.		Нет	

Колонка с флагом

Отчет по исполнительской дисциплине

Организация	ФКУ "РоСтранс модернизация"
Период отчета	август - сентябрь 2018
Главный исполнитель	Карлик Д. А.

Открытые документы

Вид документа	Всего документов	Не просрочено	Просрочено	Просрочено (за отчетный период)	Всего просрочено Особо Важных	Вина ГИ	Вина СИ	Проблема взаимодействия внутри подразделения	Внешняя объективная причина	Несогласованность с ГД	Ошибка программы	Требуют внимания ГД
Входящий	2	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Поручение	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Итого	3	0	3	1	1	0	0	0	3	0	0	0

Закрытые документы

Вид документа	Всего документов	Просрочено	Просрочено	Просрочено репутационных	Вина ГИ	Вина СИ	Проблема взаимодействия внутри подразделения	Внешняя объективная причина	Несогласованность с ГД	Ошибка программы	Требуют внимания ГД
Входящий	67	54	14	0	1	0	5	7	0	0	0
Поручение	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Служебная записка в адрес ГД (И. О. ГД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	68	54	14	1	1	0	5	8	0	0	0

Колонка с флагом

Уведомление о установке флага

Система должна производить уведомление Генерального Директора по почте об установке флага Заместителями и Советниками Генерального Директора

1. Оперативное уведомление о постановке флага. Отправляется системой сразу после того как флаг установлен и оставлен **комментарий**

Уведомление должно содержать :

- Тему:
- Номер:
- От:
- Доп. Резолюции:
- Контрольный срок:
- Исполнитель:
- Текущий статус:
- Кто установил
- Причина установки флага:

Уведомление: новый срочный документ поступил на контроль

Уведомление: Владислав О представлении объяснений по проведению аукциона (заявка № 3731000096718000024) на оказание услуг по поставке сертификатов на техническую поддержку программного обеспечения АСУ ТК (клуба ООО "МФРА") переведен в Особо Важный

Контрольный срок: 09.11.2018

Исполнитель: Савчарь А. В.

Контроль: Мозылева Т. С.

Ссылка на карточку

Ссылка на карточку WEB

Входящий №4940 от 07.11.2018

Тема	О представлении объяснений по проведению аукциона (заявка № 3731000096718000024) на оказание услуг по поставке сертификатов на техническую поддержку программного обеспечения АСУ ТК (клуба ООО "МФРА")		
Входит	Прочитать; Проверить действительность; ИЖ; АСУ ТК		
Вид документа	Классификационный документ		
Документ	Входящий №4940 от 07.11.2018	Состояние	Принят в работу
Исходящий	№ 611 от 07.11.2018	Срок исполнения	09.11.2018 18:00 (Рабочий)
Основной исполнитель	Савчарь А. В.	См. комментарий	Петров А. В.
Контроль	Мозылева Т. С.	Особо Важный	Да
Доставка	Тип: "Электронная почта", в 07.11.2018 00:00		
Организация контрагента	ФАС России		
Отправитель / Подразделение контрагента	Леонова Г. Ю. / Управление контроля разрешений гос. заказа		

История

2. Отчетное уведомление формируется системой один раз в день и отправляет полный список документов по которым произошло изменение флага.

Уведомление должно содержать :

- Тему:
- Номер:
- От:
- Доп. Резолюции:
- Контрольный срок:
- Исполнитель:
- Текущий статус:
- Кто установил
- Причина установки флага:

Отображение документов с установленным флагом

Для простоты поиска документов с флагом «Особо Важный» будут отображать в папке Отчеты-Особо Важные

Администратор А. А.

- Оперативка
- Отчеты**
 - Открытые
 - Закрытые
 - Особо Важные**
 - Документы, обработанные заместителями
- Аналитические отчеты - диаграммы
- Действующие приказы
- Оперативка АСУ ТК
- Справочники
- Регистрация [5]

Search

Категория документа

Резолюция	Доп.резолюции	Приближение срок	Контрольный срок	Репутационный док	Соис
Сичкарь А. В. (Элементов: 16)					
Входящий (Элементов: 9)					
На исполнение		Просрочен	17.08.2018	<input type="checkbox"/>	
На исполнение	Доложить лично	Просрочен	25.05.2018	<input type="checkbox"/>	Ямша
На исполнение	Доложить лично	Приближение срока	09.11.2018	<input type="checkbox"/>	Кудри
На исполнение	Подготовить исходящий документ	Приближение срока	09.11.2018	<input type="checkbox"/>	
На исполнение	Подготовить исходящий документ	Приближение срока	12.11.2018	<input type="checkbox"/>	
На исполнение	Доложить лично	Просрочен	21.09.2018	<input type="checkbox"/>	Кудри
