



ДАВЫДОВЪ СТРОЙ КОМПЛЕКС

презентация


Устав

Название проекта	«Строительство каркасного строения» «ДавыдоFF Стройкомплекс»		
Цель заказчика	Сдача каркасного строения в срок не выходя из заложенного бюджета		
Цель проекта	Получения заказа на строительство катеджного домика путем победы в торгах.		
Результат проекта	Акт выполненных работ Привлечение специалистов для снижения общей себестоимости работ.		
Критерии успешности	Реализация проекта в сорок		
Обоснование целесообразности осуществления проекта	Полученная прибыль 25%		
Основные участники проекта и их интересы	Категория участника	Наименования	Интересы
	Заказчик		
	Инвестор		
	Уполномоченный проектировщик		
	Поставщик услуг		
	Подрядчик		
	Консультант		
	Лицензиар		
	Руководитель проекта		
	Команда проекта		
Стоимость	14 500 у.е		
Срок реализации	6 недель		

ДЕКОМПОЗИЦИЯ РАБОТ

- "ДавыдоFF Стройкомплекс"
- Управление строительством
 - 1. Подготовка
 - 2. Фундамент и цоколь
 - 3. Стены
 - 4. Крыша
 - 5. Балкон
 - 6. Дверь и окна
 - 7. Сборка
 - 8. Отделка
 - 9. Ландшафт
- Управление заказами
 - 1. Поставщик
 - 2. Поставщик
- Управление кадрами
 - 1. Квалифицированные работники
 - 2. Не квалифицированные работники

Линейный график выполнения работ

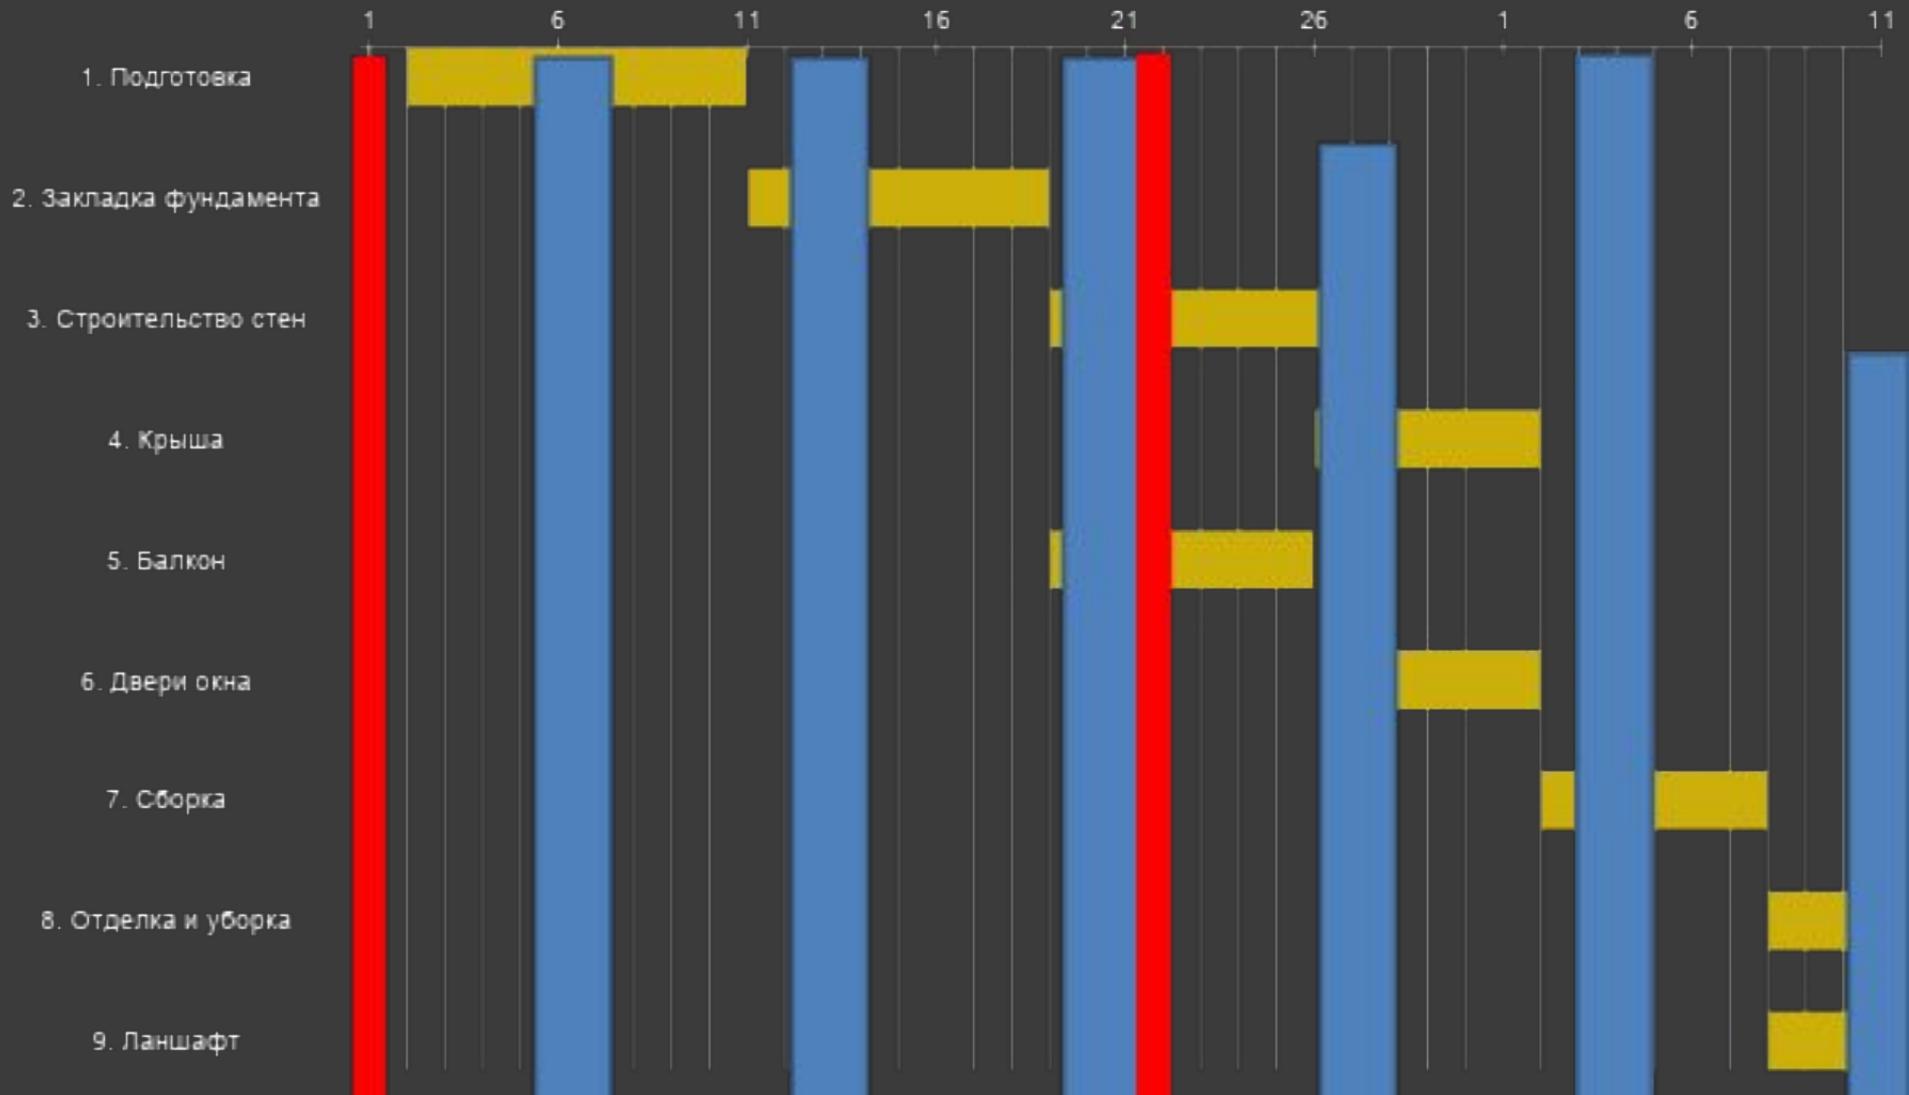

ЗАТРАТЫ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
Квалиф. Раб	0	1	1	1	1	В	В	1	1	1	2	2	В	В	2	2	2	2	2	В	В	0	2	2	2	2	В	В	2	2	2	1	1	В	В	1	1	1	1	1	
Квалиф. Контракт	2	1	1	1	1	В	В	1	1	1	0	0	В	В	0	0	0	0	0	В	В	2	0	0	0	0	В	В	0	0	0	1	1	В	В	0	0	0	0	0	
зарплата					400	В	В					400	В	В					400	В	В					400	В	В					400	В	В					200	
не квалиф.раб	0	5	5	5	5	В	В	5	5	5	4	4	В	В	4	4	4	4	4	В	В	0	4	4	4	5	В	В	2	2	2	2	2	В	В	3	3	3	3	3	
не квалиф.контракт	5	0	0	0	0	В	В	0	0	0	1	1	В	В	0	0	0	0	0	В	В	4	1	1	1	0	В	В	0	0	0	0	0	В	В	0	0	0	0	0	
зарплата					600	В	В					600	В	В					480	В	В					600	В	В					240	В	В					360	
материалы контракт	(2,3,5)					В	В	(4)					В	В	(6,7)					В	В	(9)	260				В	В						В	В						
материалы оплата	0					В	В	(2)					В	В	(3,5)					В	В	(4)	1195				В	В	(6,7)					В	В	(9)	260				
материалы	0					В	В						В	В						В	В						В	В						В	В						
ИТОГО	12320				1000		2550					1000		2040					880			1195				1000		475					640			980			560		
с учетом прибыли	15400																																								
расходы за 3																																									
недели	7170																																								



Риски – каждые 3 недели возможны проливные дожди с продолжительностью не более суток.

С учетом данного риска были заложены 2 резервных дня.



