

Тема выпускной  
квалификационной

# Поликлиника на 300 посещений в день

Разработал Тарасов А.

А.

Проверил Антоненко

А.В.

г.  
Благовеще  
цк 2020



# Исходные данные проекта

- **Высота этажа- 2,0 м.**
- **Фундаменты- ленточный**
- **Грунты в основании- суглинки**
- **Материал стен- кирпич; стены наружные 640 мм., стены внутренние 380 мм., перегородки 120 мм .**
- **Перекрытия-сборный железобетон**
- **Крыша- скатная; материал кровли металлочерепица**
- **Район строительства- с. Чигири**




# Архитектурно-строительная часть

- Здание имеет не сложную форму с размерами в осях 4200мм.\*16300мм.
- Рельеф местности относительно спокойный
- На участке имеются так же существующий дом, зона отдыха, детская площадка

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

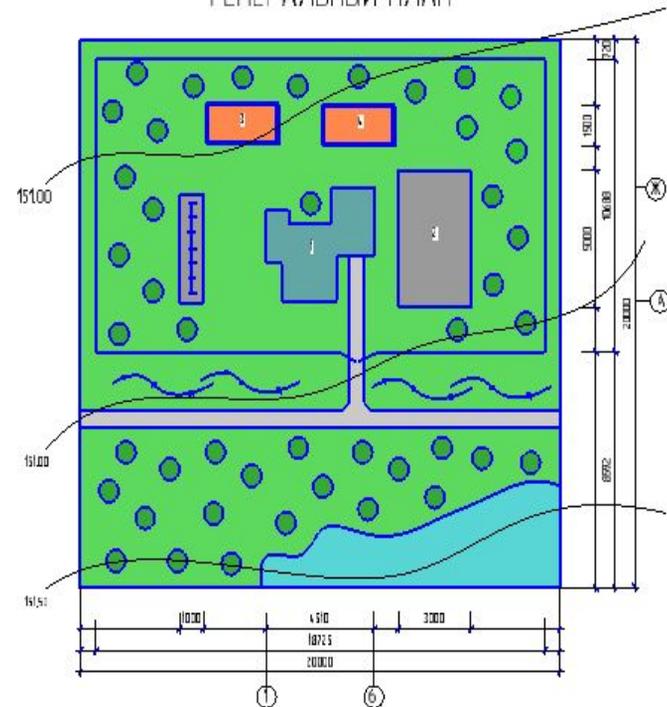
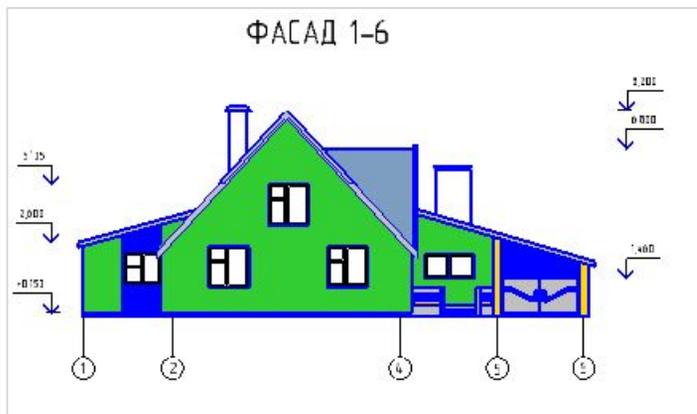


- Планы расположения фундамента, плит перекрытия
- Разрез 1-1
- Узлы

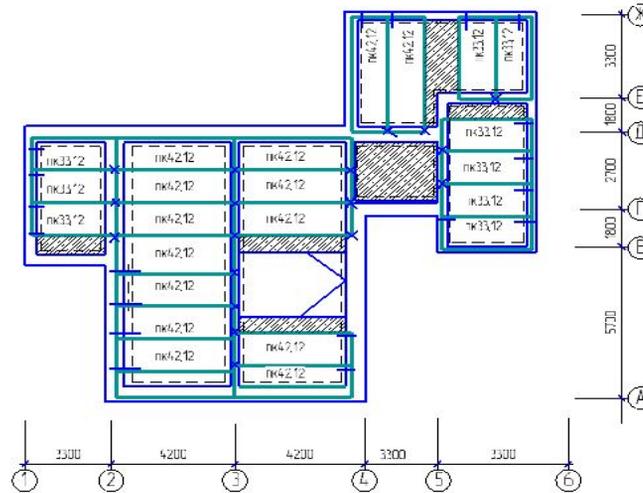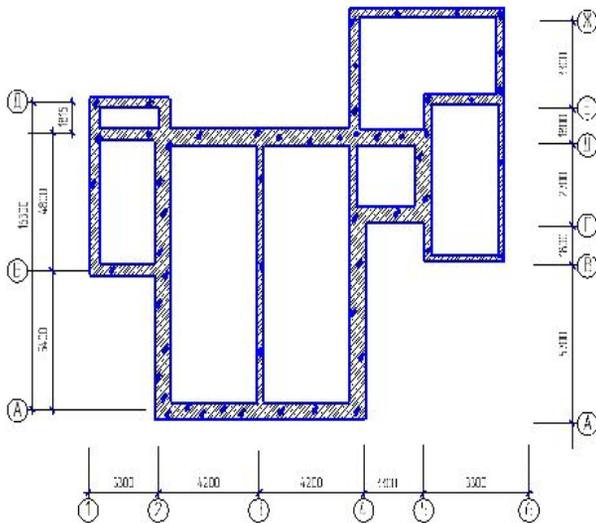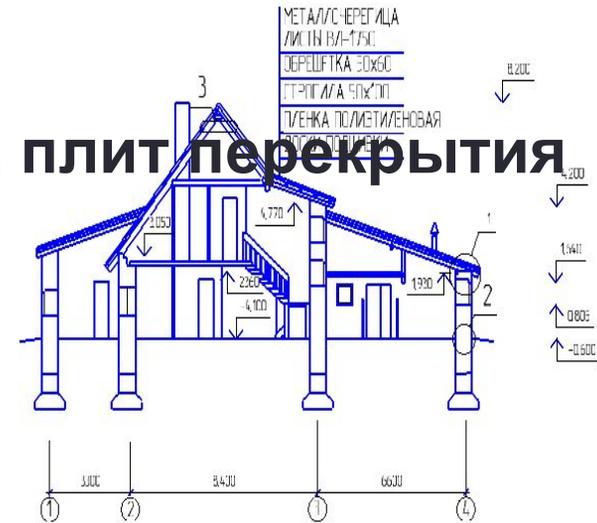


# Расчётно-конструктивная часть

- Расчёт перемычки, плиты перекрытия

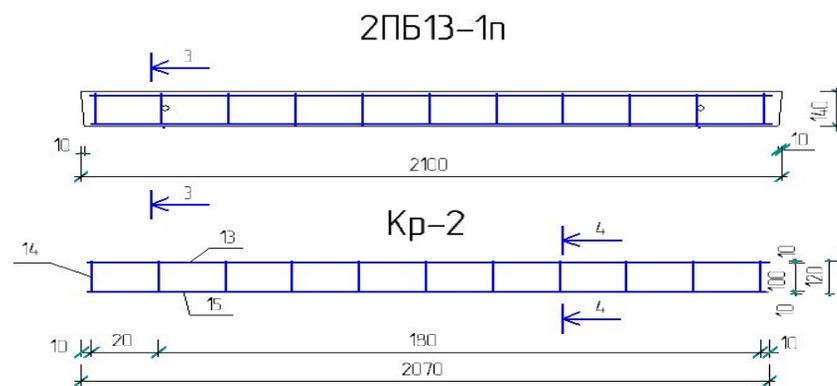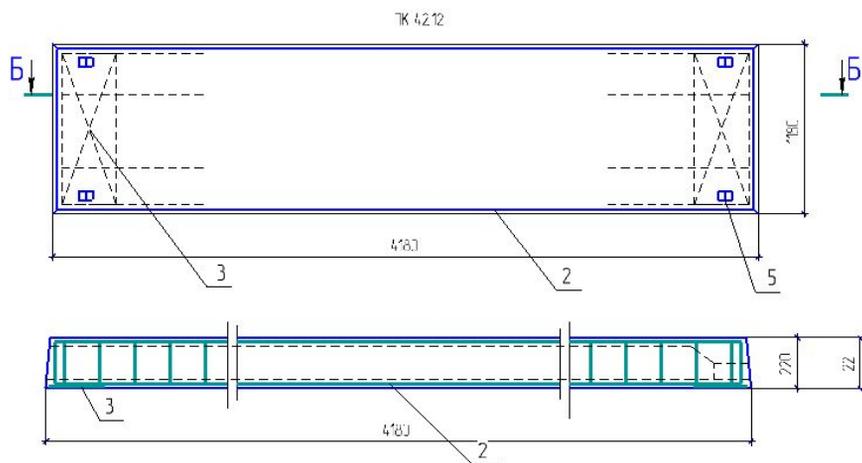

# Технологическая карта


- Устройство каменной кладки

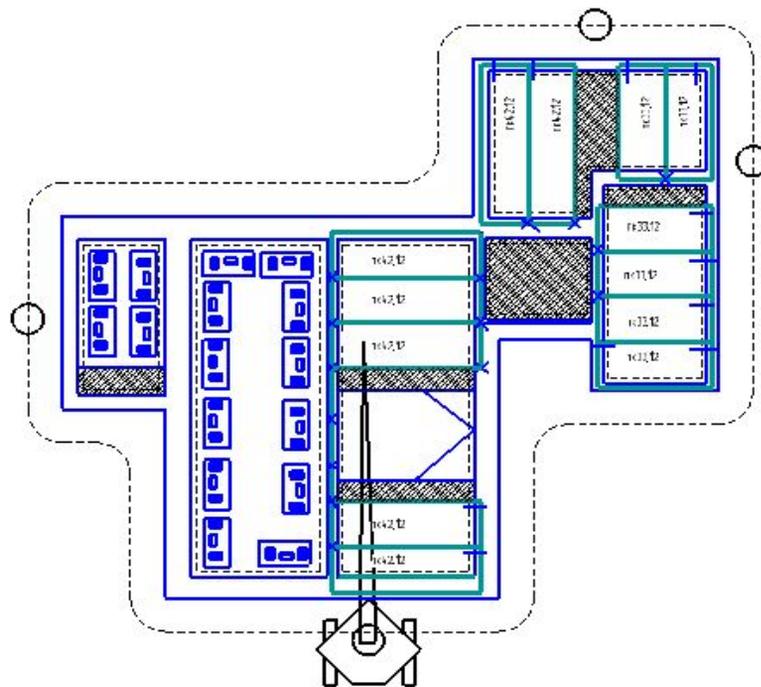



# Строительный генеральный план

Коэффициент неравномерности движения рабочих составляет 1,21  
Планируемый срок строительства 200дня  
Фактический срок строительства 224.4 дня.

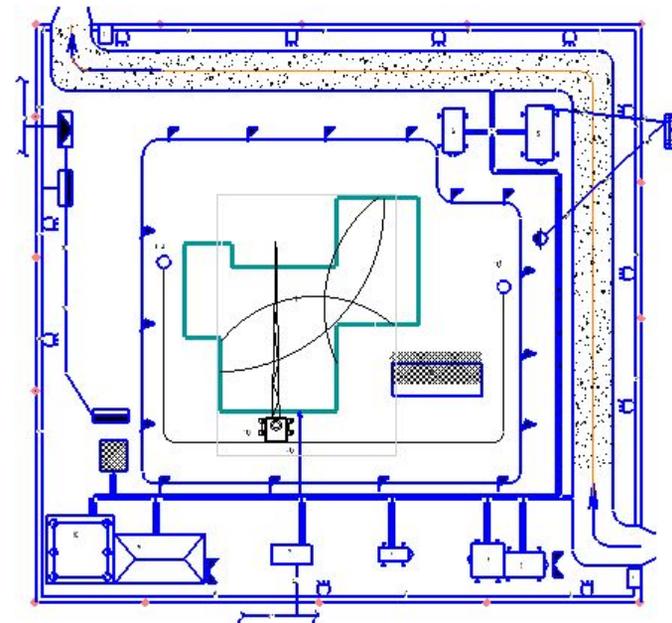

# Технико-экономические показатели по проекту

1	Сметная стоимость строительства, тыс. руб.	7611,58
2	Сметная стоимость общестроительных работ, тыс. руб.	4824,65
3	Договорная цена, тыс. руб.	7483,41
4	Строительный объем здания, м <sup>3</sup>	2295,92
5	Общая площадь, м <sup>2</sup>	279,99
6	Стоимость 1м <sup>3</sup> здания, тыс.руб.	27,18
7	Стоимость 1м <sup>2</sup> здания, тыс.руб.	226,99
8	Процент выполнения нормы выработки, %	112,20
9	Среднее число рабочих, чел.	14,00
10	Нормативная трудоемкость, чел-дн.	355333,87
11	Сметная заработная плата, тыс. руб.	695,97
12	Затраты труда на 1 м <sup>3</sup> здания, чел-дн./м <sup>3</sup>	154,77
13	Затраты труда на 1 м <sup>2</sup> здания, чел-дн./м <sup>2</sup>	1269,09
14	Выработка на одного рабочего в день по общестроительным работам, тыс. руб.	0,01
15	Эффективность от сокращения сроков продолжительности строительства, тыс. руб.	46,43

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**
