

Управление портфелем проектов



Цели нашей системы управления портфелем проектов

- Повышение **эффективности** сотрудников компании при работе над проектами
- Улучшение **качества** управления проектами руководителями проектов
- Повышение эффективности управления всем портфелем проектов компании – больше проектов в срок и в рамках бюджета с меньшими затратами
- **Оптимизация процессов** в рамках выполнения проектов
- Обеспечение **коммуникаций и эффективного взаимодействия** между проектными и функциональными службами организации.
- Создание **единого информационного пространства** - электронный архив документации, процедуры согласования документов с внешними службами и подразделениями компании, совместная работа по созданию документов и новых версий документов.

Задачи, которые должна решать система управления проектным офисом

- Обеспечить **руководителя проекта** инструментарием планирования проекта и контроля хода его реализации
- Предоставить **участнику проекта** понятный инструмент для выполнения задач проекта и доступа ко всей необходимой для их выполнения информации
- **Руководителю подразделения** дать инструмент контроля загрузки сотрудников по проектным и непроектным задачам, предоставить информацию для принятия решения о назначении сотрудников на новые проекты, перераспределения нагрузки между ними
- **Директору проектного офиса** предоставить удобный инструмент, который позволит автоматизировать рутинные операции и установить полный прозрачный контроль за состоянием всего портфеля проектов и качеством работы конкретных руководителей проектов
- **Руководителю компании** обеспечить единую панель мониторинга всех проектов компании с возможностью оперативного анализа отклонений и принятия управленческих решений
- **Акционерам компании** важно видеть соответствие портфеля выполняемых проектов стратегическим целям компании

Задачи, которые решает наша система

- Управление проектным офисом
- Управление внутренним взаимодействием
- Управление CRM
- Управление внутренней документацией:
 - ✓ приказы
 - ✓ входящая/исходящая корреспонденция
- Управление оргструктурой компании
- Управление совещаниями
- Управление ресурсным планированием по направлениям:
 - ✓ проектирование
 - ✓ строительство
 - ✓ разработка программного обеспечения
- HR – модуль
- Интеграция со сторонним ПО: 1С (ЗУП, БИТ.Строительство, БИТ. Финанс и т.д.); мобильными приложениями, Google и т.д.

Управление проектным офисом

➤ Реестр проектов

Projects / External projects

Создать Поиск Русский Выход

Мои проекты Внутренние проекты **Внешние проекты**


Поиск по цифру и названию проекта

Шифр	Название	КГИИ/Руководитель проекта	Управление составом участников проекта	Действия
1556.18	Группа высшего уровня			
1413.18	Проектирование и строительство участка канализационного коллектора Д=1500 мм от "Внуково" до "Ново-Солнцевская"	Брель Ю. В.	Брель Ю. В.	
1413.18.1	Выполнение РД участка канализационного коллектора Д=1500 мм от "Внуково" до "Ново-Солнцевская"	Багдасарян А. С.	Багдасарян А. С.	
1413.18.2	Выполнение РД участка канализационного коллектора Д=1500 мм от "Внуково" до "Ново-Солнцевская"	Багдасарян А. С.	Багдасарян А. С.	
1413.18.3	Тест группы			
1413.18.4	Тестировать	Бузулукина А. И.	Бузулукина А. И.	
1413.18.5	Тестировать экспорт с Сашей	Бузулукина А. И.	Бузулукина А. И.	
1413.18.6	Новый баг	Бузулукина А. И.	Бузулукина А. И.	
1555.18	Тестировать	Бузулукина А. И.	Бузулукина А. И.	
1551.18	тест	Васильева Е. С.	Васильева Е. С.	
1550.18	Проект 007	Мазырина Е. И.	Харламова Е. В.	
1548.18	Новая группа проектов на новом роуте			
1548.18.1	Подгруппа новой группы на новом роуте			
1545.18	АЭС АЭС ЮЯ			
1544.18	Подготовка документации по планировке территории ад «Обход с Солнечногорска»	Малолетнев Д. А.	Малолетнев Д. А.	
1543.18	Подготовка ППТ для ад Питницкое шоссе в Солнечногорском районе Московской области	Кудышкин К. О.	Кудышкин К. О.	
1541.18	Реконструкция автомобильной дороги МКАД-Дроздово-Беседы-МКАД на участке км 0,0-км 1,1	Борисов А. В.	Борисов А. В.	
1540.18	Строительство тоннеля под Капущинским шоссе и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подземными дорогами". Этап 1. Этап 1.2 Этап 1.2.1.	Анненков С. В.	Анненков С. В.	
1539.18	Капитальный ремонт. Павильон 29 «Детство и озеленение». «ВСКВ-БДХ-ВВЦ»	Барсуков М. В.	Барсуков М. В.	
1535.18	Реставрация храма Святой Живоначальной Троицы в д. Солпны, Боровинского р-на, Новгородской обл.	Чернышов В. М.	Чернышов В. М.	
1534.18	Многоуровневые транспортные развязки МКАД - ул Верхние поля и МКАД - ул Капюши	Галюнов М. М.	Галюнов М. М.	
1533.18	РД Строительство путепровода через железную дорогу по улице Фрунзе – улице Мира в городе Мытищи Московской области	Рогова С.	Рогова С.	
1530.18	Строительство многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления МКАД	Гутлева Н.	Гутлева Н.	
1529.18	СК Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский, ул. Тулолева	Бельские А. В.	Бельские А. В.	
1528.18	Реставрация храма Святой Живоначальной Троицы в д. Солпны, Боровинского р-на, Новгородской обл.	Андреевский С. В.	Андреевский С. В., Чернышов В. М.	
1527.18	Дом культуры. М.О., г. Реутов, ул. Южная	Орлов А. Р.	Орлов А. Р.	

Проект – это очень сложный и дорогой комплекс различных работ. К работе над проектом привлекаются самые разнообразные специалисты и компании, которые должны организовать совместную работу так, чтобы проект был выполнен в срок, с требуемым качеством и, желательно, без увеличения первоначального бюджета.

Исполнение проекта

А6.1 Работа с задачами по проекту

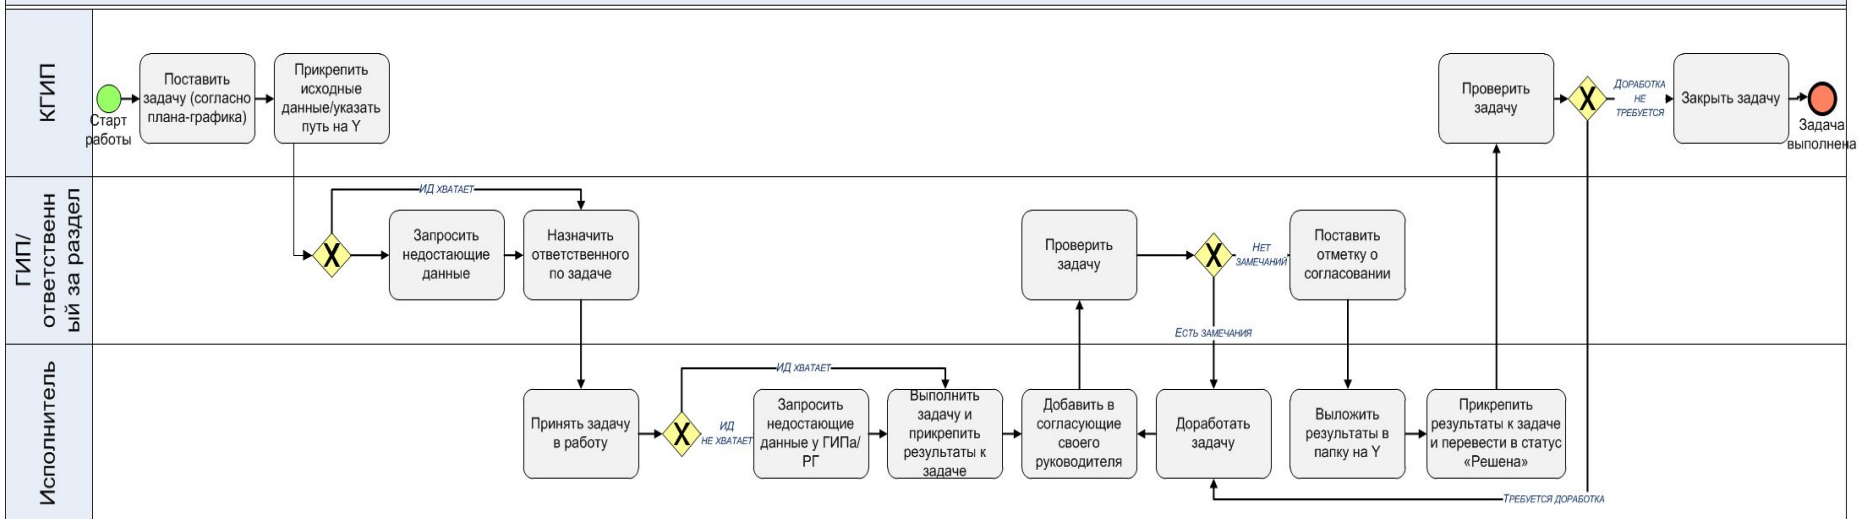

Управление проектом состоит из следующих основных этапов:

- **инициация;**
- **планирование;**
- **исполнение;**
- **контроль;**
- **завершение.**

Управление проектным офисом

➤ Карточка (паспорт проекта)

Проекты / Внешние проекты / Редактирование проекта #1533

Создать

Поиск

Русский

Выход

РД Строительство путепровода через железную дорогу по улице Фрунзе – улице Мира в городе Мытищи Московской области

Основная информация

Настройки

Название проекта * РД Строительство путепровода через железную дорогу по улице Фрунзе – улице Мира в городе Мытищи Московской области

Статус проекта * Активный

Видимость проекта * Частный

КГИПП/Руководитель проекта * Рогачева Светлана *Роли в проекте*

Управление составом участников проекта * Рогачева Светлана

Вид деятельности * ПИР *Классификация по видам деятельности*

Шифр проекта * 1533.18 *Формирование шифра проекта*

ЦФО основной * Проектирование *Деление затрат по ЦФО*

ЦФО дополнительные * Выберите дополнительные ЦФО

Полное наименование объекта * РД Строительство путепровода через железную дорогу по улице Фрунзе – улице Мира в городе Мытищи Московской области

Цель проекта

Адрес [Указать адрес](#)


Папка проекта

Договор

Управление договорами

- **Формирование паспорта проекта, команды проекта, определение потребности в персонале, разработка матрицы ответственности, делегирование ответственности.**
- **Автоматические уведомления участникам по событиям в проекте**
- **Интеграция с сетевыми папками через AD по шифру проекта. Доступ к сетевым папкам согласно списку участников проекта**
- **Формирование затрат по проекту для финансовой отчетности по ЦФО, выгрузка в БИТ.Финанс**

Структура в рамках проекта

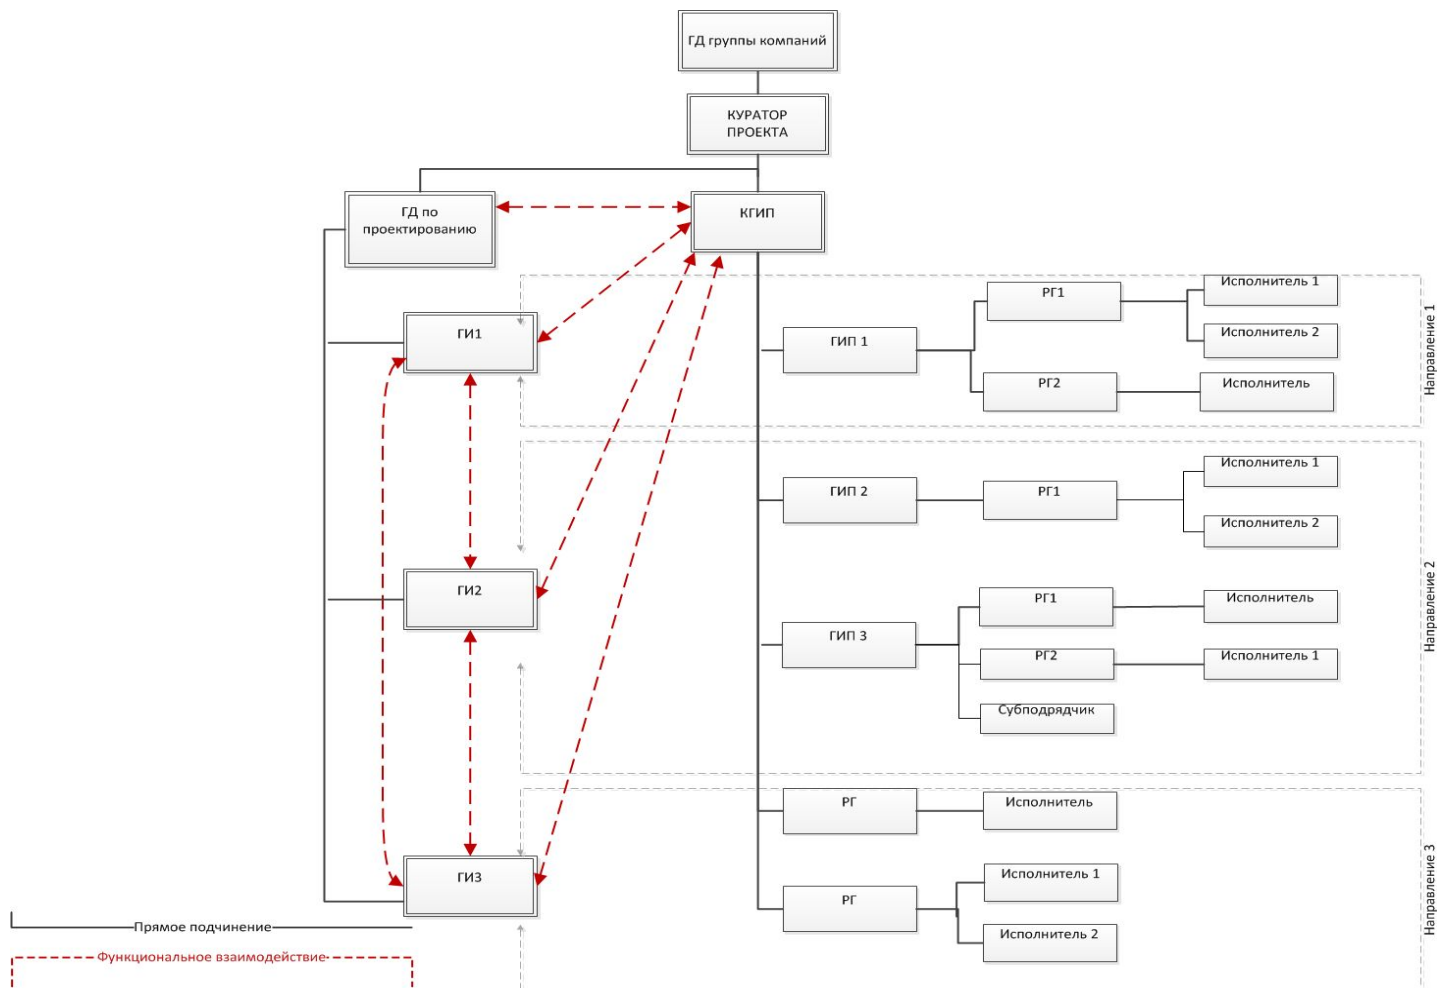

Определение конечных результатов проекта, определение структуры и графика работ

➤ Информация о проекте

Проекты · Внешние проекты · Просмотр проекта #1413 · Основная информация

Ссылка QR-код проекта

➤ План-график проекта

Проекты · Внешние проекты · Просмотр проекта #1521 · Задачи

Структура проекта

Задачи проекта

Тема	Статус	Исполнитель	Автор	Дата начала	Дата окончания
#522640 Разработать ОДР	В работе	Кудачкин К. О.	Кудачкин К. О.	19.07.2018	30.11.2018
#522643 Выполнить инженерно-топографический план М:1:500	В работе	Шуралов Н. Н.	Кудачкин К. О.	19.07.2018	26.10.2018
#523217 Закоординировать оплозни	Завершено	Савостиков А. В.	Сергеев В. Е.	23.07.2018	24.07.2018
#523219 Закоординировать оплозни на заданном участке	Завершено	Копев С. И.	Савостиков А. В.	23.07.2018	24.07.2018
#524065 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Лагулин М. В.	Сергеев В. Е.	24.07.2018	17.08.2018
#525188 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Смирнов А. А.	Лагулин М. В.	24.07.2018	26.07.2018
#525177 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Криво В. С.	Лагулин М. В.	24.07.2018	17.08.2018
#525187 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Сабитов А. Р.	Лагулин М. В.	24.07.2018	17.08.2018
#525178 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Мусин Д. А.	Лагулин М. В.	24.07.2018	10.08.2018
#525453 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Усти А. И.	Лагулин М. В.	25.07.2018	25.07.2018
#525454 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Копев С. И.	Лагулин М. В.	25.07.2018	26.07.2018
#525452 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Савостиков А. В.	Лагулин М. В.	25.07.2018	26.07.2018
#525461 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Гусев В. В.	Лагулин М. В.	31.07.2018	17.08.2018
#531118 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Петров А. В.	Лагулин М. В.	06.08.2018	17.08.2018
#529470 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Савостиков А. В.	Лагулин М. В.	06.08.2018	17.08.2018
#529474 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Копев С. И.	Лагулин М. В.	06.08.2018	17.08.2018
#529472 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Смирнов А. А.	Лагулин М. В.	06.08.2018	17.08.2018
#527011 Выполнить материалную обработку материалов	Завершено	Ноткина И. А.	Сергеев В. Е.	30.07.2018	24.08.2018
#527198 Выполнить дешифрирование объекта	Завершено	Капитолина А. А.	Гелев Н. С.	30.07.2018	06.08.2018
#527133 Отработать участок железной дороги по полевым данным	Завершено	Лазарева Е. С.	Гелев Н. С.	30.07.2018	10.08.2018
#527013 Принять в работу материалы для дешифрирования	Завершено	Поленьков М. С.	Гелев Н. С.	30.07.2018	31.07.2018
#527441 Выполнить дешифрирование объекта	Завершено	Поленьков М. С.	Гелев Н. С.	31.07.2018	10.08.2018
#529603 Оформить ИТП по материалам дешифрирования в соответствии с классификатором НТП	Завершено	Травкина Е. И.	Гелев Н. С.	06.08.2018	10.08.2018
#532461 Создать ЦММ	Завершено	Погодина Э. А.	Ноткина И. А.	13.08.2018	24.08.2018
#532460 Отработать материалы полевой заверки	Завершено	Лазарева Е. С.	Ноткина И. А.	14.08.2018	24.08.2018
#533868 Трансформировать ИТП из системы координат "МСК-50" в "Московский"	Завершено	Усти А. И.	Ноткина И. А.	17.08.2018	17.08.2018
#527264 Выполнить согласование инженерных коммуникаций	В работе	Шуралов Н. Н.	Костриков О. С.	30.07.2018	26.10.2018

Определение длительности работ, их последовательности и взаимосвязей, определение ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта.

➤ Задачи проекта

Проекты | Финансы проекта | Просмотр проекта #1521 | Задачи | Задача #522643

Создать | Поиск | Русский | Выход

ГИР. Строительство новой межконтурной линии до жилой застройки Рублево-Архангельское

#522643 (20.11.2018)

Выполнить инженерно-топографический план М1:500

Автор: Кудачкин К. О. | Исполнитель: Шурыпов Н. Н. | Создано: 19.07.2018 16:35 | Длительность: 72 дн.

Дата начала: 19.07.2018 | Дата окончания: 26.10.2018

Статус: В работе | План / Факт: Не установлено / 14.5

Описание: Предварительный материал просить выдать до 10.08.18

Параметры: Не заданы

Лента | Файлы (0) | Подзадачи (0) | Связи (0)

Поиск по номеру и теме задачи

Раскрыть все уровни

Тема	Статус	Исполнитель	Автор	Дата начала	Дата окончания	Номер (старый урле)
#523217 Закоординировать опоры	Завершено	Савослов А. В.	Савослов А. В.	15.07.2018	24.07.2018	47901
#523219 Закоординировать опоры на заданном участке	Завершено	Колов С. И.	Колов С. И.			
#523085 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Лагулин М. В.	Лагулин М. В.			
#525178 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Мурин Д. А.	Мурин Д. А.			
#525186 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Смирнов А. А.	Смирнов А. А.			
#525177 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Кравцов В. С.	Кравцов В. С.			
#525187 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Саболов А. Р.	Саболов А. Р.			
#525454 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Колов С. И.	Колов С. И.			
#525452 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Савослов А. В.	Савослов А. В.			
#525453 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Устинов А. И.	Устинов А. И.			
#525461 Выполнить съемку существующей железной дороги и путевого хозяйства	Завершено	Глебов В. В.	Глебов В. В.			

➤ Связи в задачах

ГИР. Разработка научно-проектной документации по капитальному ремонту строения 548 "Здание АТС"

#526251 (24.12.2018)

Разработать "Конструктивные и объемно-планировочные решения"

Автор: Матвицкий Е. Н. | Исполнитель: Соловьев Е. С. | Создано: 26.07.2018 16:39 | Длительность: 61 дн.

Дата начала: 18.07.2018 | Дата окончания: 10.10.2018

Статус: В работе | План / Факт: Не установлено / 32.25

Описание: Введите описание задачи

Параметры: Не заданы


Лента | Файлы (1) | Подзадачи (8) | Связи (1)

Предшественник: Добавить

Последователь: Добавить

#	Тип связи	Запаздывание	Задача	Дата начала	Дата окончания
#526346	Окончание - начало	-4	Разработать «Смета на строительство»	04.09.2018	14.12.2018

Отмена | Сохранить

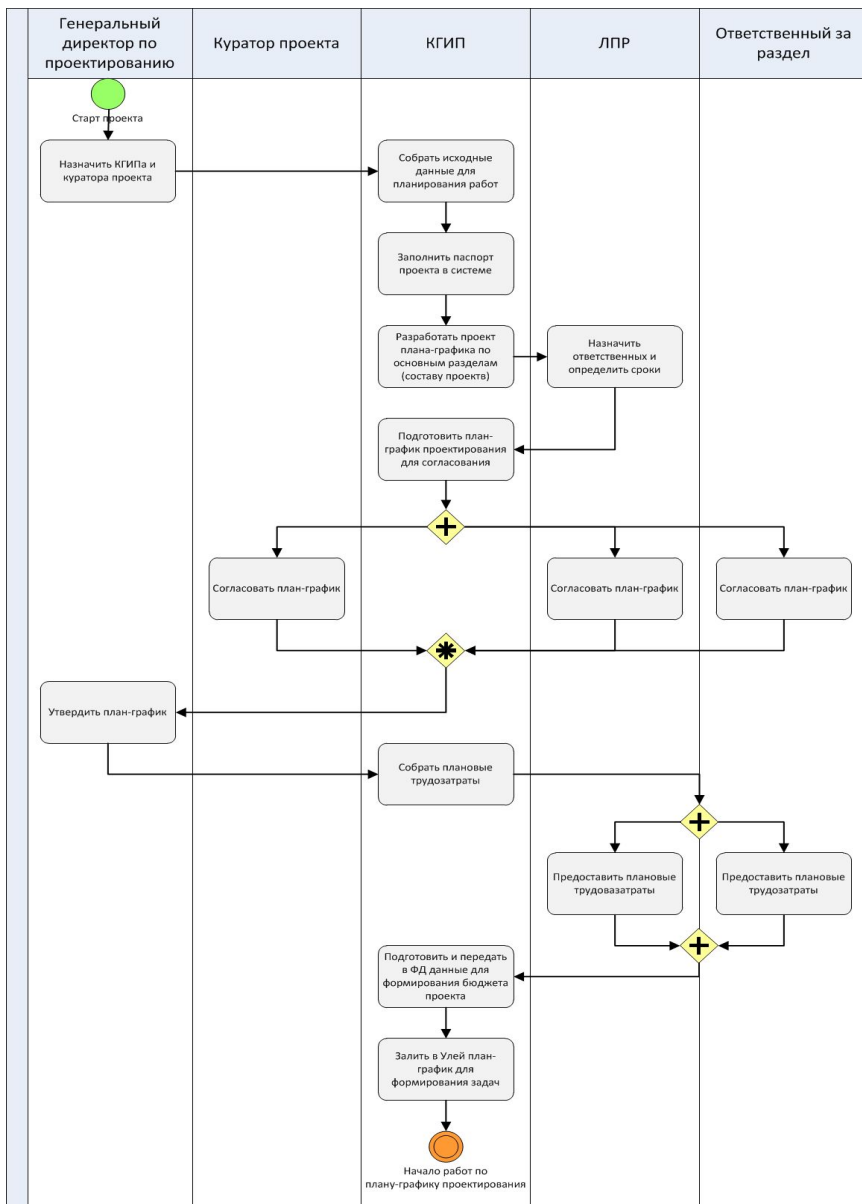

Общий процесс управления проектом (стадии инициации и планирования)

№	Название задачи	Длительно	Начало	Окончание	Названия ресурсов
1	Выполнить проектные работы по "Название объекта"				
2	Разработать раздел 1. "Пояснительная записка"				
3	Разработать том "Общая пояснительная записка"				
4	Разработать том "Исходные данные и материалы согласований"				
5	Разработать раздел 2. "Проект полосы отвода"				
6	Разработать раздел 3. "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"				
7	Разработать Том "Сводный план инженерных сетей"				
8	Разработать Том "Благоустройство и озеленение"				
9	Разработать том "Дендрология"				
10	Разработать раздел 5. "Проект организации строительства"				
11	Разработать раздел 6. "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта"				
12	Разработать том "Проект организации работ по сносу (демонтажу) элементов объекта"				
13	Разработать раздел 7. "Мероприятия по охране окружающей среды"				
14	Разработать том "Мероприятия по охране окружающей среды"				
15	Разработать раздел 8. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»				
16	Разработать том "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"				
17	Разработать раздел 9. "Смета на строительство"				
18	Разработать том "Сводный сметный расчет"				
19	Разработать том "Локальные и объектные сметные расчеты"				
20	Разработать раздел 10. "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"				
21	Разработать том "Отчет об инженерно-геодезических изысканиях"				
22	Разработать том "Отчет об инженерно-геологических изысканиях. Пояснительная записка"				
23	Разработать том "Отчет об инженерно-геологических изысканиях. Фактический материал"				
24	Разработать том "Отчет об гидрометеорологических изысканиях"				
25	Разработать том "Отчет об археологических изысканиях"				
26	Разработать том "Отчет об инженерно-экологических изысканиях"				
27	Разработать том "Инженерно-технические мероприятия ГО, мероприятия по предупреждению ЧС"				
28	Разработать раздел "Оценка влияния на существующие строения от строительства"				
29	Разработать том "Обследование зданий и сооружений подлежащих демонтажу"				
30	Получить положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"				
31	Осуществлять управление проектом				
32	Выполнять решения по протоколам совещаний				

Планирование затрат и акцептование факта затраченного времени по работам, бюджетирование, учет расходов, прогноз превышений бюджета по выполненным работам.

- Подтверждение затраченного времени руководителем подразделения и руководителем проекта.

Планирование / Подтверждение фактического времени работы

Рабочая нагрузка Журнал событий СКУД **Подтверждение фактического времени работы** Отчеты

01.11.2018 - 15.11.2018 Подтверждаю время как: Руководитель КГИП

Пользователь Подразделение 2 выбрано Проект

Задача	Дата	Час (а, ов)	Комментарий	Руководитель	КГИП
ГЕНПОДРЯДЧИК 2 участок. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (ДОЗ) ГБУ РИТУАЛ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, САВЕЛОВСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 10					
Васильева Екатерина Сергеевна					
		81.00			
	Пн, 16.11	7.00	Пили чай, ели плошки		
	Вт, 16.11	7.00	комментарий в задаче		
#555068 Тестировать импорт комментариев после чистки очереди на дев	Ср, 16.11	8.00	очень-очень-очень-очень-очень длинный комментарий, очен-очень ...	✓ Пургин Д. В.	✓ Да ✗ Нет ✕
	Чт, 16.11	8.00	Пили чай, ели плошки		
	Пт, 16.11	8.00	комментарий в задаче		
#555068 Тестировать импорт комментариев после чистки очереди на дев	Пн, 16.11	7.00	Пили чай, ели плошки	✓ Пургин Д. В.	✓ Да ✗ Нет
	Пт, 16.11	7.00	комментарий в задаче		
Васильева Римма Евгеньвна					
		81.00			
	Пн, 16.11	7.00	Пили чай, ели плошки		
	Вт, 16.11	7.00	комментарий в задаче	? Пургин Д. В.	✓ Да ✗ Нет
#555068 Тестировать импорт комментариев после чистки очереди на дев	Ср, 16.11	8.00	очень-очень-очень-очень-очень длинный комментарий, очен-очень ...		
#555068 Тестировать импорт комментариев после чистки очереди на дев	Пн, 16.11	7.00	Пили чай, ели плошки	? Пургин Д. В.	✓ Да ✗ Нет ✕
ГЕНПОДРЯДЧИК 2 участок. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (ДОЗ) ГБУ РИТУАЛ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, САВЕЛОВСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 10					
Васильева Римма Евгеньвна					
		21.00			
#555068 Тестировать импорт комментариев после чистки очереди на дев	Пн, 16.11	7.00	Пили чай, ели плошки	✗ Пургин Д. В.	✓ Да ✗ Нет ✕
	Пн, 16.11	7.00	Пили чай, ели плошки		
#555068 Тестировать импорт комментариев после чистки очереди на дев	Пт, 16.11	7.00	комментарий в задаче	? Пургин Д. В.	✓ Да ✗ Нет ✕

➤ Управление срокам, ресурсами, стоимостью

Планирование / Рабочая нагрузка

Рабочая нагрузка

Пользователь: Васильева Римма Евгеньевна

Задача	Статус	Сроки выполнения	16.11		16.11		17.11		17.11		Всего факт
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
ГЕНПОДРЯДЧИК 2 участка. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕРЕВОобрабатывающего ЗАВОДА (ДОЗ) ГБУ РИТУАЛ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, САИ	В работе	08.02.03.12.2018	8.00	7.00	8.00	7.00					14.00 (28.00)
#555068 Тестировать импорт комментариев после чистки очереди на даче	В работе	08.02.03.12.2018	-	+	+	+	-	+	-	+	14.00 (28.00)
ГЕНПОДРЯДЧИК 2 участка. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕРЕВОобрабатывающего ЗАВОДА (ДОЗ) ГБУ РИТУАЛ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, САВЕЛОВСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 10	Планы	08.02.03.12.2018	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00 (28.00)
#555068 Тестировать импорт комментариев после чистки очереди на даче	Планы	24.10.02.11.2018	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00 (28.00)
Всего			8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
Время на рабочем месте			08:42 - 18:14	08:01 - 12:20							

Контроль рабочего времени сотрудников

Планирование / Рабочая нагрузка

Рабочая нагрузка

Пользователь: Васильева Екатерина Сергеевна, Васильева Римма Евгеньевна

Задача	Статус	Сроки выполнения	16.11		16.11		16.11		16.11		17.11		Всего
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
Васильева Екатерина Сергеевна													
Всего			8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
Время на рабочем месте			08:42 - 18:14	08:01 - 12:20									
Васильева Римма Евгеньевна													
Всего			8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
Время на рабочем месте			08:42 - 18:14	08:01 - 12:20									

План/фактный анализ времени, затраченного на выполнение проекта по задачам.

➤ Управление проектной документацией.

ПИР: Выполнение научно-проектной документации ремонтно-реставрационных работ по павильону №6 "Абхазия" (бывший Химия)

» ППТ

» Проектная документация

» Исходно-разрешительная документация

» Финансовые документы

» Внутренние производственные документы

1 Предварительные сметы

Название	Версия	Автор	Добавлено в хранилище	
см ПИР_ВДНХ Пав. 6 Абхазия_предварительная (1)	1	Абрамова Марина Николаевна	19.05.2017	Добавить версию
12май 17 Смета 6	1	Абрамова Марина Николаевна	19.05.2017	Добавить версию

» Проекты производства работ

» Исполнительная документация

1 Акты

2» Переписка

2.1 Входящие

Название	Версия	Автор	Добавлено в хранилище	
Справка УГМС	1	Абрамова Марина Николаевна	19.05.2017	Добавить версию

2.2 Исходящие

2.3 Протоколы

Название	Версия	Автор	Добавлено в хранилище	
вх10900-16	1	Абрамова Марина Николаевна	19.05.2017	Добавить версию

Управление проектной документацией в рамках выполнения проекта. Электронный архив документации, процедуры согласования документов с внешними службами и подразделениями компании, совместная работа по созданию документов и новых версий документов – работа в одном информационном пространстве. Согласование финансовых документов (актов, счетов).

Управление CRM

➤ База контрагентов и контактных лиц по видам и сферам деятельности

Контрагент	Контактная информация	Вид контрагента	Сфера деятельности
Latista	📍 -		
Mathias Schneider	📍 -		
MILLAB	☎ +7 (495) 933-71-47 📍 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2, БЦ "North House"		
ООО «ДорЗапад»	✉ dorzapad@mail.ru ☎ +7 (929) 615-02-92 📍 143130, Московская область, Рузский район, п.Тучково, ул.Кирова, д.2		
ООО "Сталь Энерго"	✉ ooo_stal@bk.ru 📍 162614, Вологодская обл., г.Череповец, ул. М.Горького, д. 32 кв. 514	Поставщик	Поставщик: Оборудование, Производство материалов, Металлопрокат, Материалы для дорожно-мостового строительства
Pakon	📍 -		
PGP Engineering S.A.	✉ pgpengineering@mail.ru ☎ +7 (381) 112-62-91 Доб. 35 📍 11000 Београд, Zmaj Jovina 014/3? Republika Srbija		
PM consulting	📍 г. Москва		
PNKB	✉ pnkb@list.ru ☎ +7 (495) 730-43-51 📍 115054 г. Москва Космодамианская наб., д.52, корп.10		
RDI	📍 Москва		
Sieyuan Electric HK Internetal Limited	📍 OFFICE 3A,12/F,KAISER CENTRE,NO.18 CENTRE STREET, SAI YING PUN, HONGKONG		
Studio Perini Associati Architetto Luciano Perini	📍 38100 Trento ITALIA		
VAW Eurasian Capital	📍 No. 1 Nongzhan South RD., Chaoyang District Bank of China Tower, Garden RD, Central HK		
WILLEN ASSOCIATES ARCHITEKTEN	📍 Wilhelmstraße 40, 65183 Wiesbaden, Германия		
X5 RETAIL GROUP	📍 MO		
A-101-Девелопмент	📍 Москва		
	✉ info@natura-dd.ru.gip@natura-arch.ru		

Управление CRM

➤ Карточка контрагента

The image displays two screenshots of a CRM system interface. The left screenshot shows a contractor card for 'ООО "Сталь Энерго"'. The right screenshot shows a contact card for 'Андрей Владимирович'.

Карточка контрагента (Left Screenshot):

- ОПФ:** ООО
- Наименование контрагента:** ООО "Сталь Энерго"
- Вид контрагента:** Поставщик
- Сфера деятельности:** Производство материалов, Металлопродукт, Оборудование, Материалы для дорожно-мостового строительства
- Юридический адрес:** 162614, Вологодская обл., г. Череповец, ул. М.Горького, д. 32 кв. 514
- Фактический адрес:** Указать адрес
- Почтовый адрес:** 162614, Вологодская обл., г. Череповец, ул. М.Горького, д. 32 кв. 514
- Телефон:** Добавить номер телефона
- Email:** ooo_stal@bk.ru
- Сайт:** Введите адрес сайта
- Комментарий:** Введите комментарий
- Ответственный:** Не выбрано

Карточка контактного лица (Right Screenshot):

- ФИО:** Андрей Владимирович
- Контрагент:** Лукойл-Центрифтепродукт
- Должность:** Специалист отдела капитального строительства
- Сфера деятельности:** Не выбрано
- Рабочий телефон:** Добавить номер телефона
- Комментарий:** Введите комментарий
- Личная информация:**
 - Сделать приватной:
 - День рождения: Не выбрано
 - Мобильный телефон: Добавить номер телефона
 - Email: Andrey.Andreev@lukoil.com
 - Использовать email контрагента:
- Ответственный:** Яшина В. В.
- Активный:**
- Сохранить**

➤ Карточка контактного лица

Управление внутренней документацией:

➤ Приказы

Поиск по всем столбцам x 🔍 + Новый приказ 🔄 👤 ⚙️

Все (3093) Необходимо ознакомиться (1)

№ приказа	Дата приказа	Заголовок приказа	Организация	Проект	Статус	Действия
0786-18	11.12.2018	О назначении лица, ответственного за производство строительно-монтажных работ	ООО "Строй-Альянс"	ГЕНПОДРЯДЧИК: Перекладка дождевой канализации по объекту строительство дороги Солнцево-Бутово-Видное	Действующий	📄
0785-18	10.12.2018	О проведении инвентаризации	ООО "Строй-Альянс"	ГЕНПОДРЯДЧИК: 2 участок. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (ДОЗ) ГБУ РИТУАЛ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: г. МОСКВА, САВЕЛОВСКИЙ ПРОЕЗД, д. 10	Действующий	📄
0784-18	10.12.2018	Об отмене приказа	ООО "Строй-Альянс"	ГЕНПОДРЯДЧИК: 2 участок. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (ДОЗ) ГБУ РИТУАЛ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: г. МОСКВА, САВЕЛОВСКИЙ ПРОЕЗД, д. 10	Действующий	📄
0783-18	07.12.2018	О проведении инвентаризации	ООО "Строй-Альянс"	ГЕНПОДРЯДЧИК: 2 участок. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (ДОЗ) ГБУ РИТУАЛ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: г. МОСКВА, САВЕЛОВСКИЙ ПРОЕЗД, д. 10	Отменен	📄
0782-18	05.12.2018	О проведении инвентаризации	ООО "Строй-Альянс"	ГЕНПОДРЯДЧИК: ПС 110 кв "Шушары"	Действующий	📄
0782/1-18	06.12.2018	О проведении инвентаризации	ООО "Строй-Альянс"	ГЕНПОДРЯДЧИК: Перекладка дождевой канализации по объекту строительство дороги Солнцево-Бутово-Видное	Действующий	📄
0781-18	29.11.2018	Об отмене приказа	ООО "Строй-Альянс"	ГЕНПОДРЯДЧИК: Строительство путепровода через железную дорогу по улице Фрунзе – улице Мира в г. Мытищи МО	Действующий	📄
0780-18	27.11.2018	О введении в действие седьмой версии регламента по материально-техническому обеспечению строительного участка	ООО "ГорКапСтрой"		Действующий	📄
0779-18	26.11.2018	О назначении ответственного лица за безопасное производство земляных работ	ООО "Строй-Альянс"	ГЕНПОДРЯДЧИК: Реконструкция автомобильной дороги МКАД-Дроздово-Беседы-МКАД на участке км 0,0-км 1,1	Действующий	📄
0778-18	26.11.2018	О назначении ответственного лица за производство погрузочно-разгрузочных работ	ООО "Строй-Альянс"	ГЕНПОДРЯДЧИК: Реконструкция автомобильной дороги МКАД-Дроздово-Беседы-МКАД на участке км 0,0-км 1,1	Действующий	📄

10 1-10 / 3093 < 1 2 3 > 1 / 310

Работа с общеорганизационными приказами компании. Электронный реестр, ознакомление.

Управление внутренней документацией:

➤ Карточка приказа

О реструктуризации отдела главного энергетика

Дата приказа * 29.09.2017 № приказа 0896-17 Действующий

Организация * ООО "ГорКапСтрой"

Проект Выберите проект

Разработчик приказа Брель Ю. В.

Зарегистрировал Яшина В. В.

Название	Описание	Автор
Файл Приказ №0896-17		Яшина В. В. 29.09.2017 15:45

Отменяет действие приказов Лента

Приказ не выбран...

Скачивание приказа в pdf, возможность отмены приказа, утратившего свою силу

[Добавить приказ](#)

[Сохранить](#)

Доступ к приказу (1023) [Показать список](#)

Группы [Показать список](#)

Все сотрудники

Права доступа к приказу

Ознакомление (7) [Карточка ознакомления](#)

- Бузулукина А. И.
- Корнилова Т. С.
- Малеева О. С.
- Наumenков Э. А.
- Пронькина Т. А.
- Стародубцева Е. Н.
- Герштанская В. В.

Карточка ознакомления

Управление внутренней документацией

✓ Входящая/исходящая корреспонденция

Входящие письма									Исходящие письма		
Поиск по входящему номеру или теме письма									+ Новое входящее письмо		
Входящий №	Тип	Тема	Организация	Откуда	Адресат	Исполнитель	Проекты	Зарегистрировано			
3469-18	Информационное письмо	О планировании действий	ООО "НБК-Холдинг"	"Пожбезопасность"	Сидоренков А. С.	Кузьмина А. В.	ПИР: Выполнение рабочей документации ремонтно-реставрационных работ по павильону №5 "Физика"	10.04.2018 18:28			
3468-18	Письмо на рассмотрение/подписание	О выполнении работ по договору	ООО "Строй-Альянс"	ООО "ТД Инженерное оборудование"	Науменков Э. А.	Бузулукина А. И.	ГЕНПОДРЯДЧИК: СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ ЖД НА 19 КМ АД ММК-ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА-НАХАБИНО У ПЛ.НАХАБИНО	10.04.2018 18:21			
3467-18	Запрос на предоставление информации/документации	О направлении замечаний к ПД	ООО "ГорКапСтрой"	ПАО "Ленэнерго"	Сидоренков А. С.	Бузулукина А. И.	ПИР: Строительство ПС 220 кВ "Купчинская" с вводами 220 кВ	10.04.2018 17:45			
3466-18	Вызов представителя	О вызове на 12.04.2018 к 12:00	ООО "ГорКапСтрой"	ООО фирма "ГЕРА"	Тарасов Д. В.	Кузьмина А. В.	АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Многоуровневые транспортные развязки на пересечении 20-го км. МКАД с Бесединским шоссе	10.04.2018 17:38			
3465-18	Сопроводительное письмо	Об актах взаимных расчетов	ООО "СтройИнвест"	ПАО "МОЗСК"	Облыгин А. А.	Бузулукина А. И.	Помощник	10.04.2018 17:34			
3464-18	Протокол							10.04.2018 17:30			
3463-18	Вызов представителя	О вызове ответственного представителя	ООО "НБК-Холдинг"	ООО «ГорКапСтрой»	Сидоренков А. С.	Кузьмина А. В.	АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Путепровод через железнодорожные пути в районе станции Реутов	10.04.2018 17:12			
3462-18	Запрос на предоставление информации/документации	О разработке документации	ООО "ГорКапСтрой"	Стройтрансгаз	Тарасов Д. В.	Кузьмина А. В.	ПИР: РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: Строительство транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области	10.04.2018 16:57			
3461-18	Протокол	О направлении протокола	ООО "ГорКапСтрой"	Министерство имущественных отношений Московской области	Тарасов Д. В.	Михайлова М. А.	ДТП: Проекты документов территориального планирования муниципальных образований МО	10.04.2018 16:51			
3460-18	Вызов представителя	О вызове представителей	ООО "ГорКапСтрой"	ООО "ГорКапСтрой"	Русенков А. В.	Бузулукина А. И.	ГЕНПОДРЯДЧИК: Строительство путепровода через железнодорожные пути на 16 км Горьковского направления Московской железной дороги (в районе станции Реутов) ЗАКАЗЧИК: СК «Строительство путепровода через железнодорожные пути на 16 км Горьковского направления Московской железной дороги (в районе станции Реутов)»	10.04.2018 16:47			

Управление внутренней документацией:



✓ Карточка документа

Корреспонденция / Входящие письма / Входящее письмо #3468-18









Поиск x Русский ↕ Выход

Основная информация Лента

О выполнении работ по договору

Тип	Письмо на рассмотрение/подписание		Исходящий №	233/04	от	Зарегистрировано
Входящий №	3468-18	Ответ на	Не выбрано		Вид доставки	Электронная почта
Организация	ООО "Строй-Альянс"		Оригинал	<input type="checkbox"/>		
Адресат	 Наumenков Э. А.	Откуда	ООО "ТД Инженерное оборудование"			
Исполнитель	 Бузулукина А. И.	Отправитель	Не выбрано			
Проект	ГЕНПОДРЯДЧИК: СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ Ж/Д НА 19 КМ А/Д ММК-ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА-НАХАБИНО У ПЛ. НАХАБИНО		Выбор проекта			


Описание

Файл	<input type="checkbox"/> счет 217-ПНР	Татарников А. И.	10.04.2018 18:26	 
	<input type="checkbox"/> Акт о проведении ПНР ЛОС-1	Татарников А. И.	10.04.2018 18:26	 
	<input type="checkbox"/> вх3468-18	Татарников А. И.	10.04.2018 18:26	 
	<input type="checkbox"/> АКТ приемки-сдачи ПНР ЛОС-1	Татарников А. И.	10.04.2018 18:26	 

Задача Новая задача


Проект	Исполнитель	Номер	Статус
ГЕНПОДРЯДЧИК: СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ Ж/Д НА 19 КМ А/Д ММК-ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА-НАХАБИНО У ПЛ. НАХАБИНО	Авакян Ю. И.	485427	Закрыта

Формирование задачи/задач на исполнителя/исполнителей

Зарегистрировал  Татарников А. И. 10.04.2018 18:21


Отмена Сохранить

✓ Исходящая корреспонденция



Исходящий №	Тип	Тема	Организация	Отправлено	Адресаты	Получатели	Проекты	Зарегистрировано
6267-18	Ответ на запрос/письмо	Об ответе на запрос	ООО "Строй-Альянс"	18.07.2018	Прокуратура г. Москвы		ГЕНПОДРЯДЧИК: Строительство путепровода через железнодорожные пути на 16 км Горьковского направления Московской железной дороги (в районе станции Реутов)	18.07.2018 16:38
6266-18	Запрос на предоставление информации/документации	О направлении договора	ООО "ГорКапСтрой"	18.07.2018	Институт археологии "РАН"		ПИР: 1 Этап. От ул. Власова до путепровода через жд	18.07.2018 16:07
6265-18	Запрос на предоставление информации/документации	О закрытии второго квартала	ООО "Строй-Альянс"	18.07.2018	ООО "АСКТ" ООО "Кипарис МСК" ООО "ТехМаШСервис" ООО "ТОСС ИТ" ООО "ВэйСтрой" ООО "ВираСтрой" ООО «ГК «СОМ»" ООО "БРАНД-СЕРВИС" ООО "СтройМакс" ООО Примула ООО "Факторм ТехноЛабис" ООО «Архитектурно-ландшафтный центр» ООО «СРФ «ГРАНИТ» ООО "Строительно-Производственная Компания НОВАТОР" ООО "ВитраСтрой" ООО «Стальстроймонтаж» ООО "АЛ Инжиниринг"	Не указан: ВДНХ (администрирование)	18.07.2018 15:57	

Карточка документа – возможность отправлять в адрес нескольких адресатов одновременно и фиксировать информацию о получении адресатом письма.



Основная информация | Лента

О закрытии второго квартала

Тип * Запрос на предоставление информации/документации

Исходящий № * 6265-18 Ответ на Не выбрано

Организация * ООО "Строй-Альянс"

Проект * Не указан: ВДНХ (администрирование)

Отправитель * Якушина Елена Анатольевна

Отправлено * 18.07.2018

Вид доставки * Электронная почта

Куда * Добавить	Адресат	Получатель	Отметка о получении
ООО "АСКТ"	Не выбрано	Не выбрано	П-04/07/18 от 18.07.2018 17:22
Адресат не предоставил файл с отметкой о получении <input checked="" type="checkbox"/>			
ООО "Кипарис МСК"	Не выбрано	Не выбрано	165 от 18.07.2018 17:15
Адресат не предоставил файл с отметкой о получении <input checked="" type="checkbox"/>			
ООО "ТехМаШСервис"	Не выбрано	Не выбрано	Входящий № от Не выбрано
ООО"ТОСС ИТ"	Не выбрано	Не выбрано	Входящий № от Не выбрано
ООО "ВэйСтрой"	Не выбрано	Не выбрано	Входящий № от Не выбрано
ООО "ВираСтрой"	Не выбрано	Не выбрано	Входящий № от Не выбрано

Зарегистрировал **Рогозина К. П.** 18.07.2018 15:57

Управление оргструктурой компании

The image displays a web-based management system for company organization. On the left, a dark sidebar contains navigation options: Рабочий стол, Проекты, Сервисы, Социализация, Компания, Структура компании, Взаимодействие с контрагентами, Корпоративность, Прислзы, Генподряд, Статистика учета рабочего времени, and Администрирование. The main area is divided into two panels. The top panel, titled 'Структура компании', shows a tree view of departments and positions, including 'Финансовый департамент' and 'Департамент корпоративной безопасности'. The bottom panel, titled 'Сотрудник: Сотрудник #1212', shows the profile of 'Тарасова Кристина Владимировна'. It includes a photo, a QR code, and a 'Создать' button. The profile details are as follows:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Должность	Старший криэйтор/кул
Подразделение	Курьерский отдел
Руководитель	Кайгородов Евгений Игоревич
Организация	ООО "ТорикСтрой"
ЦФО	Общее
День рождения	8 апреля
Дата приема на работу	22 сентября 2014 г.

Below the profile, there is a section for 'КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ' with fields for: Рабочий телефон (+7 (495) 862-84-03), Дополнительный (345), Мобильный телефон (+7 (929) 900-14-39), Телефон для email (не указан), Email (k.tarasova@torikstroy.ru), and Город (Москва).

Annotations in the image include: 'QR код сотрудника в системе, формируется автоматически и для всех сотрудников компании' with an arrow pointing to the QR code; and 'Подразделение и непосредственный руководитель' with an arrow pointing to the 'Кайгородов Евгений Игоревич' entry in the profile details.

Формирование оргструктуры компании как вручную в системе, так и интеграция с 1С ЗУП. Автоматическое создание пользователей после проведения приема на работу в системе ЗУП, с формированием прав доступа к проектам и модулям.

Управление совещаниями

➤ Повестки совещаний

Совещания / Повестки совещаний

Поиск по всем столбцам

Номер	Дата	Время проведения	Тема	Организация	Статус	Тип совещания	Секретарь совещания	Протокол совещания
15	07.06.2018	с 09:30 по 10:00	Социальный Вал, разработка конструктивных решений	ООО НПП "Строительство"	Разовая участником совещания	Внешнее	Костроков О. С.	+ Новый протокол
16	09.06.2018	с 11:00 по 12:00	Организационное совещание по объекту: пав №35 "Гладобаб"	ООО "НБК-Холдинг"	Разовая участником совещания	Внешнее	Абрамова М. Н.	Черновики
14	06.06.2018	с 11:00 по 12:00	Общие вопросы по проекту Реконструкция автомобильной дороги М-8 Холмозоры-Королево	ООО "ТорКапСтрой"	Разовая участником совещания	Внутреннее	Семерич Л. А.	7
12	05.06.2018	с 13:00 по 15:00	Совещание с подразделениями организациями по павильонам №1 "Центральная" и №2 "Фазанка"	ООО "Строй-Альянс"	Проект	Внешнее	Мельникова О. С.	
13	05.06.2018	с 11:00 по 12:00	О проектировании МФК ЗЕНИТ РД	ООО "НБК-Холдинг"	Разовая участником совещания	Внутреннее	Жолобенко Д. Ю.	6
Черновики	06.06.2018	с 10:00 по 11:00	Государственное обоснование по объекту и решение внутренних вопросов.	ООО НПП "Строительство"	Проект	Внешнее	Бречко М. А.	
9	18.05.2018	с 16:00 по 17:00	Обучение функционалу повесток и протоколов в новом улье	ООО "ТорКапСтрой"	Разовая участником совещания	Внутреннее	Харламова Е. В.	+ Новый протокол
10	18.05.2018	с 15:00 по 16:00	Обучение модуль совещания	ООО "ТорКапСтрой"	Проект	Внутреннее	Малева О. С.	
11	28.05.2018	с 10:00 по 11:00	тест					
17	08.06.2018	с 14:00 по 15:00	Еженедельное совещание по ДОКУМЕНТАЦИИ					

10 • 1-10 / 444

➤ Протоколы совещаний

Совещания / Протоколы совещаний

Поиск по всем столбцам

Номер	Дата	Время проведения	Тема	Организация	Статус	Тип совещания	Секретарь совещания	Повестка совещания
13	08.06.2018	с 17:00 по 18:00	Производственное совещание о ходе реализации проектов ПАО "Ленэнерго"	ООО "ТорКапСтрой"	Разовая участником совещания	Внешнее	Слесаренко А. В.	Без повестки
12	08.06.2018	с 14:00 по 15:00	Еженедельное совещание РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА РАНХ И ГС МФК "ЗЕНИТ"	ООО "ТорКапСтрой"	Проект	Внутреннее	Котельников Б. М.	17
11	05.06.2018	с 14:00 по 15:00	О выполнении работ по техническому обследованию НПП Строительство	ООО НПП "Строительство"	Все решения исполнены	Внешнее	Костроков О. С.	Без повестки
10	05.06.2018	с 15:00 по 15:30	О выполнении инженерно-геодезических изысканий НПП Строительство	ООО НПП "Строительство"	Разовая участником совещания	Внешнее	Костроков О. С.	Без повестки
9	05.06.2018	с 15:30 по 16:10	О инженерно-изыскательских работах (ИГИ, ИЗИ, ИГМИ) НПП Строительство	ООО НПП "Строительство"	Разовая участником совещания	Внешнее	Костроков О. С.	Без повестки
8	04.06.2018	с 16:00 по 18:00	Производственное совещание по вопросу реализации проектов ПАО "Ленэнерго"	ООО "ТорКапСтрой"	Разовая участником совещания	Внешнее	Слесаренко А. В.	Без повестки
7	06.06.2018	с 11:00 по 12:00	Общие вопросы по проекту Реконструкция автомобильной дороги М-8 Холмозоры-Королево	ООО "ТорКапСтрой"	Все решения исполнены	Внутреннее	Семерич Л. А.	14
6	05.06.2018	с 11:00 по 12:00	О проектировании МФК ЗЕНИТ РД	ООО "НБК-Холдинг"	Разовая участником совещания	Внутреннее	Жолобенко Д. Ю.	13
5	05.06.2018	с 14:00 по 15:00	Совещание с генподрядчиками по выполнению работ на объекте ДОЗ ГБУ "Ритуал"	ООО "ТорКапСтрой"	На утверждении	Внешнее	Данилова А. С.	Без повестки
3	04.06.2018	с 09:00 по 12:00	Тема: Совещание по объектам по направлению "Здания и сооружения"	ООО "ТорКапСтрой"	Разовая участником совещания	Внутреннее	Голубова О.	Без повестки

Преимущества автоматизации проектной деятельности в программе «Матрица»

- **Гибкое управление качеством, сроком и бюджетом проектов**
Автоматизация взаимодействия бизнес-департаментов компании с помощью сквозных бизнес-процессов.
- **Надежность и быстрота проектной работы**
Готовые шаблоны и автоматическая проверка выполнения задач проекта.
- **Мгновенный мониторинг результата**
Прозрачная картина проекта для оперативной реакции на инциденты.
- **Удобная среда управления проектом**
Набор инструментов для контроля актуального положения дел по проекту. Управление рисками проекта.
- **Организация бизнес-процессов проектного офиса**
Стабильное качество проектной работы при снижении издержек на выполнение типовых операций.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
