

Разработка ИС для администрации ШКОЛЫ


Федотов Ф.Е.

Содержание

- 1.) Базовый календарь
- 2.) Виды работ
- 3.) График работ
- 4.) Зависимость работ
- 5.) Таблица ресурсов с назначениями

1.) Базовый календарь

- Пятидневная рабочая неделя, восьми-часовой рабочий день с 8 до 17:00 с перерывом на обед с 12 до 13
- Время проекта с 12.02.16 до 04.03.16 т.е. 17, 5 дней.

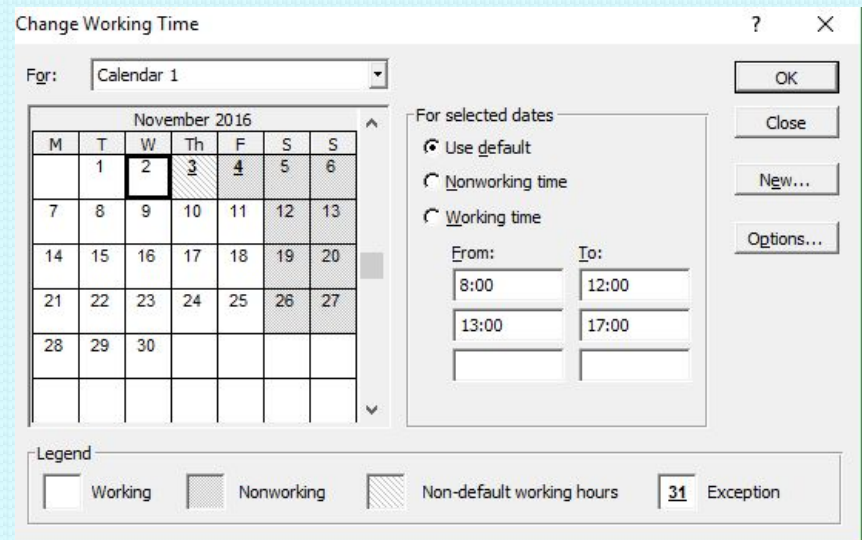

2.) Виды работ

		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		Начало работы	0 days	Fri 12.02.16	Fri 12.02.16		
2	✓	Исследование	3 days	Fri 12.02.16	Tue 16.02.16		
3	✓	Автоматизация данных	2 days	Fri 12.02.16	Mon 15.02.16	2	Менеджер
4	✓	Изучение стандартов	3 days	Mon 15.02.16	Wed 17.02.16	3	Менеджер
5	✓	Разработка ИС	7,88 days	Wed 17.02.16	Fri 26.02.16		
6	✓	Руководство проектом	6,88 days	Thu 18.02.16	Fri 26.02.16	5	Менеджер
7	✓	Разработка дизайна	5,88 days	Wed 17.02.16	Wed 24.02.16	6	Дизайнер
8	✓	Верстка ИС	4 days	Tue 23.02.16	Fri 26.02.16	7	Верстальщик
9	✓	Создание баз данных	2 days	Wed 17.02.16	Thu 18.02.16	8	Программист
10	✓	Программирование ИС	7,75 days	Wed 17.02.16	Fri 26.02.16	9	Программист
11	✓	Тестирование ИС	2 days	Fri 26.02.16	Mon 29.02.16	10	Тестировщик
12	✓	Документация	4 days	Mon 29.02.16	Thu 03.03.16		
13	✓	Руководство над докуме	5 days	Mon 29.02.16	Fri 04.03.16	12	Менеджер
14	✓	Написание инструкций	3 days	Mon 29.02.16	Wed 02.03.16	13	Секретарь
15	✓	Написание документации	3 days	Wed 02.03.16	Fri 04.03.16	14	Секретарь
16		Конец проекта	0 days	Fri 04.03.16	Fri 04.03.16		



Calendar



Gantt
Chart



PERT
Chart




Task
Usage




Tracking
Chart

3.) График работ

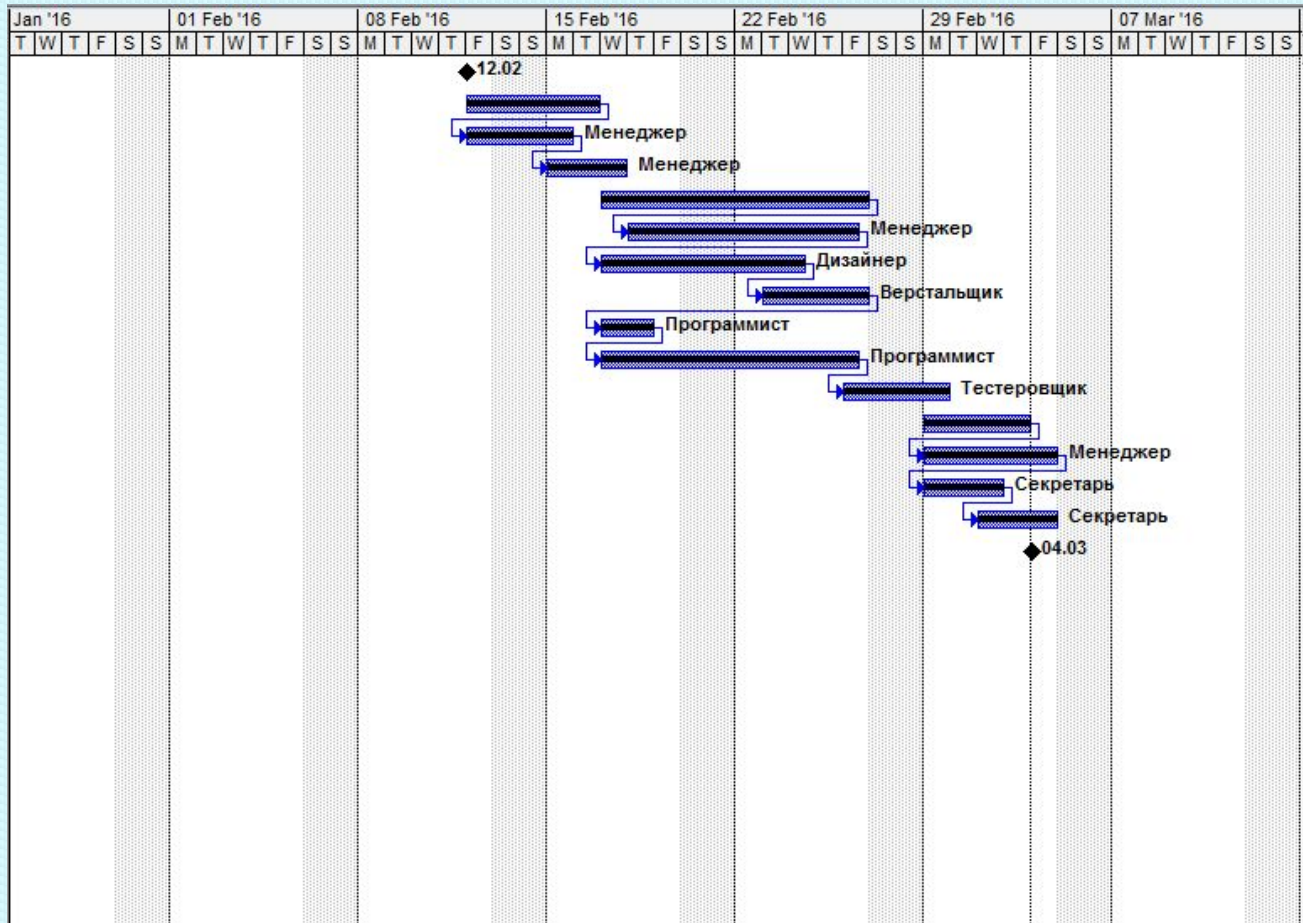

4.) Зависимость работ

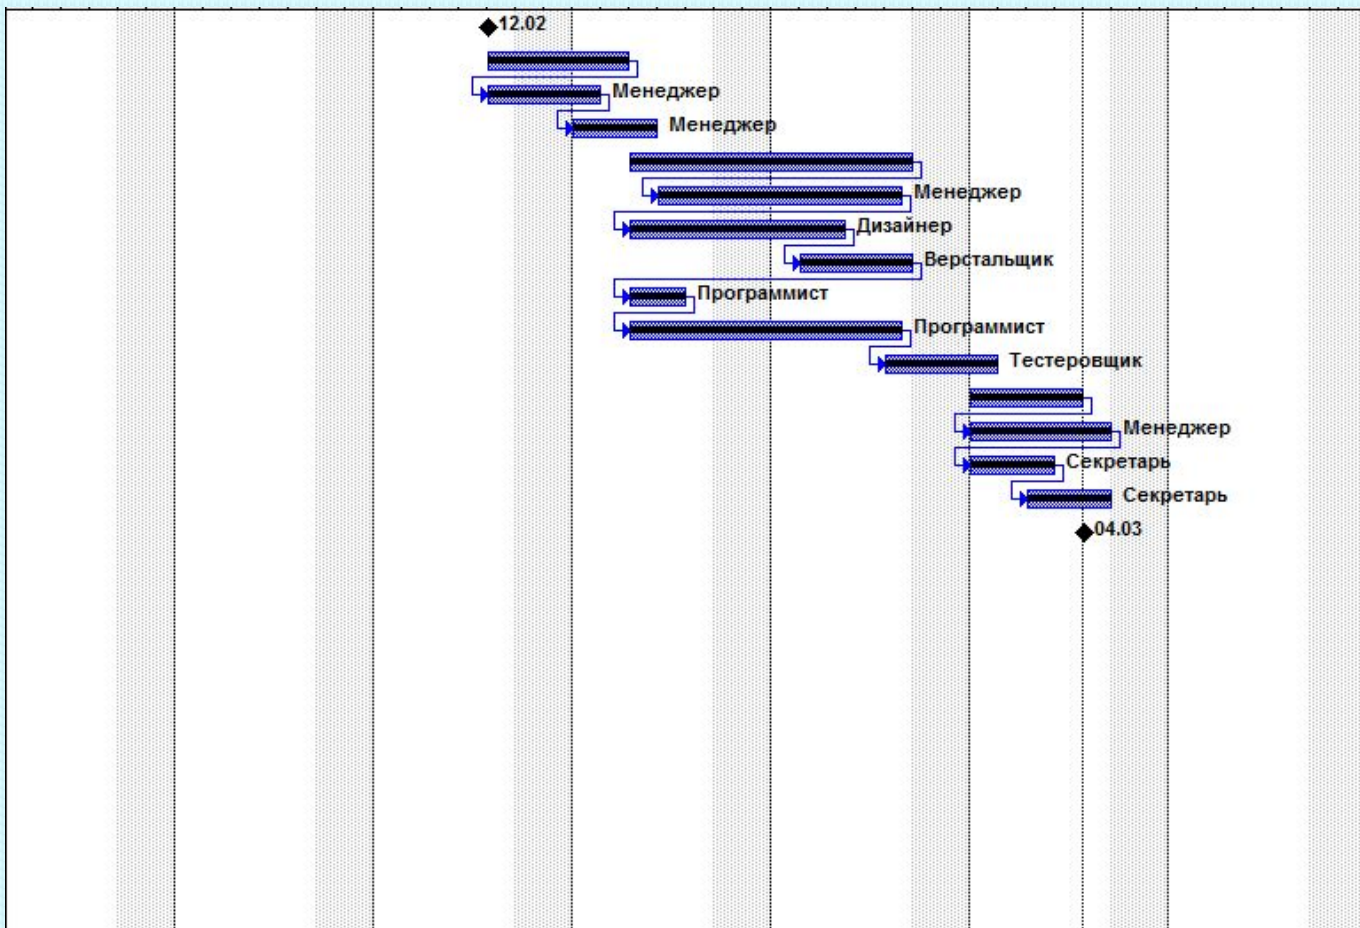

5.) Таблица ресурсов с назначениями

	Название	Работа	Продолжительность	Оконч	Стоимость
1	Начало работы	0 часов	0 дней	12.02.16	12.01.2016 0 руб.
2	(+) Исследование пре	32 часов	3,5 дней	12.02.16	17.02.2016 11200 руб.
3	Автоматизация проект	16 часов	2 дней	12.02.16	16.02.2016 5600 руб.
	<i>Менеджер</i>	16 часов	2 дней	12.02.16	16.02.2016 5600 руб.
4	Изучить стандарты	16 часов	2 дней	15.02.16	17.02.2016 5600 руб.
	<i>Менеджер</i>	16 часов	2 дней	15.02.16	17.02.2016 5600 руб.
5	(+) Разработка ИС	368 часов	9,45 дней	17.02.16	29.02.2016 82640 руб.
6	Руководство проектом	56 часов	7 дней	17.02.16	26.02.2016 19600 руб.
	<i>Менеджер</i>	56 часов	7 дней	17.02.16	26.02.2016 19600 руб.
7	Разработка дизайна	48 часов	6 дней	17.02.16	25.02.2016 12000 руб.
	<i>Дизайнер</i>	48 часов	6 дней	17.02.16	25.02.2016 12000 руб.
8	Верстка ИС	24 часов	3 дней	23.02.16	26.02.2016 4080 руб.
	<i>Верстальщик</i>	24 часов	3 дней	23.02.16	26.02.2016 4080 руб.
9	Создание баз данных	8 часов	1 день	17.02.16	18.02.2016 1600 руб.
	<i>Программист</i>	8 часов	1 день	17.02.16	18.02.2016 1600 руб.
10	Программирование ИС	210 часов	7 дней	17.02.16	26.02.2016 44800 руб.
	<i>Программист</i>	210 часов	7 дней	17.02.16	26.02.2016 44800 руб.
11	Тестирование ИС	8 часов	1 день	26.02.16	29.02.2016 560 руб.
	<i>Тестирующий</i>	8 часов	1 день	26.02.16	29.02.2016 560 руб.
12	(+) Документация	60 часов	4,5 дней	29.02.16	04.03.2016 16320 руб.
13	Руководство над докум	28 часов	4 дней	29.02.16	04.03.2016 11200 руб.
	<i>Менеджер</i>	28 часов	4 дней	29.02.16	04.03.2016 11200 руб.
14	Написание инструкций	16 часов	2 дней	29.02.16	02.03.2016 2560 руб.
	<i>Секретарь</i>	16 часов	2 дней	29.02.16	02.03.2016 2560 руб.
15	Написание документа	16 часов	2 дней	02.03.16	04.03.2016 2560 руб.
	<i>Секретарь</i>	16 часов	2 дней	02.03.16	04.03.2016 2560 руб.
16	Конец проекта	0 часов	0 дней	04.03.16	04.03.2016 0 руб.
