

# Разработка календарного плана в MS Project 2007-2010

# Календари в Microsoft Project 2010

- **календарь проекта** определяет рабочее время по умолчанию для всего проекта (для всех ресурсов и задач проекта);
- **календари ресурсов**
- **календари задач**

# Планирование задач

В MS Project вся работа, которую необходимо выполнить для достижения целей проекта разбивается на задачи. Разбиение работы в проекте образует структуру декомпозиции работ (СДР, Work Breakdown Structure (WBS)).

# Виды задач

**Задача.** Отдельная задача представляет собой шаг для достижения конечной или промежуточной цели проекта. Она представляет реальную работу, которая будет выполнена в Вашем проекте. Задача не должна быть слишком большой, иначе Вы не сможете эффективно отслеживать ее выполнение



# Виды задач

**Фаза (или суммарная задача).**

Фазы состоят из группы связанных задач и более мелких фаз.



# Виды задач

**Веха.** Опорная точка, отмечающая важное событие в проекте и используемая для контроля хода выполнения проекта.

Любая задача с нулевой длительностью автоматически отображается как веха.

Фактически, вехи – это задачи, которые не требуют работы.



# Виды задач

**Повторяющаяся задача.** Если задача регулярно повторяется в течение всего проекта или фазы (например, утренние собрания), указывать выполнение каждого повтора задачи довольно неудобно. MS Project позволяет вводить информацию о повторяющихся задачах только один раз, все повторы задачи автоматически добавляются в план проекта.



# Режимы планирования

- Вручную
- Автоматический

При режиме «Автоматический»,  
определение длительности:

Длительность = Трудозатраты/Единицы



# Настройки программы перед ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS 2010

1. Название проекта: Меню - > Файл - > Свойства
2. Настройка шкалы времени: правой кнопкой мыши (ПКМ) по объекту Шкала времени - > Шкала времени
3. Настройка прочих параметров: Сервис - > Параметры... - > Планирование - > Показывать единицы назначений в виде – числовых значений
4. Параметры планирования этого проекта - > Трудозатраты вводятся в - Днях
5. Параметры планирования этого проекта - > Новые задачи имеют фиксированный объем (галочка)
6. Установка даты начала проекта: Меню - > Файл - > Сведения - > Сведения о проекте

# Настройки программы перед использованием

The image shows the Microsoft Project software interface. The title bar reads "Проект1 - Microsoft Project". The ribbon includes "Файл", "Задача", "Ресурс", "Проект", "Вид", and "Инструменты диаграммы Ганта". The "Проект" tab is active, showing options like "Сведения о проекте", "Настраиваемые поля", "Связи между проектами", "Свойства", "Изменить рабочее время", "Расчет проекта", "Задать базовый план", "Переместить проект", "Дата отчета о состоянии: 24.11.15", "Обновить проект", "Синхронизировать с защищенными фактическими данными", "Наглядные отчеты", "Отчеты", "Сравнить проекты", and "Орфография".

A tooltip for "Сведения о проекте" is displayed, circled in red. The tooltip text reads: "Открытие диалогового окна 'Сведения о проекте' для обновления различных элементов проекта, таких как дата начала и дата отчета о состоянии."


The main workspace shows a Gantt chart grid with columns for "Длительно", "Начало", "Окончание", "Предшественники", and "Названия ресурсов". The right side of the grid shows a calendar view for "Декабрь" and "Январь" 2016.

The taskbar at the bottom shows the Start button, "Новые задачи: Планирование вручную", and various application icons. The system tray shows the time "16:43" and date "24.11.2015".

# Настройки программы перед использованием

The image shows the Microsoft Project software interface. The ribbon is set to "Инструменты диаграммы Ганта" (Gantt Chart Tools) with the "Формат" (Format) tab selected. The ribbon contains various options for formatting Gantt charts, including "Критические задачи" (Critical tasks), "Временной резерв" (Time reserve), "Задачи с задержкой" (Tasks with delay), "Стили отрезков" (Task styles), "Стиль диаграммы Ганта" (Gantt chart style), "Номер в структуре" (Number in structure), "Суммарная задача проекта" (Summary task of project), "Суммарные задачи" (Summary tasks), and "Показать или скрыть" (Show or hide). A red circle highlights a context menu that appears over the Gantt chart area. The menu items are: "Шкала времени..." (Time scale...), "Масштаб..." (Scale...), "Изменить рабочее время..." (Change working time...), and "Показать или скрыть стили отрезков" (Show or hide task styles). The Gantt chart area shows a grid with columns for days of the week and months (January 2016). The task list on the left is empty.

# Настройки программы перед использованием

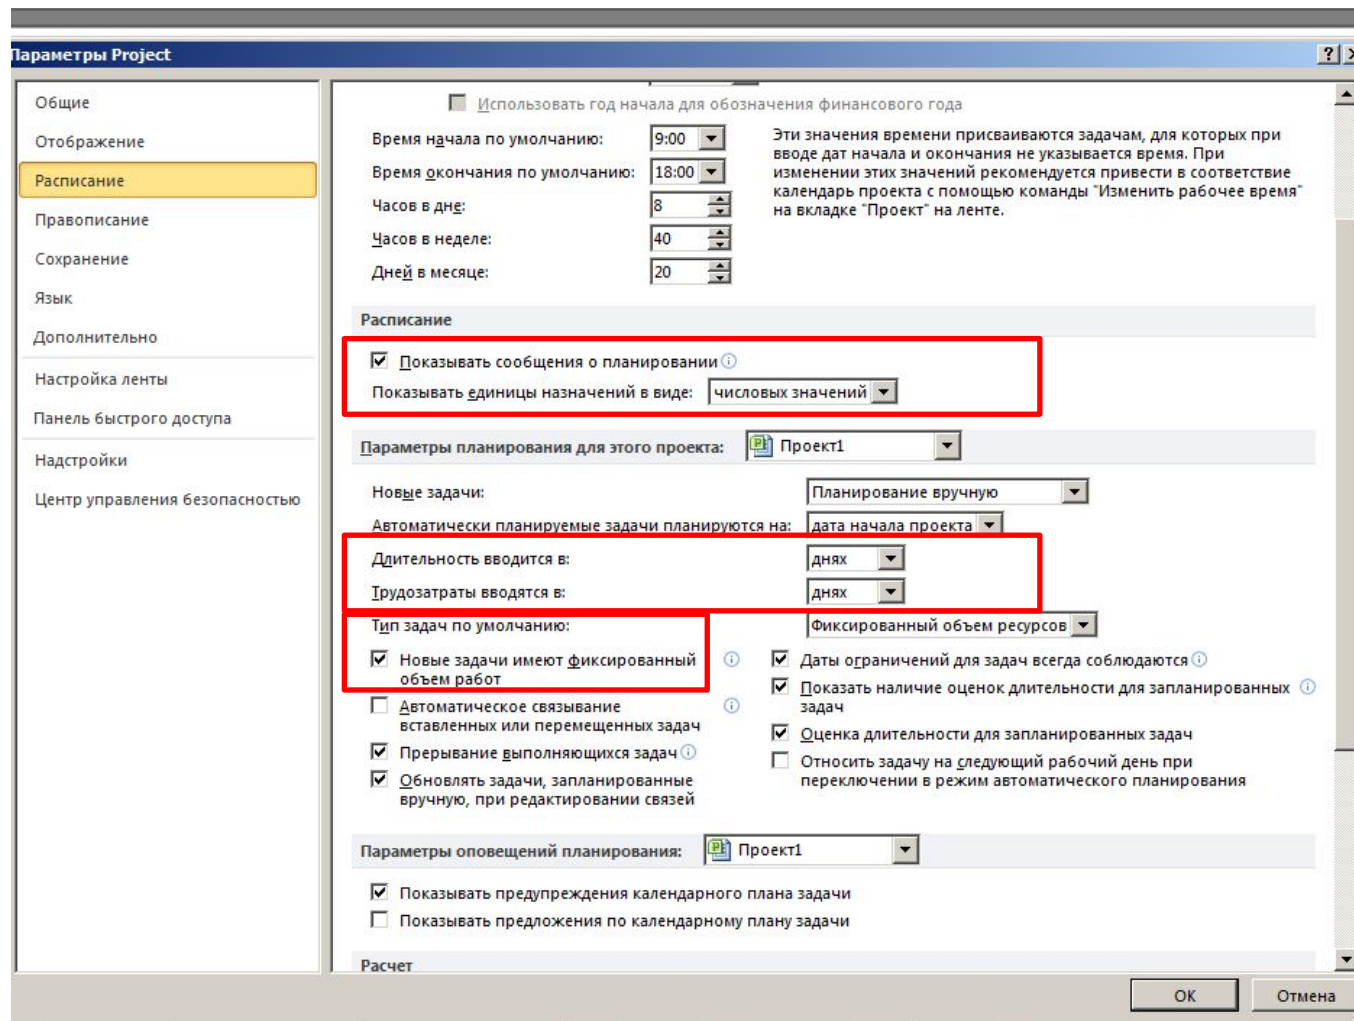

# Настройки программы перед ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS 2007

1. Название проекта: Меню - > Файл - > Свойства - > Сведения о проекте
2. Настройка шкалы времени: правой кнопкой мыши (ПКМ) по объекту Шкала времени - > Шкала времени
3. Настройка прочих параметров: Файл - > Параметры - > Расписание - > Показывать единицы назначений в виде – числовых значений
4. Параметры планирования этого проекта - > Трудозатраты вводятся в - Днях
5. Параметры планирования этого проекта - > Новые задачи имеют фиксированный объем
6. Установка даты начала проекта: Меню - > Файл - > Сведения - > Сведения о проекте

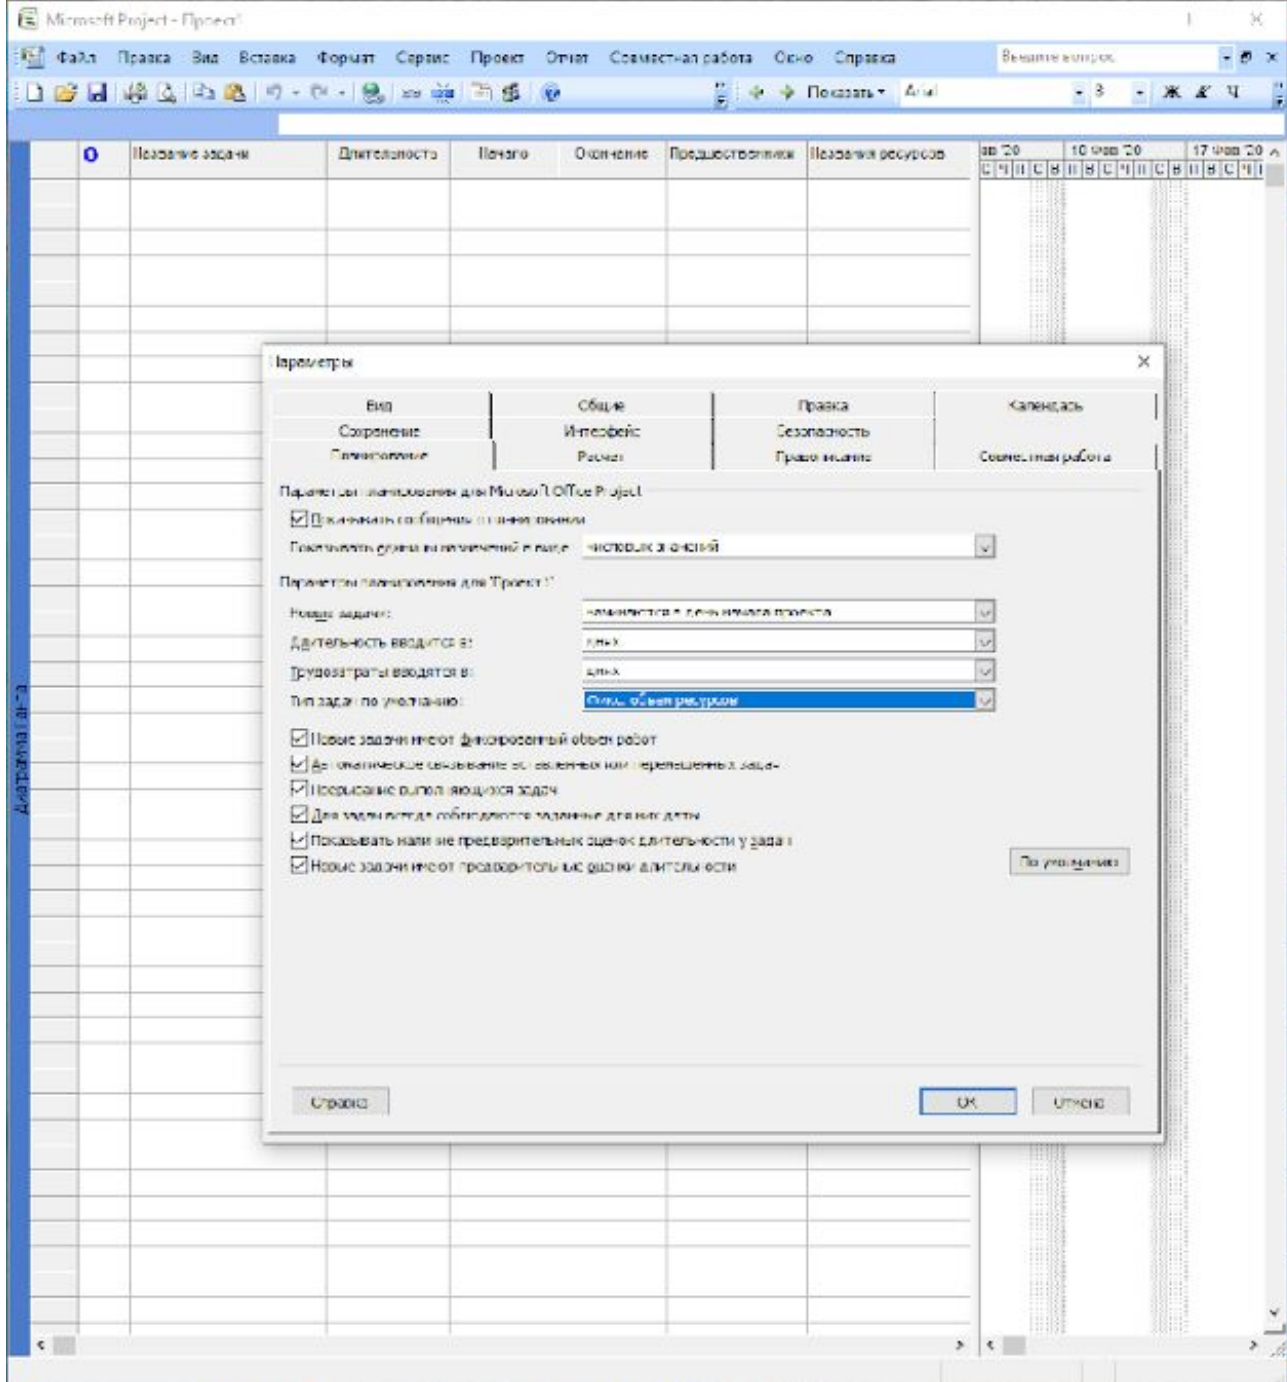


Диаграмма Ганта

Параметры

Вид | Общие | Права | Календарь  
 Сохранение | Интерфейс | Безопасность | Совместная работа  
 Служебные | Разное | Право вкл/выкл

Параметры параметров для Microsoft Office Project

Включить служебные панели меню

Группировать кнопки в меню и панели:

Параметры параметров для Project

Имя задачи:

Длительность вводится в:

Трудозатраты вводится в:

Тип задачи по умолчанию:

Новые задачи имеют декларированный объем работ

Для именованных серверов использовать именованные или переносимые задачи

Исчислять выходы являющихся задачами

Для мелких и средних серверов использовать задачи для малых данных

Показывать или не показывать предварительных оценок длительности у задачи

Новые задачи имеют права администратора задачи, если они есть

# Рабочие области программы

Дополнительные свойства объекта

Контекстное меню в виде «Ленты»

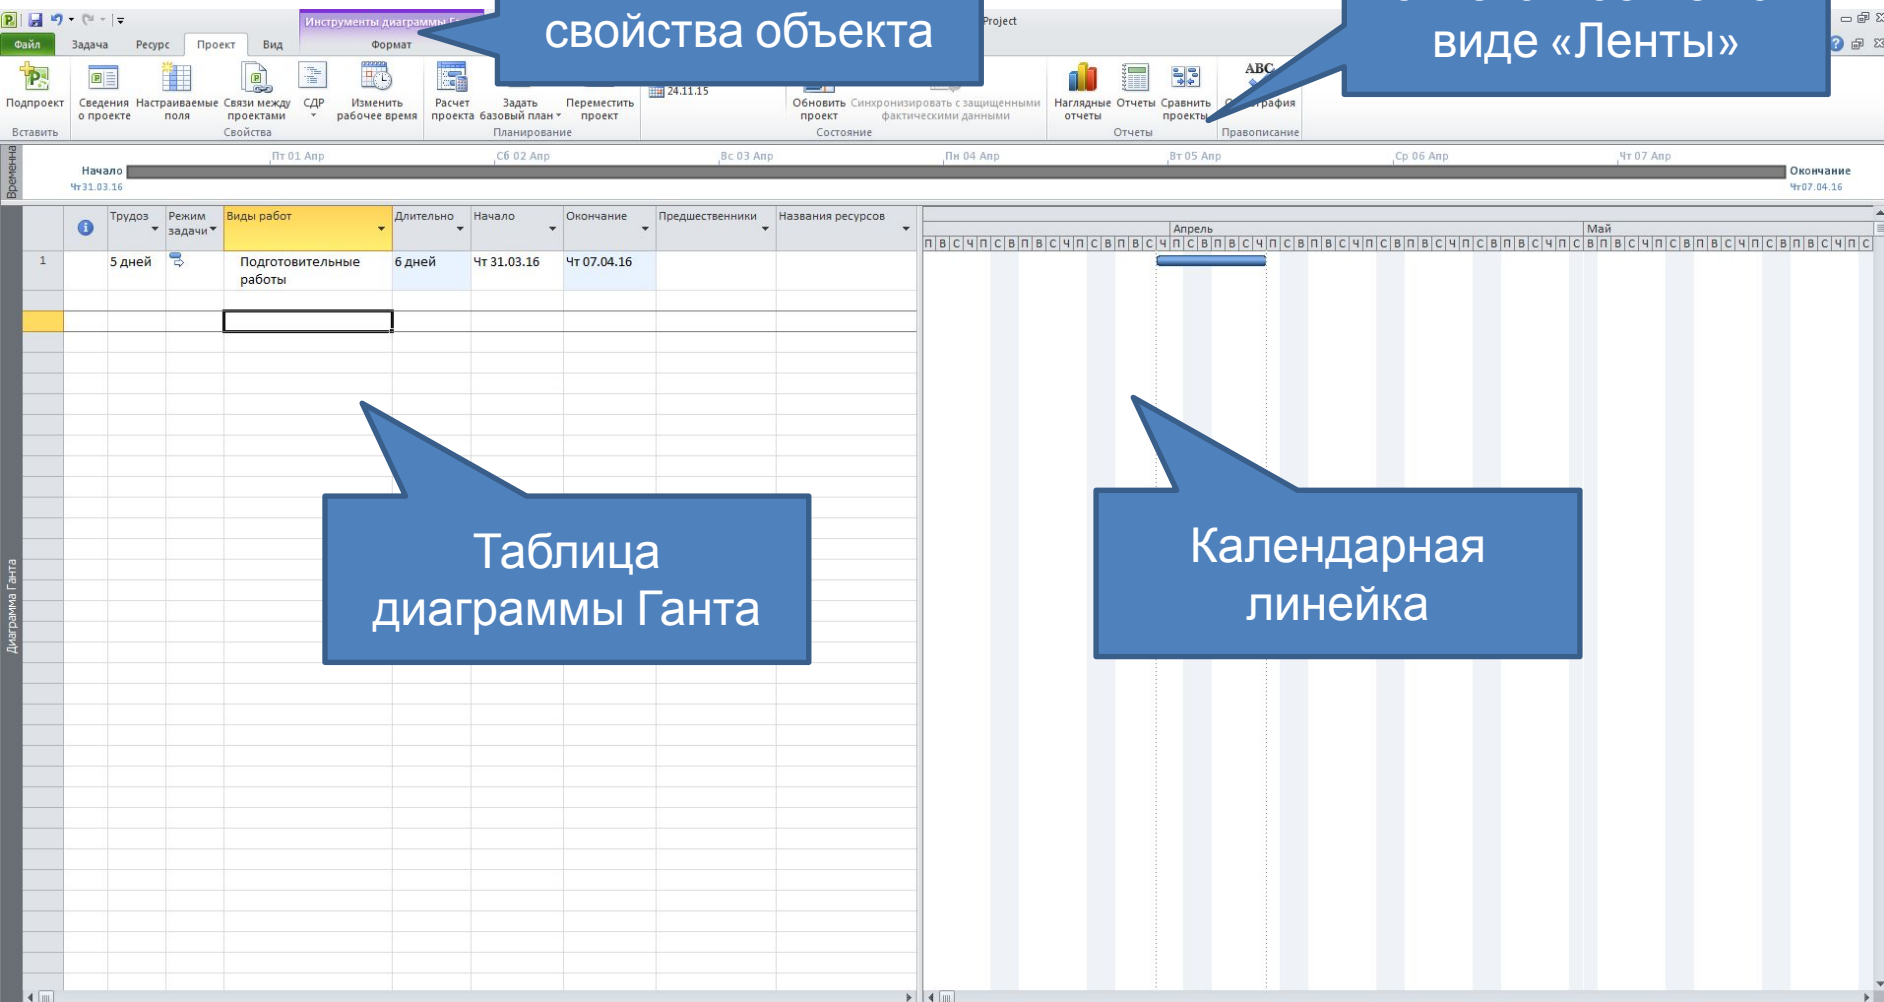


Таблица диаграммы Ганта

Календарная линейка

# Настройка шкалы времени

1. Верхний уровень – годы
2. Средний уровень – месяцы
3. Нижний уровень - дни



# Настройка календаря

- На вкладке проект измените время работы на следующий режим работы:

8:00-12:00

13:00-17:00

- В поле Вид->Формат-> включите отображением параметра «Суммарная задача проекта». В этом случае в таблице диаграммы Ганта появится строка, в которой суммируются показатели проекта.

# Основные операции в таблице диаграммы Ганта

1. Скрытие столбца: ПКМ - > Скрыть столбец
2. Вставка столбца: ПКМ - > Вставить столбец - > Выбрать из списка
3. Переименование заголовков столбцов: двойной щелчок ЛКМ на заголовке столбца
4. Трудоемкость – заполняется вручную в чел-дн.
5. Названия ресурсов – заполняется вручную в чел-дн.
6. Длительность – заполняется автоматически.
7. Суммарная задача – добавление промежуточного итога по работам

# Основные этапы календарного планирования в MS Project

- создать (и сохранить) файл проекта;
- добавить задачи в график;
- создать структуру проекта (WBS) и связи между задачами;
- назначить необходимые ресурсы для выполнения задач.

# Задание на практическое занятие

- Разработать диаграмму Ганта по созданной ранее сетевой модели
- Выполнить график движения ресурсов - рабочей силы (ресурсы – рабочие)
- Выполнить график движения ресурсов - монтажных кранов
- Выполнить график потребности сборных ж/б конструкций
- Опубликовать результаты работы в формате PDF
- Опубликовать результаты работы в формате PDF с оформлением в виде чертежа произвольного формата (A1, A2, расширенные форматы)
