

СӨЖ

Жобаны талдауға кіріспе

ЭА-341,342 топтарға

Тапсыру мерзімі – 6.03-14.03

Қорғау- жеке жұмыс

Тапсырма

1

Төрт стратегияны айқындау:

- критерий максимакса (критерий Гурвича),
- критерий максимина (критерий Вальда),
- критерий минимакса сожаления (критерий Сэвиджа) и
- критерий Лапласа.

Стратегияны игеріп, сұрақтарға жауап беруге дайын болыңыз!!!

Тапсырма 2

1 Шаг

Өздерініздің универді мерзімге сай аяқтамау тәуекелін (қауіпін) тізіп шығыңыздар

2 Шаг

Әр тәуекел түрін эксперттік әдіспен №1 кестеге қарап ықтималдығын айқындаңыз

3 Шаг

Әр тәуекел түрін эксперттік әдіспен №2 кестеге қарап әсерін айқындаңыз

4 шаг

Тәуекелді формулаға салып бағалап Дәрежесін анықтаңыз

5 Шаг

Шыққан нәтижені 4 кестедегі матрицаға салып қай зонада екенін анықтаңыз. (қызыл,сары, жасыл)

6 шаг

Шыққан нәтижені Тәуекел картасына белгілеңіз (жұлдыз ретінде немесе сәйкес сан ретінде)

7 шаг

Қорытынды жазып, оны реттеу жолдарын яғни тәуекелді азайту жолдарын ұсыныңыз

Ықтималды тәуекелді бағалау

Эксперттік әдіс

Кесте 1

Деңгей	Эксперт бағасы	Ықтималдылық
1	Өте жоғары	0,90
2	Жоғары	0,70
3	Орташа	0,50
4	Төмен	0,30
5	Өте төмен	0,1

МАТРИЦА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РИСКА

Влияние Показатель	Очень слабое 0.01	Слабое 0.1	Среднее 0.2	Сильное 0.4	Очень сильное 0.8
Цели (содержание)	Изменения незначительные	Изменения коснулись малой части	Изменена большая часть целей	Изменения неприемлемы для Заказчика	Продолжение проекта бессмысленно
Затратная часть бюджета	Изменение не более 1%	Увеличение не более чем на 5%	Увеличение на 5-10%	Увеличение на 10-20%	Увеличение более чем на 20%
Доходная часть бюджета	Снижение не более 1%	Уменьшение не более чем на 5%	Уменьшение на 5-10%	Уменьшение на 10-20%	Уменьшение более чем на 20%
Сроки	Отставание не более 1%	Отставание до 5%	Отставание по проекту 5-10%	Отставание по проекту 10-20%	Отставание более чем на 20%
Качество	Незначительное снижение качества	Затронута малая часть свойств	Снижение качества требует одобрения Заказчика	Снижение качества неприемлемо для Заказчика	Продолжение проекта бессмысленно

Михаил СОФОНОВ || «Корпоративные тренинги управления проектами» || www.sofonov.ru

Кесте 2

Тәуекелді бағалау

Кесте 3


Тәуекелді бағалау	Мәні
Қауіпті тәуекел	0,15 жоғары
Орташа тәуекел	0,06 бастап 0,15 дейін
Болмашы тәуекел	0,06 төмен

Дәреже = ықтимал * әсер

Кесте 4 Матрица ықтимал /әсер

ЫҚТИМАЛДЫЛ ЫҚ	Қауіп қатер әсері				
	Өте шамалы	Шамалы	Орташа	Қатты	Өте қатты
	0,05	0,10	0,20	0,40	0,08
0,90	0,045	0,09	0,18	0,36	0,72
0,70	0,035	0,07	0,14	0,28	0,56
0,50	0,025	0,05	0,10	0,20	0,40
0,30	0,015	0,03	0,06	0,12	0,24
0,10	0,005	0,01	0,02	0,04	0,08

Тәуекел картографиясы

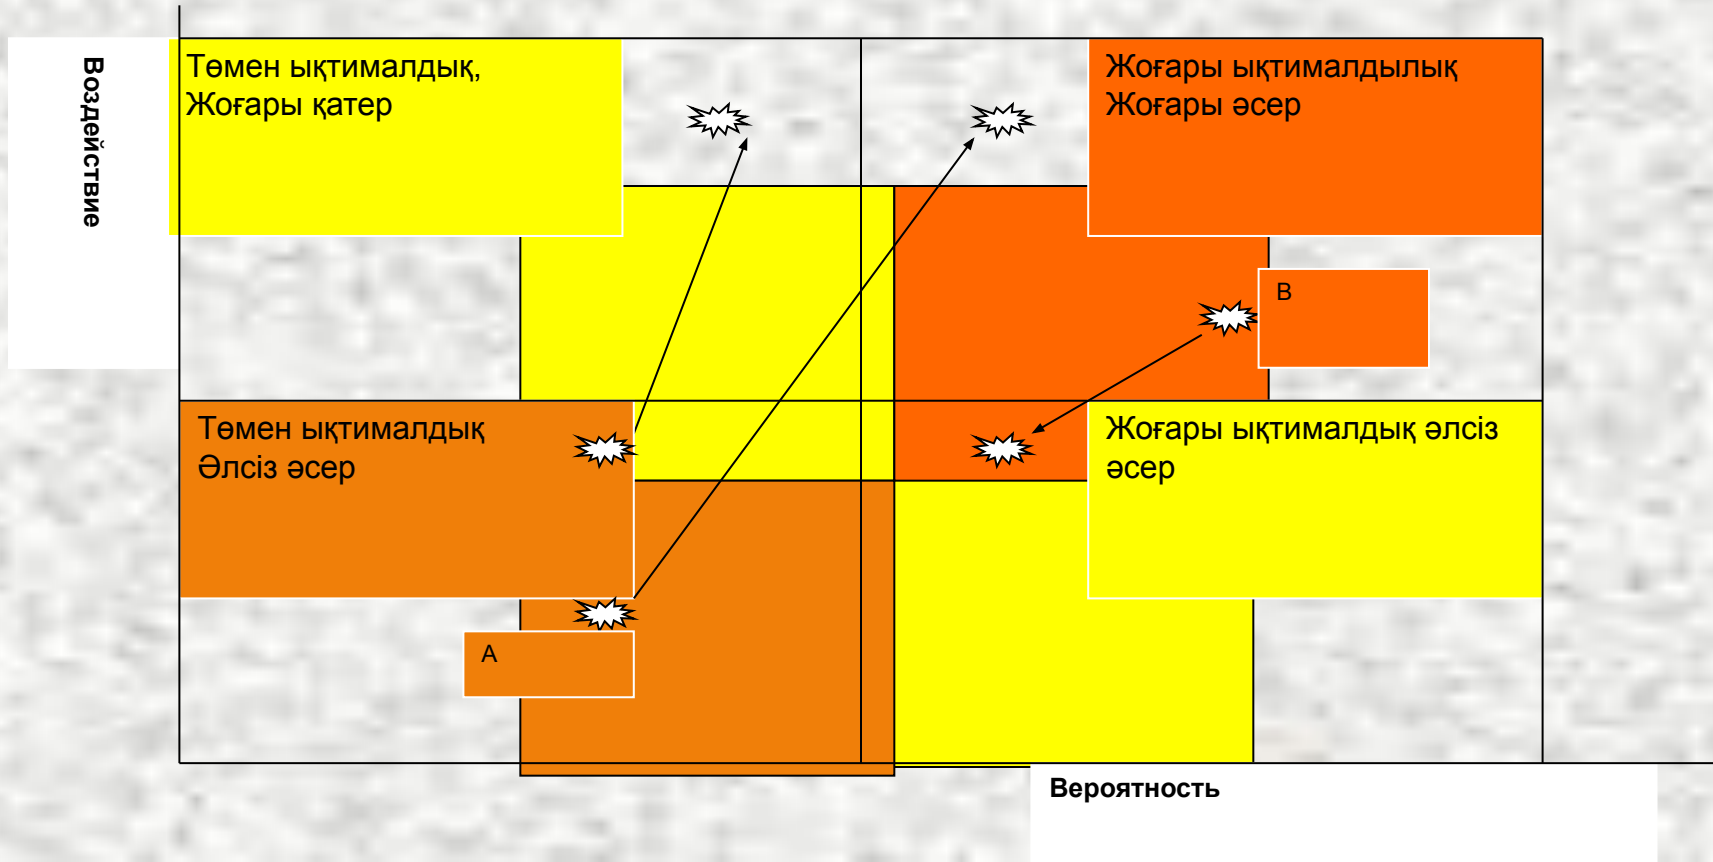

Орындалу презентация- ворд- өз
еріктеріңізде

Сізге сәттілік тілеймін !!!
