

СӨЖ

Жобаны талдауға кіріспе

ЭА-341,342 топтарға

Тапсыру мерзімі – 6.03-14.03

Қорғау- жеке жұмыс

Тапсырма

1

Төрт стратегияны айқындау:

- критерий максимакса (критерий Гурвича),
- критерий максимина (критерий Вальда),
- критерий минимакса сожаления (критерий Сэвиджа) и
- критерий Лапласа.

Стратегияны игеріп, сұрақтарға жауап беруге дайын болыңыз!!!

Тапсырма 2

1 Шаг

Өздеріңіздің универді мерзімге сай аяқтамау тәуекелін (қауіпін) тізіп шығыңыздар

2 Шаг

Әр тәуекел түрін эксперттік әдіспен №1 кестеге қарап ықтималдығын айқындаңыз

3 Шаг

Әр тәуекел түрін эксперттік әдіспен №2 кестеге қарап әсерін айқындаңыз

4 шаг

Тәуекелді формулаға салып бағалап Дәрежесін анықтаңыз

5 Шаг

Шыққан нәтижені 4 кестедегі матрицаға салып қай зонада екенін анықтаңыз. (қызыл,сары, жасыл)

6 шаг

Шыққан нәтижені Тәуекел картасына белгілеңіз (жұлдыз ретінде немесе сәйкес сан ретінде)

7 шаг

Қорытынды жазып, оны реттеу жолдарын яғни тәуекелді азайту жолдарын ұсыныңыз

Ықтималды тәуекелді бағалау

Эксперттік әдіс

Кесте 1

| Деңгей | Эксперт бағасы | Ықтималдылық |
|--------|----------------|--------------|
| 1 | Өте жоғары | 0,90 |
| 2 | Жоғары | 0,70 |
| 3 | Орташа | 0,50 |
| 4 | Төмен | 0,30 |
| 5 | Өте төмен | 0,1 |

МАТРИЦА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РИСКА

| Влияние Показатель | Очень слабое 0.01 | Слабое 0.1 | Среднее 0.2 | Сильное 0.4 | Очень сильное 0.8 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Цели (содержание) | Изменения незначительные | Изменения коснулись малой части | Изменена большая часть целей | Изменения неприемлемы для Заказчика | Продолжение проекта бессмысленно |
| Затратная часть бюджета | Изменение не более 1% | Увеличение не более чем на 5% | Увеличение на 5-10% | Увеличение на 10-20% | Увеличение более чем на 20% |
| Доходная часть бюджета | Снижение не более 1% | Уменьшение не более чем на 5% | Уменьшение на 5-10% | Уменьшение на 10-20% | Уменьшение более чем на 20% |
| Сроки | Отставание не более 1% | Отставание до 5% | Отставание по проекту 5-10% | Отставание по проекту 10-20% | Отставание более чем на 20% |
| Качество | Незначительное снижение качества | Затронута малая часть свойств | Снижение качества требует одобрения Заказчика | Снижение качества неприемлемо для Заказчика | Продолжение проекта бессмысленно |

Михаил СОФОНОВ || «Корпоративные тренинги управления проектами» || www.sofonov.ru

Кесте 2

Тәуекелді бағалау

Кесте 3


| Тәуекелді бағалау | Мәні |
|-------------------|------------------------|
| Қауіпті тәуекел | 0,15 жоғары |
| Орташа тәуекел | 0,06 бастап 0,15 дейін |
| Болмашы тәуекел | 0,06 төмен |

Дәреже = ықтимал * әсер

Кесте 4 Матрица ықтимал /әсер

| ЫҚТИМАЛДЫЛ ЫҚ | Қауіп қатер әсері | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-------|--------------|
| | Өте шамалы | Шамалы | Орташа | Қатты | Өте қатты |
| | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,08 |
| 0,90 | 0,045 | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 0,72 |
| 0,70 | 0,035 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,56 |
| 0,50 | 0,025 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| 0,30 | 0,015 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,24 |
| 0,10 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |

Тәуекел картографиясы

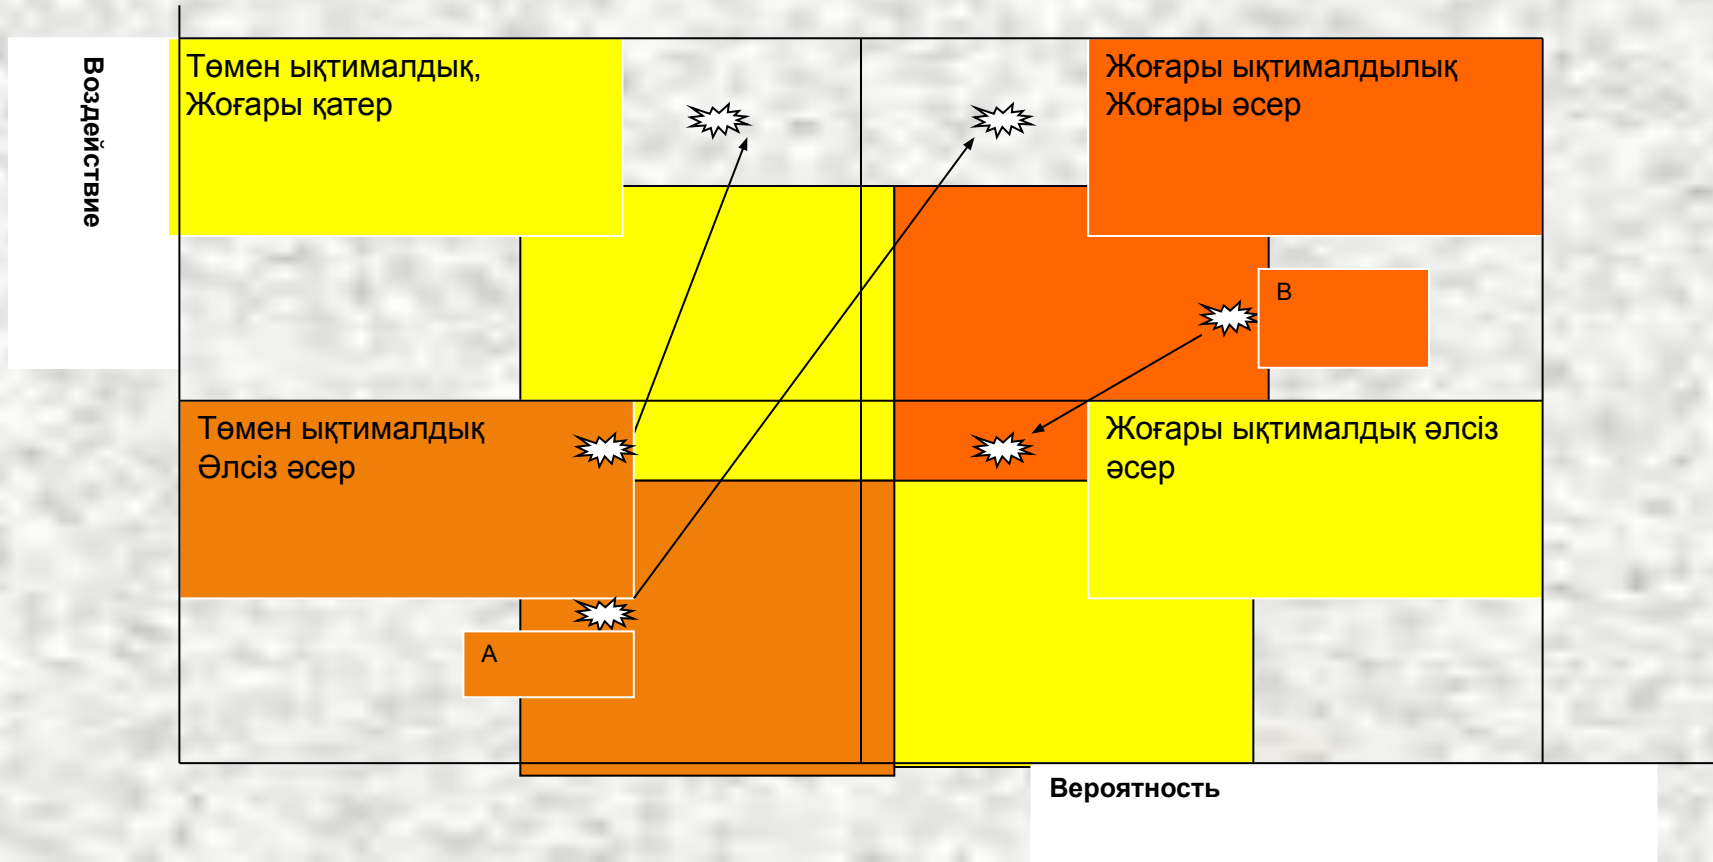

Орындалу презентация- ворд- өз
еріктеріңізде

Сізге сәттілік тілеймін !!!
