

Project management tool 1.1. «Проектное управление»

**Проектное управление.
Конфигурация на платформе 1С
Предприятие 7.7.**

Возможности конфигурации:

- Планирование и анализ исполнения работ в стоимостном и временном выражениях в разрезах:
 - сотрудники
 - центры учета (центры финансовой ответственности)
 - периоды
 - проекты
 - этапы проектов
 - виды работ
- План-фактный анализ работы подразделений в указанных разрезах, расчет отклонений, формирование аналитических отчетов (структура отчетов задается пользователем)
- Справочники Контрагентов (подрядчиков), договоров, центров учета
- Возможность одновременной работы 100 и более пользователей

Конфигурация включает:

- Справочники:
 - Сотрудники
 - Контрагенты (подрядчики)
 - Центры учета (ЦУ)
 - Список проектов и этапов
 - Виды работ по проектам
- Документы:
 - План работ на месяц
 - Факт работ за месяц
- Журнал документов «Работы по проектам» в разрезе ЦУ
- Универсальный аналитический отчет «План-факт работ по проектам»

Справочник «Сотрудники»

- Фамилия, Имя, Отчество
- Номер комнаты
- E-mail
- ИНН
- Телефоны (внутр, раб., сотовый)
- Стоимость часа для расчета стоимости работ
- Комментарии

Информация о сотруднике предприятия: Иванов Михаил Сергеевич

Иванов Михаил Сергеевич

Фамилия:	Иванов	ИНН:	
Имя:	Михаил	Телефон (внутр):	359
Отчество:	Сергеевич	Телефон (раб):	
№ комнаты:	320	Телефон (сот):	268-40-36
E-mail:	online@ural-soft.ru	Стоимость часа:	250.00

Комментарий (произвольная информация):

Записать OK Закрыть

Справочник «Контрагенты» (Подрядчики)

- Наименование
- ОПФ (организационно правовая форма)
- Организационная структура
- ИНН/КПП
- Телефоны
- Сайт, e-mail
- Юридический и фактический адреса
- Комментарий

Контрагент: ОМЕГА

Наименование контрагента:
ОМЕГА

ОПФ: [ОАО] Организация структура: [Рекламное агентство] ИНН:

Наименование контрагента для печатных форм:
[ОАО Рекламное агентство "ОМЕГА"] КПП:

Телефоны: [035] E-mail:

Сайт компании:

Юридический адрес:
Россия, 620000, Свердловская обл, Екатеринбург г


Фактический адрес:
Россия, 620000, Свердловская обл, Екатеринбург г

Комментарий:

Записать OK Закрыть

Справочник «Список проектов» (Проекты и этапы работ)

- Дерево проектов (структура проектов и этапов)
- Описания проектов/этапов
- Договора с подрядчиками
- Номер и дата акта сдачи работ
- Карточки проектов и этапов

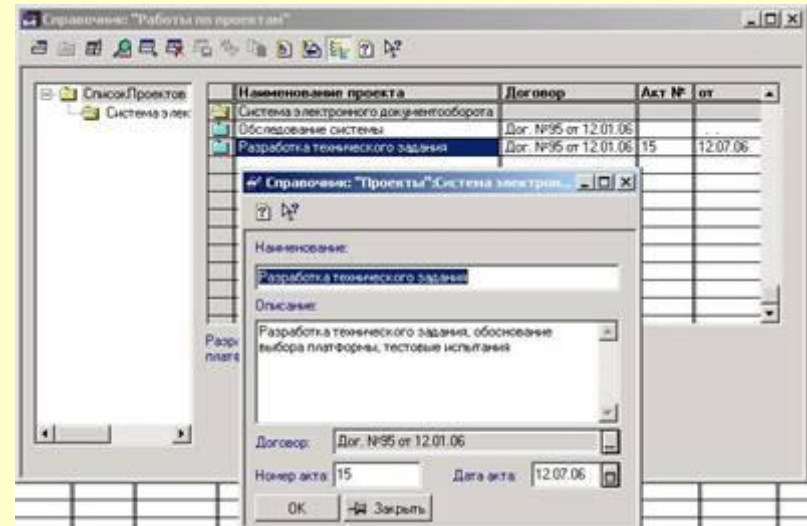

Документ «План работ на месяц»

- Центр учета, Сотрудник
- Список проектов и этапов работ
- Типы работ
- Комментарии
- Даты
- Плановые время (час.) и стоимость работ
- Сводная таблица по проектам на месяц (проекты, время, стоимость)
- Сводная таблица по датам (дата, время, стоимость)
- Итог по времени и сумме
- Сортировки по проектам и датам

Система балансируемых показателей - Новый

Отдел разработки ПО Март 2006 г. ПЛАН

Сортировки Номер: 1 от 31.03.06 Иванов Михаил Сергеевич

N	Проект	Этап работ	Тип работ	NP	Комментарий	Дата	Г план	С план
1	Система элект	Обслуживание системы	Разработка дс		Отчет об обслуживании	01.03.06	8:00	2 000.00
2	Система элект	Разработка технического	Разработка дс	13		02.03.06	4:50	1 125.00
3	Система элект	Разработка технического	Совещание		Совещание	02.03.06	3:50	875.00

По этапам работ:

Работы	Время	Сумма
Система электронного документа	16:00	4 000.00

По датам:

Дата	Время	Сумма
01.03.06	8:00	2 000.00
02.03.06	8:00	2 000.00

Итого 2 раб. дней на сумму 4 000.00 руб.

Документ «Факт работ за месяц»

- Центр учета, Сотрудник
- Список проектов и этапов работ
- Типы работ
- Комментарии
- Даты
- Фактические время (час.) и стоимость работ
- Сводная таблица по проектам на месяц (проекты, время, стоимость)
- Сводная таблица по датам (дата, время, стоимость)
- Итог по времени и сумме
- Сортировки по проектам и датам

Система сбалансированных показателей - 2

Отдел разработки ПО | Март 2006 г. | ФАКТ

Сортировки | Номер: 2 | от 01.03.06 | Иванов Михаил Сергеевич

N	Проект	Этап работ	Тип работ	NP	Комментарий	Дата	F. факт	S. факт
1	Система э.лектр.	Обследование системы	Совещание		Совещание	01.03.06	4.50	1 125.00
2	Система э.лектр.	Разработка технического	Совещание		Совещание по Т.Э.	01.03.06	3.00	750.00
3	Система э.лектр.	Разработка технического	Разработка док.		Разработка Т.Э.	02.03.06	4.00	1 000.00
4	Система э.лектр.	Разработка технического	Совещание		Согласование Т.Э.	02.03.06	6.00	1 500.00

По этапам работ:

Работы	Время	Сумма
Система э.лектронного документа	17.50	4 375.00

По датам:

Дата	Время	Сумма
01.03.06	7.50	1 875.00
02.03.06	10.00	2 500.00

Итого 2,19 раб. дней на сумму 4 375,00 руб.

Отчет «План-факт работ по проектам» (форма диалога):

- Структура отчета задается пользователем
- План-фактный анализ по:
 - Сотрудникам
 - Проектам и этапам
 - Типам работ
 - Комментариям исполнителей
 - Датам (дням)
 - Периодам (месяцам)
- Возможность наложения фильтров по сотрудникам, проектам, этапам, типам работ
- Вывод времени, суммы, отклонений



Отчет «План-факт работ по проектам» (проект/этап):

- Фактические и плановые время и стоимость работ
- Расчет отклонений (экономии и превышения) в рублях в % по времени
- Информация о договорах с поставщиками (для проектов и этапов)
- Формирование отчета за любой период в любом представлении с возможностью наложения фильтров, вариантов вывода (только время, только сумма, время и сумма, с отклонением и без)



План-факт работы отдела за период с 01.01.06 по 31.12.06				
Наименование		Факт	План	Отклонение
Система электронного документооборота	t	17.50	16.00	-9.37
	руб.	4 375.00	4 000.00	-375.00
Обследование системы (Дог. №95 от 12.01.06)	t	4.50	8.00	43.75
	руб.	1 125.00	2 000.00	875.00
Разработка технического задания (Дог. №95 от 12.01.06)	t	13.00	8.00	-62.50
	руб.	3 250.00	2 000.00	-1 250.00
Итого за период	t	17.50	16.00	-9.37
	руб.	4 375.00	4 000.00	-375.00

Отчет «План-факт работ по проектам» (сотрудник/проект/тип работ):

- Фактические и плановые время и стоимость работ
- Расчет отклонений (экономии и превышения) в рублях в % по времени
- Информация о договорах с поставщиками (для проектов и этапов)
- Формирование отчета за любой период в любом представлении с возможностью наложения фильтров, вариантов вывода (только время, только сумма, время и сумма, с отклонением и без)



План-факт работы отдела за период с 01.01.06 по 31.12.06				
Наименование		Факт	План	Отклонение
Иванов Михаил Сергеевич	t	17.50	16.00	-9.37
	руб.	4 375.00	4 000.00	-375.00
Система электронного документооборота	t	17.50	16.00	-9.37
	руб.	4 375.00	4 000.00	-375.00
Разработка документации	t	4.00	12.50	68.00
	руб.	1 000.00	3 125.00	2 125.00
Совещания	t	13.50	3.50	-285.71
	руб.	3 375.00	875.00	-2 500.00
Итого за период	t	17.50	16.00	-9.37
	руб.	4 375.00	4 000.00	-375.00

Отчет «План-факт работ по проектам» (сотрудник/дата/проект):

- Фактические и плановые время и стоимость работ
- Расчет отклонений (экономии и превышения) в рублях в % по времени
- Информация о договорах с поставщиками (для проектов и этапов)
- Формирование отчета за любой период в любом представлении с возможностью наложения фильтров, вариантов вывода (только время, только сумма, время и сумма, с отклонением и без)



Наименование	Факт	План	Отклонение
Иванов Михаил Сергеевич	t 17.50	16.00	-9.37
	руб. 4 375.00	4 000.00	-375.00
01.03.06	t 7.50	8.00	6.25
	руб. 1 875.00	2 000.00	125.00
Система электронного документооборота	t 7.50	8.00	6.25
	руб. 1 875.00	2 000.00	125.00
02.03.06	t 10.00	8.00	-25.00
	руб. 2 500.00	2 000.00	-500.00
Система электронного документооборота	t 10.00	8.00	-25.00
	руб. 2 500.00	2 000.00	-500.00
Итого за период	t 17.50	16.00	-9.37
	руб. 4 375.00	4 000.00	-375.00

Последовательность работы:

- Заполнение справочников «Проекты», «Типы работ» (разработка документации, разработка ПО, совещания) в соответствии с требованиями к аналитике
- Заполнение документов «План работ на месяц»
- Заполнение документов «Факт работ за месяц» (может использоваться как ежедневный отчет о работах)
- Теперь можно использовать отчет «План-факт работ по проектам».

Конфигурация «Project management tool» легко интегрируется с любыми конфигурациями 1С

Пять основных преимуществ конфигурации «Project management tool» версии 1.1.:

- Простой и понятный алгоритм работы
- Минимальные сроки внедрения (от 1 дня)
- Стоимость – одно из самых недорогих решений по проектному управлению
- Возможность внедрения в любую конфигурацию 1С 7.7.
- Широкие возможности аналитики исполнения проектов в различных разрезах

Project management tool - Оптимальное решение для проектного управления

Порядок приобретения и стоимость конфигурации «Project management tool 1.1.»:

- Стоимость модуля: 3600 руб. (Включая НДС)
- В комплект поставки входит:
 - CD диск с дистрибутивом конфигурации
 - Инструкция пользователя
- Для приобретения модуля обращайтесь по тел: (343) 268-40-36 или по адресу online@ural-soft.ru
- **Заказать подробное описание модуля вы можете по адресу online@ural-soft.ru**
- При почтовой доставке стоимость доставки входит в стоимость конфигурации.

ООО Внедренческая компания «Урал-Софт»

Адрес: 620014, Екатеринбург, Ленина 5/4, 130

Тел. (343) 268-40-36, 213-03-57

<http://www.ural-soft.ru>

online@ural-soft.ru

- **Решения для финансового анализа и управленческого учета**
- **Автоматизация кадровых агентств, кадровых подразделений**
- **Автоматизация торговли (фискальные регистраторы, дисконт)**
- **CRM-системы, учет контактов, персонифицированные рассылки**
- **Автоматизация учета издательской деятельности**
- **Интеграция сайтов и информационных баз**
- **Организация работы удаленных торговых точек, филиалов.**
