



**АТОМ
ЭНЕРГО
ПРОМ**


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Аспекты работы ДЕЗ при размещении и исполнении заказа на оборудование ДЦИ.

Изменение организационно-правовой формы ДЕЗ

**Дирекция единого заказчика
Архипов Ю.П.**

Аспекты закупки оборудования ДЦИ по существующей схеме

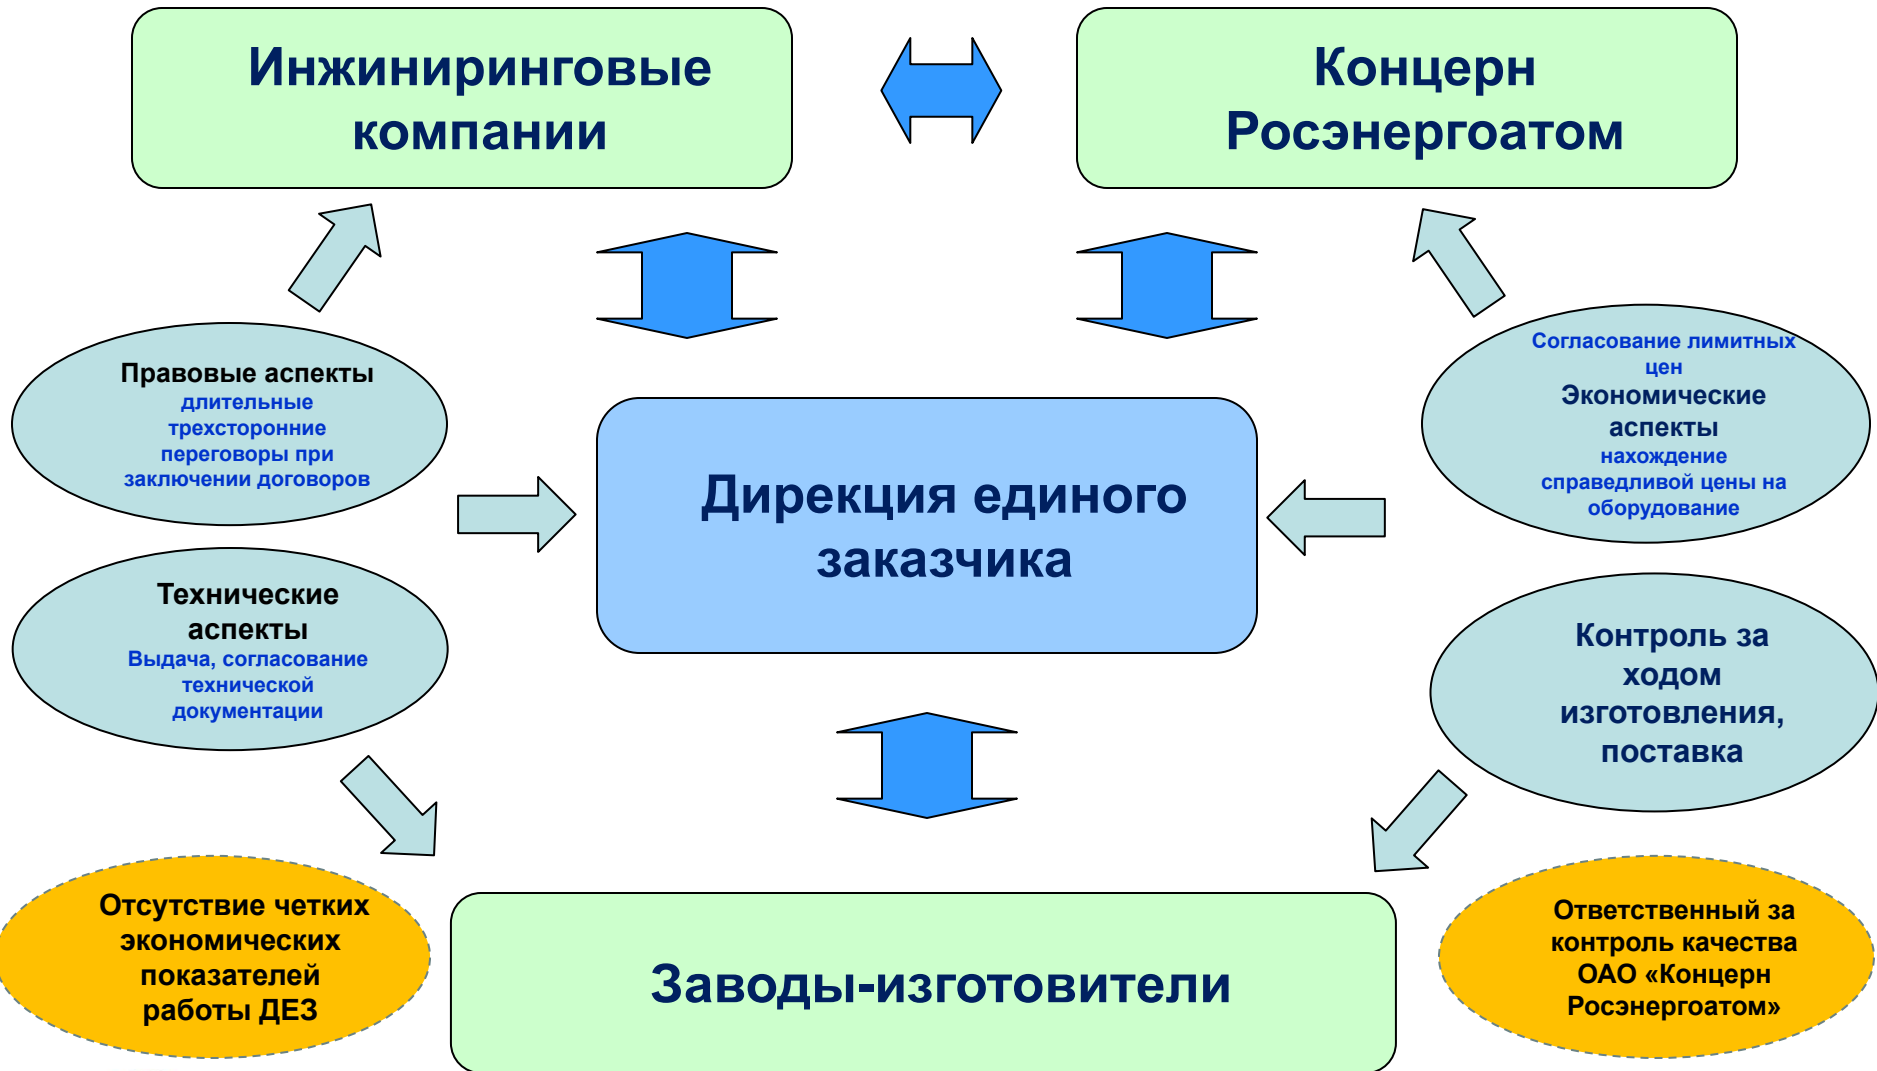


Проблемные вопросы

- Длительные многосторонние (до семи сторон) переговоры при заключении договоров негативно влияют на сроки поставки оборудования;
- Нахождение справедливой цены на оборудование затруднено недобросовестным поведением монополистов;
- Несвоевременность выпуска технической документации проектными институтами и длительное согласование документации, разработанной заводами негативно влияют на сроки поставки оборудования;
- Дополнительное требование ОАО «Концерн Росэнергоатом» согласования технической документации с тремя своими подразделениями удлиняет сроки запуска оборудования в производство;
- Срывы сроков поставки, относительно невысокое качество продукции по вине заводо-изготовителей неблагоприятным образом сказываются на сроках сооружения и безопасности АЭС;
- Отсутствие у ДЕЗ прав по управлению качеством изготавливаемого оборудования приводит к дополнительному выявлению несоответствий оборудования действующим нормативным и техническим документам, устранение выявленных несоответствий носит длительный характер ввиду большого количества согласующих организаций.




Изменение схемы закупок оборудования ДЦИ, создание ОАО «ДЕЗ»

В настоящее время



Один из возможных вариантов после изменения схемы закупок

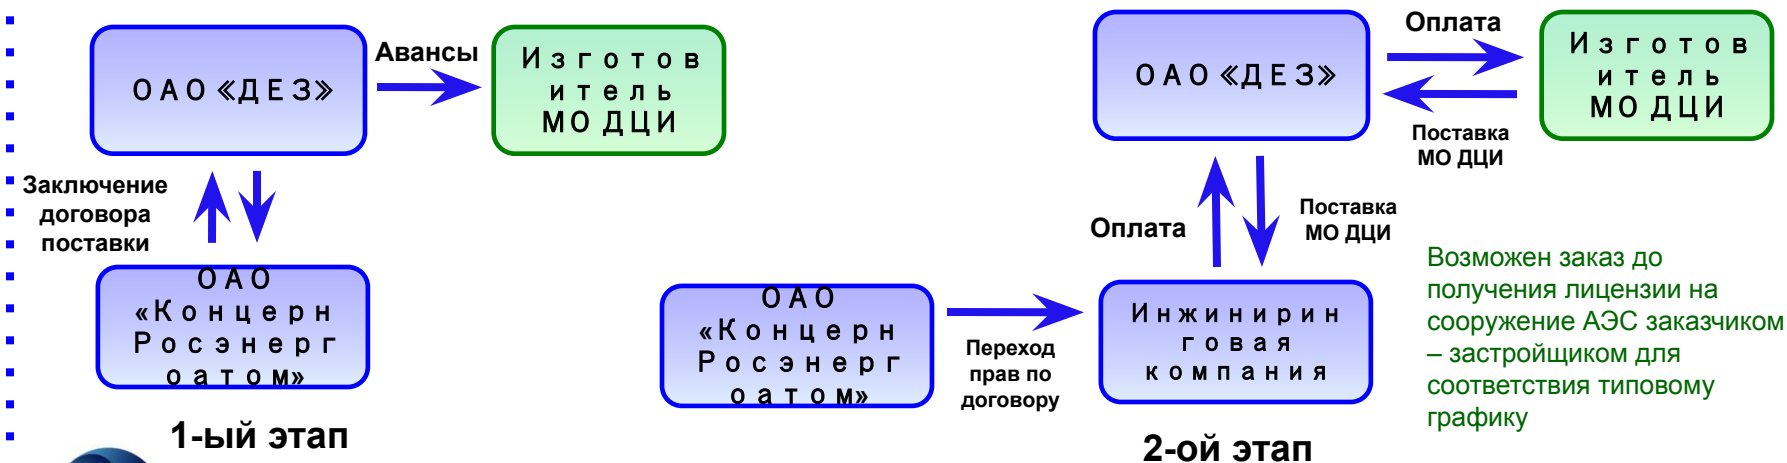


Изменение схемы закупок ДЦИ




Возможные перспективы развития ОАО «ДЕЗ»

Создание бизнес единицы ОАО «ДЕЗ»

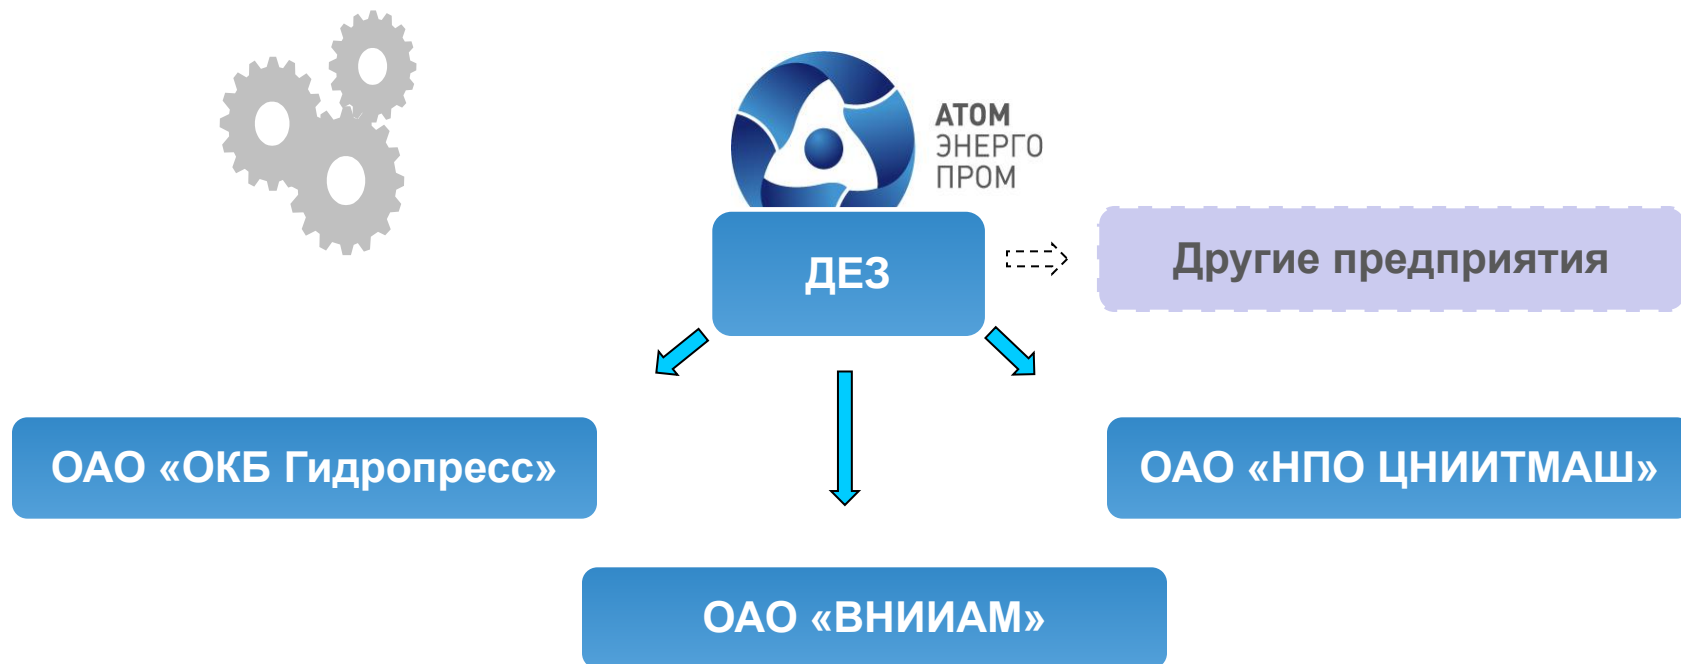

Синергетические эффекты от создания бизнес единицы


Усиление экономического эффекта от оптимизации технических требований для оборудования ДЦИ за счет расширения и укрепления технических компетенций Дирекции единого заказчика



- Применение новых материалов и технологий
- Оптимизация конструкторских решений
- Аттестация новых поставщиков
- Разработка технических требований

Снижение стоимости оборудования, рост финансовой эффективности дочерних предприятий за счёт совместного использования экономии от оптимизации стоимости оборудования ДЦИ

Развитая система менеджмента качества




- Заключение договоров на использование экономии
- Разработка новых стратегий предприятий и контроль их исполнения
- Повышении качества оборудования для АЭС

Оптимизация затрат за счет совместного использования материальных, нематериальных и человеческих ресурсов.

Совместная защита интеллектуальной собственности.

Решение конфликтов внутренней конкуренции



- Совместное использование результатов НИОКР и конструкторской документации
- Совместное использование производственных мощностей и офисных помещений
- Сокращение административного персонала
- Усиление канала продаж и доступа к финансированию
- Сокращение расходов на внутреннюю конкуренцию.



Альтернативным поставщикам

Основные требования

1. Положительные результаты проверки деловой репутации поставщика и его должностных лиц, финансовая состоятельность.

2. Выполнение требований к предмету закупки.

3. Соблюдение отраслевых стандартов и требований по качеству и безопасности, наличие лицензий.


4. Объём, стоимость и сроки выполнения договора.

5. Опыт и квалификация поставщика.


6. Конкурентоспособная цена



Технология работы (до конца 2009г)

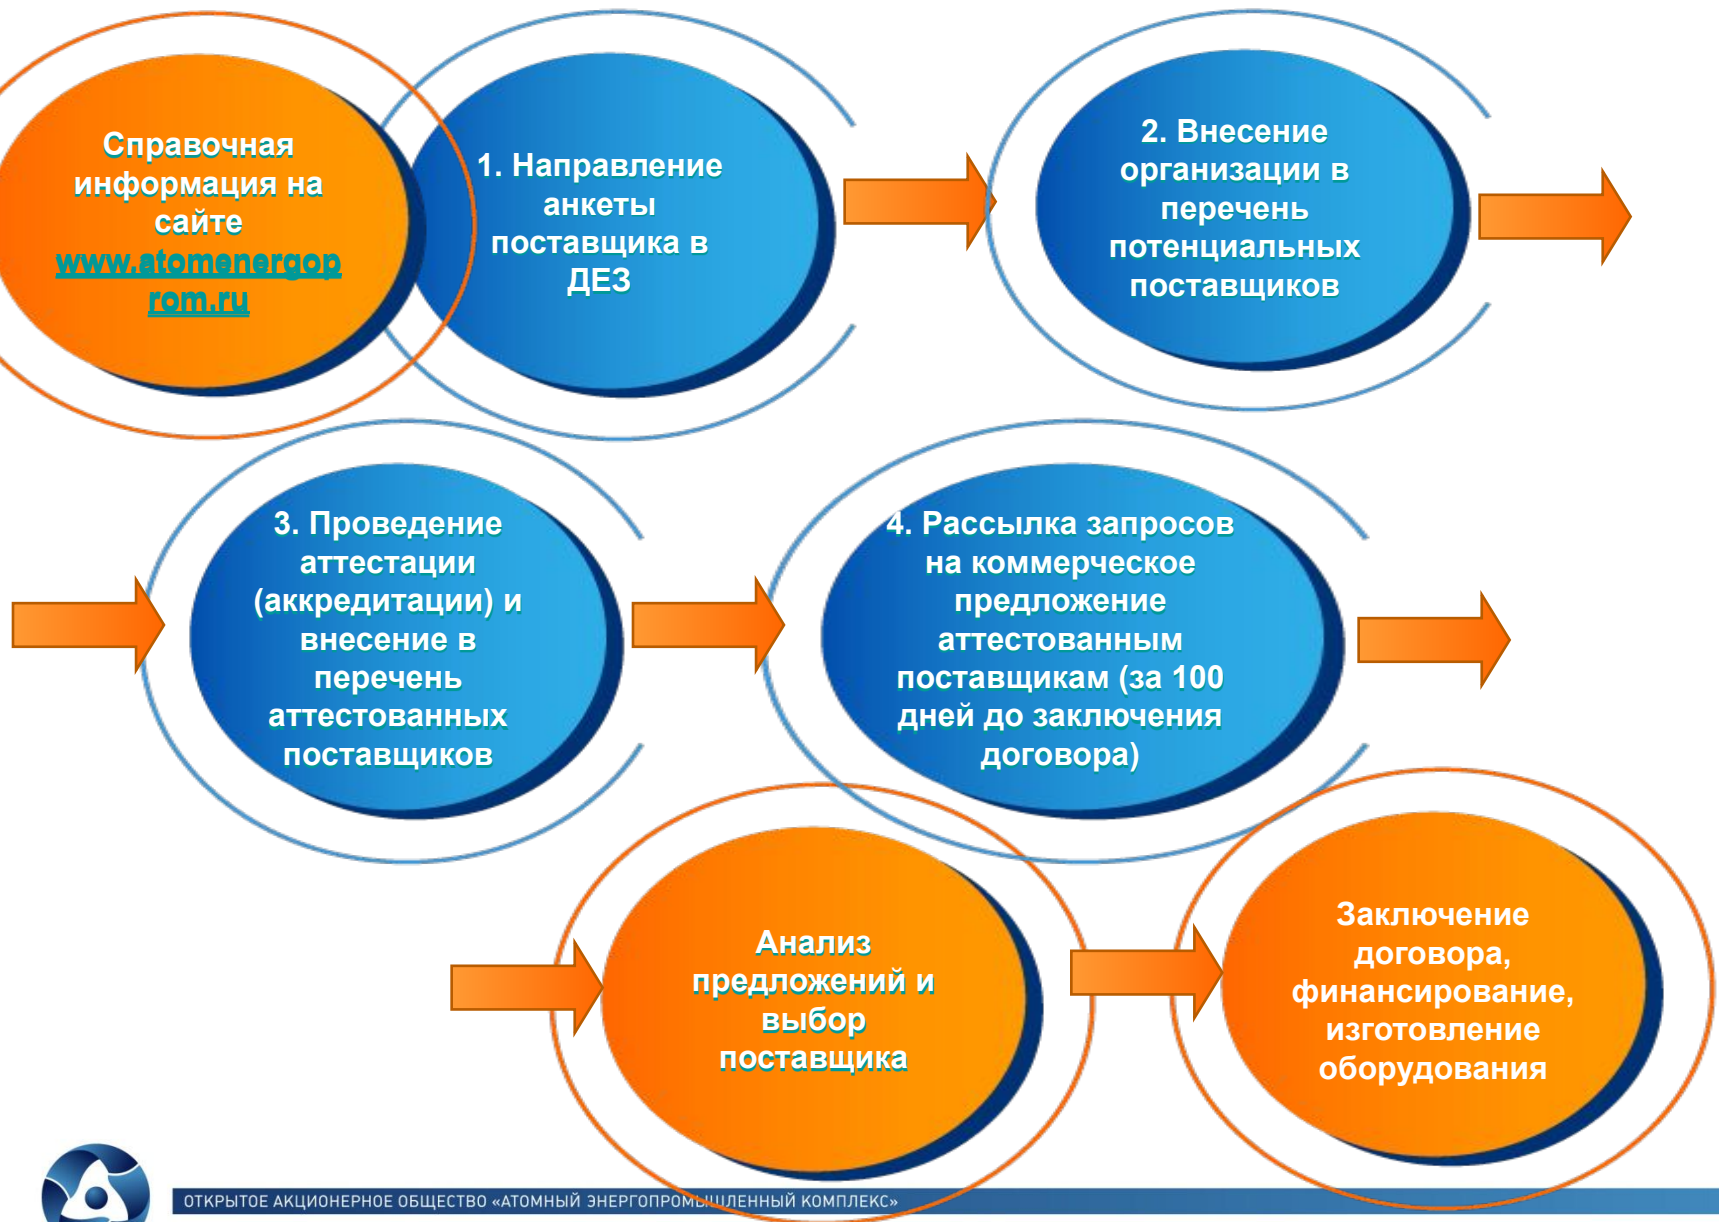

Новая технология работы (с 2010г.)

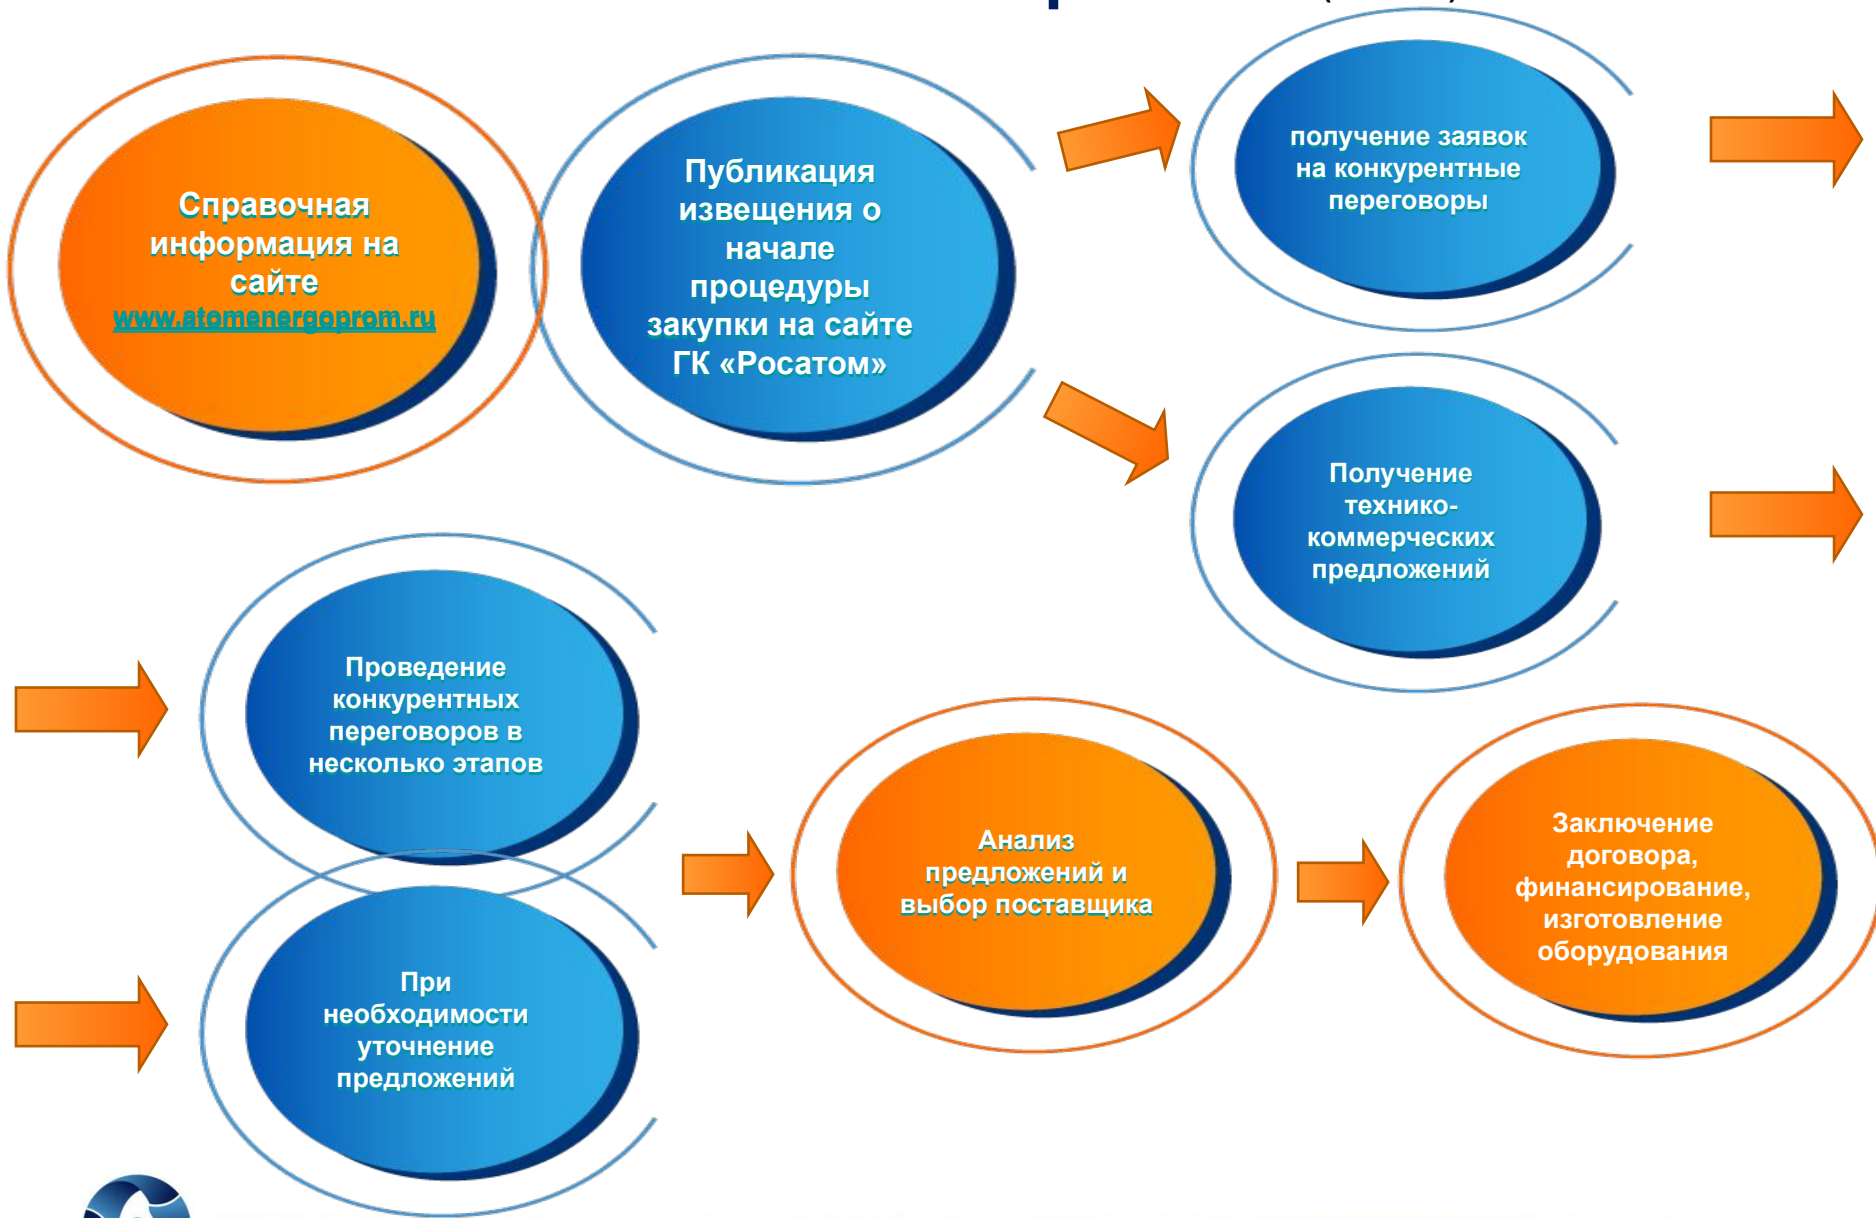



О КОМПАНИИ · ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ · ПРЕСС-ЦЕНТР · ЗАКУПКИ И ТЕНДЕРЫ · ИНВЕСТИРАМ · КАРЬЕРА · ОБ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

» Текущие закупки и тендеры

» Политика в области закупок

» Поставщикам оборудования ДЦИ (длительного цикла изготовления)

» Текущие закупки оборудования длительного цикла изготовления

» Коммерческое предложение

» Договор поставки

» Отчет о ходе изготовления оборудования

[Главная](#) / [Закупки и тендеры](#) / [Поставщикам оборудования ДЦИ \(длительного цикла изготовления\)](#)

Поставщикам оборудования ДЦИ (длительного цикла изготовления)

Атомэнергопром ставит своей целью обеспечить поставки оборудования длительного цикла изготовления (более 6 месяцев) на площадки строительства АЭС на лучших ценовых условиях, в требуемые сроки, с соблюдением требований по качеству и безопасности.

Для реализации указанных целей компания развивает следующие приоритетные направления: формирование единого (консолидированного) заказа, его размещение и исполнение; экспертиза цен монополистов, создание прозрачного механизма ценообразования, поиск альтернативных поставщиков; выявление избыточности технических требований, сокращение сроков изготовления оборудования, снижение стоимости его производства.

Атомэнергопром ориентирован на поддержку российского производителя, но при условии, что компании-поставщики готовы внедрять программы снижения издержек, оптимизировать технологию, добиваться лучших условий у своих субпоставщиков. Вместе с тем компания признает необходимость альтернативных поставщиков, в том числе иностранных, для борьбы с монополизмом и внедрения новых технологий.



Спасибо за внимание!

Архипов Юрий Павлович
Заместитель директора ДЕЗ
+7(495) 642 6687

Дирекция единого заказчика ОАО «Атомэнергопром»

Эл.почта: dez@atomenergoprom.ru
<http://www.atomenergoprom.ru/ru/tender/offer/>
тел.: +7 (495) 642 6687, факс: +7 (495) 969 2939 доб.3157
Россия, 119180, Москва, Большая Полянка, д.25,стр.1

