



Автономная некоммерческая организация по развитию физической культуры, спорта и туризма в Чернянском районе «Олимп»


# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «Мобильная бригада ГТО»

Руководитель проекта  
**Алёхин Александр Викторович**

Чернянка, 2021  
год

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

По итогам 2020 года количество жителей Чернянского района принявших участие в сдаче норм ВФСК «ГТО» составляет 2842 человек, что соответствует 11% от общей численности населения района от 6 до 70 лет

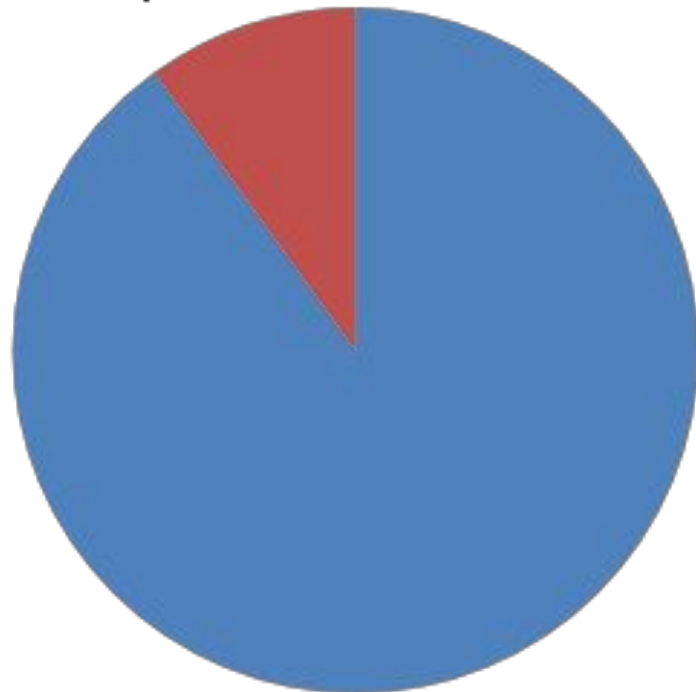

- Всего жителей от 6 до 70 лет
- Кол-во принявших участие в сдаче норм ВФСК "ГТО"

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

На территории сельских поселений отсутствуют квалифицированные судьи, имеющие допуск к приему норм ВФСК «ГТО».



# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	К середине ноября 2021 года привлечь к сдаче норм ВФСК «ГТО» с помощью выездной бригады ГТО, не менее 500 человек		
<b>Способ достижения цели:</b>	Проведение комплекса выездных мероприятий по приему норм ВФСК «ГТО»		
<b>Результат проекта:</b>	<b>Результат:</b>	<b>Базовое значение</b>	<b>Период, 2021год</b>
	Привлечено не менее 500 человек жителей района к сдаче норм ВФСК «ГТО»	0	500
<b>Требования к результату проекта:</b>	<b>Требования к результату:</b>	<b>Базовое значение</b>	<b>Период, 2021 год</b>
	Проведение одного обучающегося семинара с инструкторами по спорту	0	1
	Проведена информационная компания о проведении мероприятий по приему норм ГТО в Чернянском районе	0	1
	Закуплен инвентарь ГТО для мобильной бригады	0	1
	Создана выездная группа для регистрации и приема норм ГТО	0	1
	Организовано не менее 16 выездов в поселения района	0	16
	Привлечение к сдачи норм «ГТО» не менее 500 чел. в выездных мероприятиях	0	500
	Проведение не менее 3-х обучающих занятий по подготовке к сдаче норм «ГТО»	0	3
<b>Пользователи результатом:</b>	Жители Чернянского района		

# Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

## Выездные спортивно-массовые мероприятия на территориях поселений района

Сформирована выездная  
бригада судей для приема  
норм ГТО в поселениях  
района

Проведены обучающиеся  
занятия по подготовке к сдаче  
норм ГТО

Проведен семинар с  
инструкторами по сдаче норм  
ГТО



# Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

## Выездные спортивно-массовые мероприятия на территориях поселений района

Проведены выездные мероприятия по приему норм ГТО в поселениях район

Привлечено к сдаче норм ГТО не менее 500 человек









# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
<b>I</b>	<b>Подготовительный блок</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Формирование выездной бригады ГТО	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Согласование с главами поселений даты и время проведения на их территориях прием норм ГТО	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Формирование графика выездных мероприятий	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Закупка инвентаря ГТО	27,0	0	0	0	27,0	0	0
1.5	Разработка обучающих мероприятий по сдаче норм ГТО	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Основной блок</b> <b>Проведение спортивно-массовых мероприятия в поселениях</b>	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Проведение обучающего семинара с инструкторами							
2.2	Проведение обучающих занятий в мае							

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
2.3	Проведение обучающих занятий июне	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Проведение обучающих занятий июле	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Прием норм ГТО в сельских поселениях	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Прием норм ГТО в п.Чернянка на стадионе	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Прием норм ГТО в п.Чернянка мкр. Восточный	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Прием норм ГТО в п.Чернянка мкр.Южный	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Прием норм ГТО в п.Чернянка мкр.Сахарный завод, площадка ГТО	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Прием норм ГТО на стадионе, ФОК, бассейне	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Информационный блок</b>	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Информирование о предстоящих мероприятиях в СМИ	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Освещение итогов в СМИ	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Итого:</b>	<b>27,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# РИСКИ ПРОЕКТА

№	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Отсутствие инвентаря и оборудования при приеме норм ГТО	Срыв мероприятия	Закупка инвентаря ГТО	Алехин А.В	Использование инвентаря и оборудования имеющегося в поселении
2.	Незаинтересованность жителей поселений к сдаче норм ГТО	Невыполнение требований	Публикации в социальных сетях, СМИ	Алехин А.В	Проведение просветительских, агитационных мероприятий в большем объеме
3.	Низкая явка участников сдачи норм ГТО	Невыполнение требований	Согласование с главами поселений даты и время проведения на их территориях прием норм ГТО	Алехин А.В	Назначение дополнительного дня для проведения семинара для отсутствующих инструкторов

# КОМАНДА ПРОЕКТА

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность и основное место работы</b>	<b>Выполняемые в проекте работы</b>
1.	Алехин Александр Викторович	Директор АНО «Чернянский «Олимп»	Руководитель проекта
2.	Агапов Евгений Иванович	Специалист 1 категории отдела по физической культуре и спорту	Администратор проекта, член рабочей группы , выездная бригада ГТО, публикации СМИ, семинар.
3.	Добрышин Василий Николаевич	Инспектор по внедрению ГТО МБУ «ФОК»	Член рабочей группы , выездная бригада ГТО , обучение

# КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:  
Директор АНО «Чернянский Олимп»  
Алёхин Александр Викторович  
тел.:8-904-086-60-42  
e-mail:  
[chern.olimp@yandex.ru](mailto:chern.olimp@yandex.ru)
