

# Внедрение АИС «Налог-3»

## Внедрено

### 2014-2016

- 159 технологических процессов
- 7 аналитических задач

### 2017-2018

- 44 технологических процессов
- ЛК ФЛ

## Планируется к внедрению

### 2018

### 188 ТП ФБЗ

### 182 ТП

6 ТП  
с опережением

сентябрь  
2018

Промышлен  
ная  
эксплу

январь  
2019

## Концепция технологии Конвертации данных

Единая глубина конвертации данных — 3 года!


Централизованный контроль готовности данных по налогоплательщику

Поэтапная конвертация в централизованные компоненты АИС «Налог-3» налогоплательщиков, данные по которым не имеют ошибок

Продолжение работы в ПК «СЭОД» с налогоплательщиками, данные по которым не перенесены в централизованные компоненты АИС «Налог-3»

# Подготовка данных к конвертации

(приказ от 21.07.2017 №ЕД-7-6/564@)

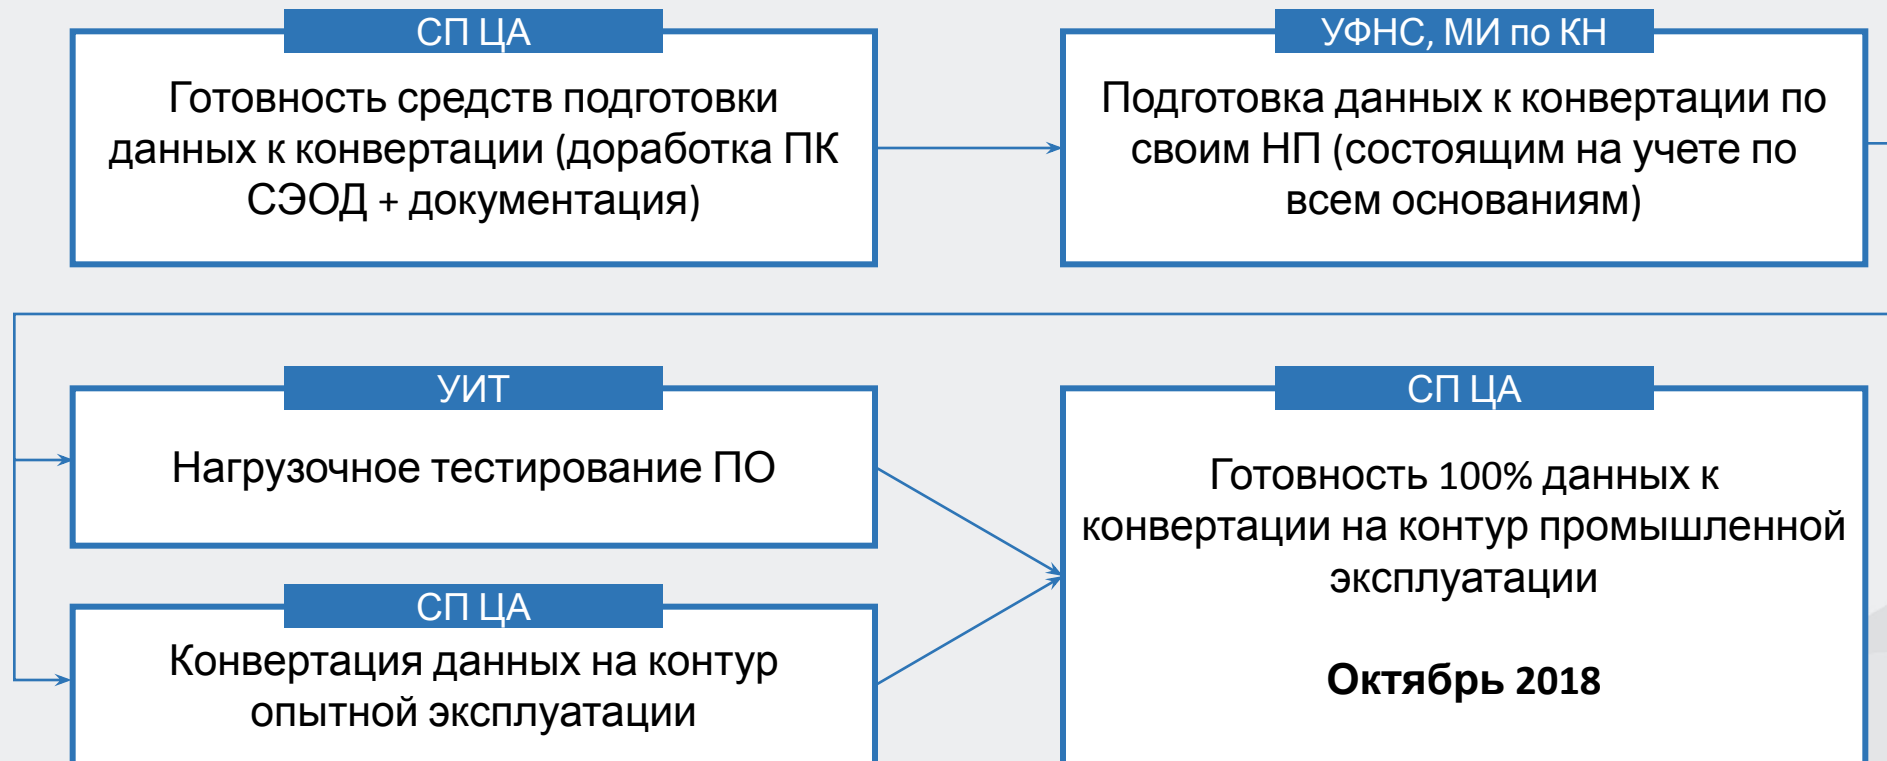

Координация работ: УМНО

Персональная ответственность сотрудников:

СП ЦА

УФНС, МИ по КН

# Контроль готовности данных к конвертации

Налоговое администрирование\Подсистема конвертации\  
Отчеты\01. Формирование отчетов конвертации

3 отчета:

- Интегральные показатели готовности данных
- Статистика контроля по задачам
- Статистика готовности налогоплательщиков

Налоговое администрирование\Подсистема конвертации\  
ИР Конвертация\01. Лица, подлежащие конвертации

Формирование отчетов | Сервис | АИС Налог-3

Сформировать | Отчеты

**Задачи по подсистемам**

- Анализ имущественных налогов ТСД
- Анализ сведений СУО
- Налоговая статистика и аналитика
- Налоговое администрирование
  - Подсистема конвертации
    - ИР Конвертация
      - 01. Лица, подлежащие конвертации
      - 02. НО, имеющие данные для подъема
      - 03. Задачи с данными для подъема
      - 04. Данные для подъема (общий список)
      - 05. Данные для подъема в привязке к НО по МН ЮЛ/МЖ ФЛ
    - Конвертация
      - 01. Этапы конвертации
      - 02. Перечень транспортных контейнеров
    - Мониторинг
      - 01. Журнал поступления отчетов (общий)
      - 02. Журнал поступления отчетов по конвертации
      - 03. Журнал поступления отчетов ПК Регион
    - Мониторинг БДК
      - 01. Журнал передачи БДК
      - 02. Статистика мониторинга БДК по НО-отправителя
      - 03. Статистика мониторинга БДК по НО-получателя
      - 04. Запросы НО-получателя на загрузку БДК, не имеющих сведений
    - Отчеты
      - 01. Формирование отчетов конвертации

Конвертация | Сервис | АИС Налог-3

Обновить | Сформировать

Общие | Отчет

**Задачи по подсистемам**

- Анализ имущественных налогов ТСД
- Анализ сведений СУО
- Налоговая статистика и аналитика
- Налоговое администрирование
  - Подсистема конвертации
    - ИР Конвертация
      - 01. Лица, подлежащие конвертации
      - 02. НО, имеющие данные для подъема
      - 03. Задачи с данными для подъема
      - 04. Данные для подъема (общий список)
      - 05. Данные для подъема в привязке к НО по МН ЮЛ/МЖ ФЛ
    - Конвертация
      - 01. Этапы конвертации
      - 02. Перечень транспортных контейнеров
    - Мониторинг
      - 01. Журнал поступления отчетов (общий)
      - 02. Журнал поступления отчетов по конвертации
      - 03. Журнал поступления отчетов ПК Регион
    - Мониторинг БДК
      - 01. Журнал передачи БДК
      - 02. Статистика мониторинга БДК по НО-отправителя
      - 03. Статистика мониторинга БДК по НО-получателя
      - 04. Запросы НО-получателя на загрузку БДК, не имеющих сведений
    - Отчеты
      - 01. Формирование отчетов конвертации
      - 04. Формирование отчетов по локализации НДС


Тип лица	ФИД	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО лица	Количество
1	11	7707083893	1027700132195	ПАО СБЕРБАНК	
1	7093675	7707067683	1027739049689	ПАО СК "РОСГОССТРАХ"	
1	2913251	7702235133	1037700013020	БАНК РОССИИ	
1	7136551	7707049388	1027700198767	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	
1	2423835	7724261610	1037724007276	ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"	
1	7155648	7740000076	1027700149124	ПАО "МТС"	
1	4545511	7735057951	1027700280937	ООО "ХФ БАНК"	
1	7152617	7713076301	1027700166636	ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"	
1	4499264	7703567318	1057748731336	АО "СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА"	
1	2432297	7708503727	1037739877295	ОАО "РЖД"	
1	7111601	7725112547	1027739805461	ФКУ "ГУ "ВО МИНФИНА РОССИИ"	
1	2169268	7714617793	1057748288850	ООО "ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ"	

Всего записей: 12

Код НО	Наименование задачи	Код критерия контроля	Наименование критерия контроля
2201	КРСБ и НО (ПФВ)	5317	Несоответствие КБК и статуса НП в КРСБ (ПФВ)

# Интегральные показатели готовности данных к конвертации на 01.09.2018

Плановые показатели  
готовности данных  
на 01.09.2018



99%

Все УФНС по субъектам РФ  
99%

**Не достигли готовности 2 ИФНС**

*(по отдельным задачам)*

УФНС по Республике Дагестан

ИФНС 0571

92,4%

УФНС по Хабаровскому краю

ИФНС 2709

97,9%

## Количество «сложных» налогоплательщиков, состоящих на учете в двух и более налоговых органах



**9,5%**

Количество  
налоговых органов

Количество  
налогоплательщиков

**2-10**

**44 216 187**

**10-100**

**13 063**

**100-800**

**394**

**44,9 млн.**

Доработка программного обеспечения

Организационное письмо УМНО

# Готовность налогоплательщиков к конвертации на 19.09.2018

 **Все налогоплательщики готовы**

1. УФНС России по Республике Марий Эл
2. УФНС России по Чувашской Республике
3. УФНС России по Пензенской области
4. УФНС России по Тамбовской области
5. УФНС России по Орловской области
6. УФНС России по Еврейской автономной области
7. МИ ФНС по КН № 1
8. МИ ФНС по КН № 3
9. МИ ФНС по КН № 4
10. МИ ФНС по КН № 5
11. МИ ФНС по КН № 6
12. МИ ФНС по КН № 7

**Обеспечить готовность налогоплательщиков на 01.10.2018 –  
100%**


**Всего НП  
44 386 044**

С учетом множественности постановок

**47 458 745**

Не готовых к конвертации

**1 834 (0,004%)**



Количество **не готовых** НП > 50

1. УФНС по Московской области	365
2. УФНС по г. Москве	238
3. УФНС по Республике Дагестан	156
4. УФНС по Краснодарскому краю	93
5. УФНС по Санкт-Петербургу	93
6. УФНС по Омской области	86
7. УФНС по Самарской области	61

Количество **не готовых** НП < 50


73 УФНС по субъектам РФ

# Готовность технологических процессов ФБ № 3 АИС «Налог-3» к внедрению в промышленную эксплуатацию

По состоянию на 19.09.2018



За 12 месяцев

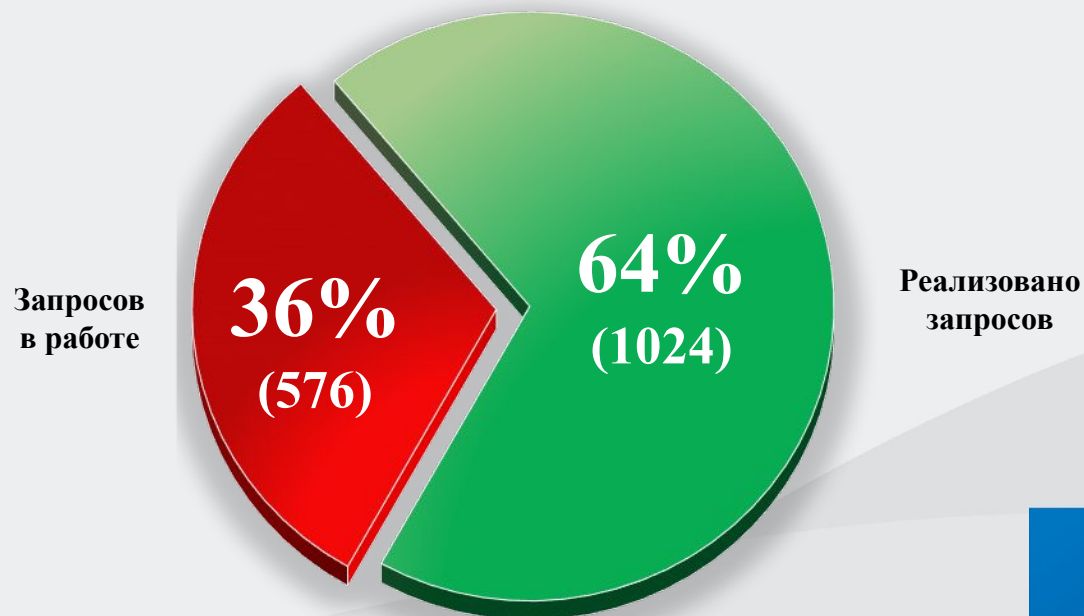

15 рабочих групп

1600 запросов по оптимизации  
технологических процессов



## Риски массового внедрения


1. **Максимальная нагрузка** на контур промышленной эксплуатации.
2. **Нестабильная работа** программного обеспечения.
3. **Функциональная неполнота** программного обеспечения.
4. **Большой объем** конвертируемых данных.
5. **Сложность конвертации** крупнейших налогоплательщиков.
6. **Отсутствие практических навыков** у пользователей.

# Этапы внедрения функционального блока № 3 АИС «Налог-3» в промышленную эксплуатацию с 01.11.2018 по 01.04.2019



Стабилизация работы

# График внедрения в промышленную эксплуатацию на промышленных контурах СЭОД и АИС «Налог-3»

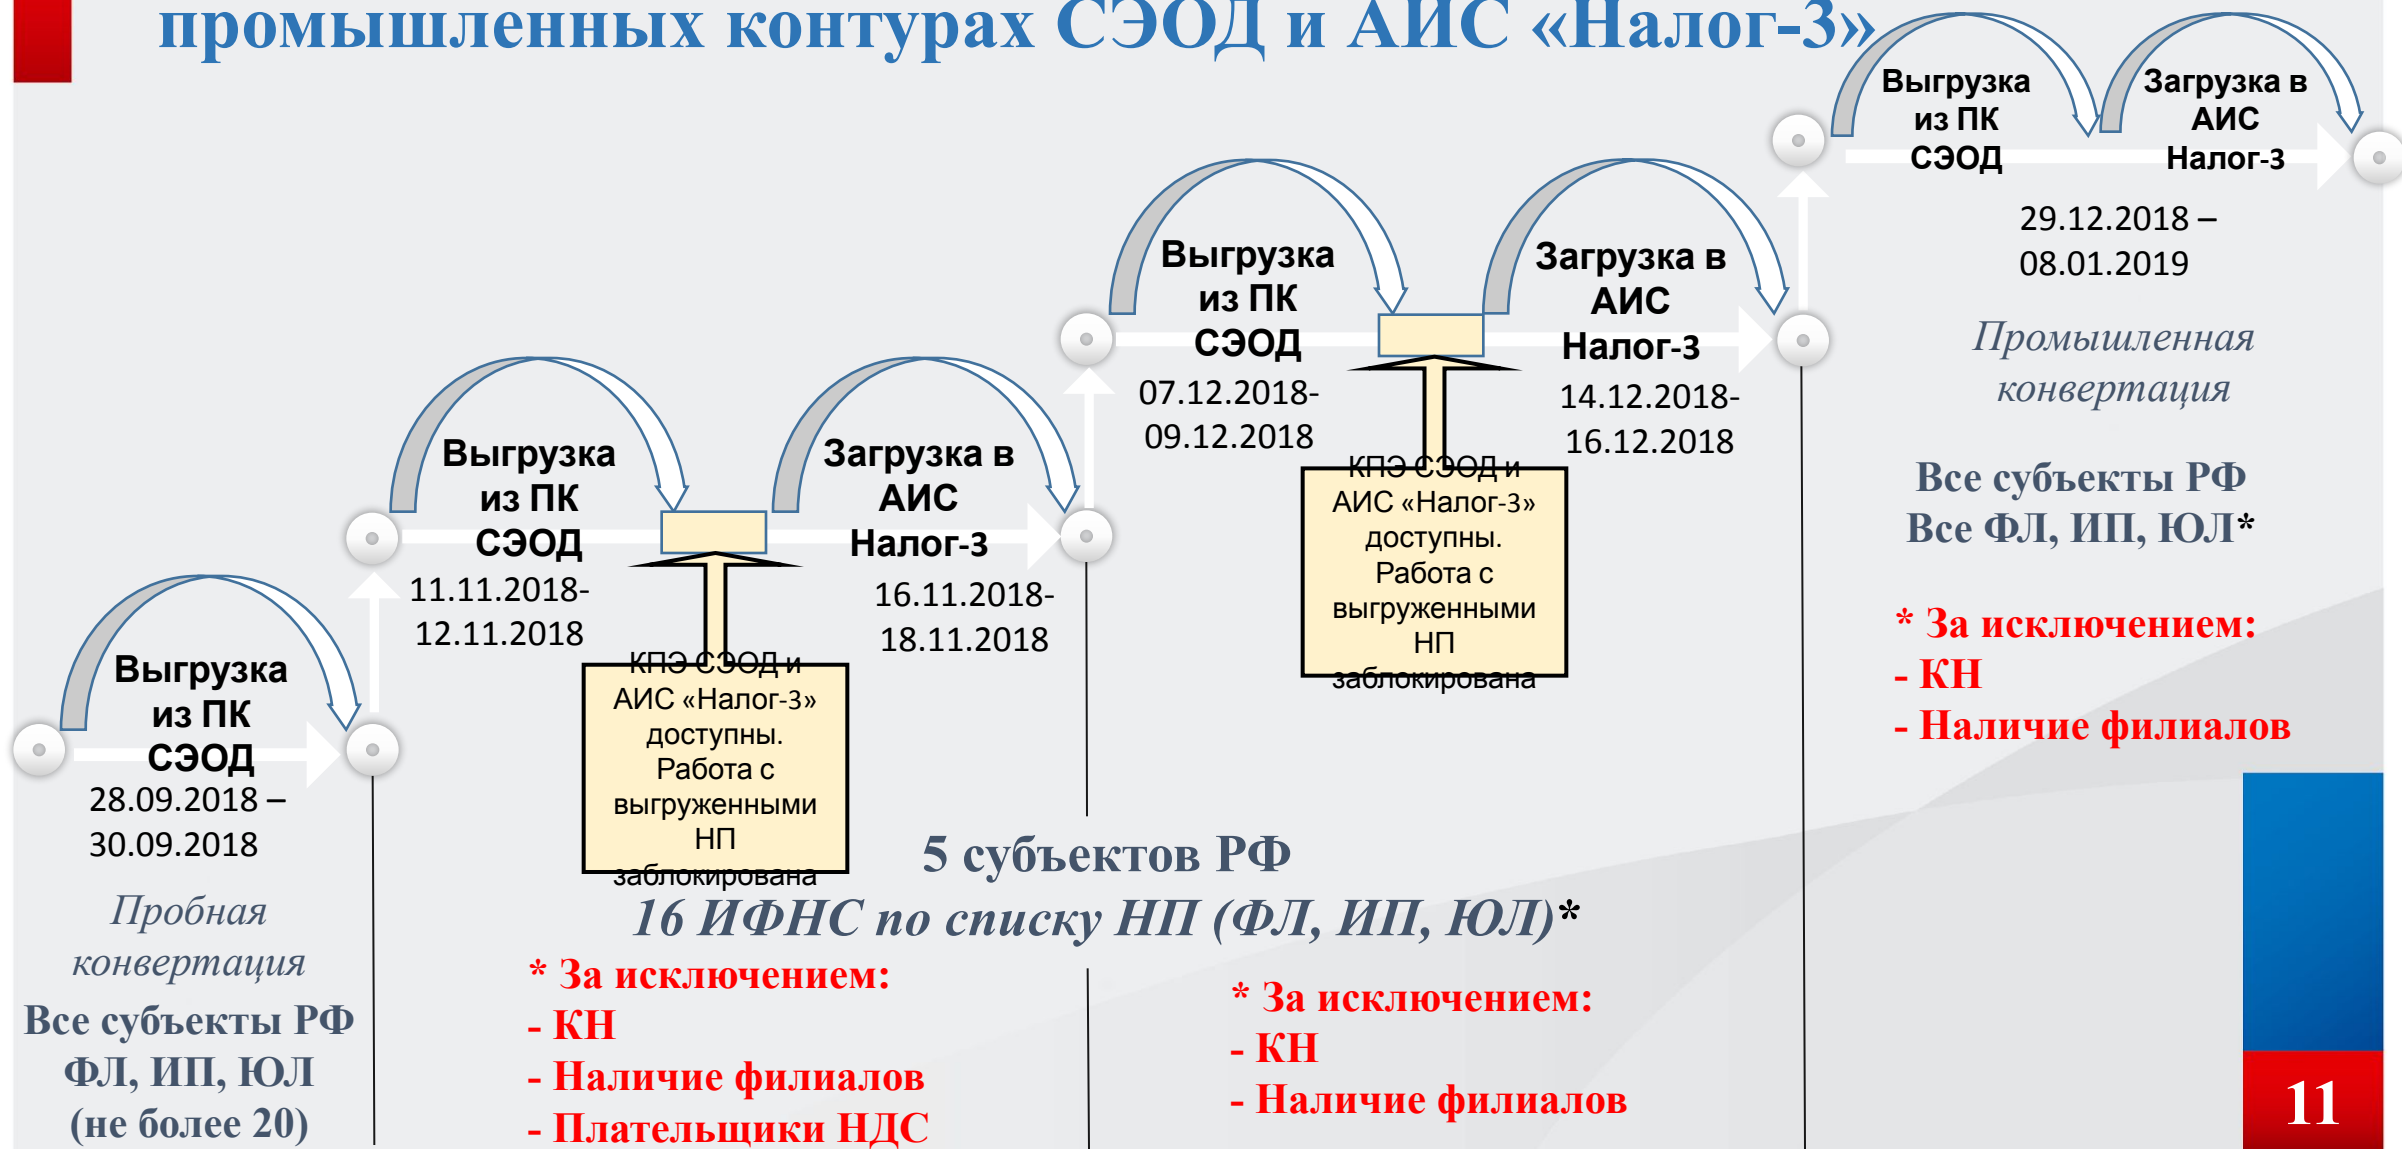

# Контроль результатов конвертации данных


1. В соответствии со сценариями проверки конвертации данных, размещенных на Интранет-портале <http://portal.tax.nalog.ru/nalog3/dir/aistest/>
2. АИС «Налог-3»: Налоговое администрирование\Подсистема конвертации\Конвертация\01. Этапы конвертации

УН этапа	ФБ	Дата начала	Дата окончания	Версия ЭОД	
104	ФБ3_СЭОД	10.11.2017	14.11.2017	2.7.150.10	Конвертация ФБ-
100	ФБ3_СЭОД	22.09.2017	02.10.2017		Пробная выгрузк
98	ФБ3_СЭОД	01.09.2017	08.09.2017		Конвертация ФБ-
97	ФБ3_СЭОД	03.08.2017	09.08.2017		Конвертация ТЦ I
96	ФБ3_СЭОД	20.07.2017	24.07.2017	2.7.130.02	ФБ3_СЭОД_47_НК
94	ФБ3_СЭОД	04.07.2017	10.07.2017		Конвертация 345

Статистика этапа (34)	
Показатель	
Количество налогоплательщиков, включенных в этап	0
Количество налогоплательщиков, в состоянии <включен в этап>	0
Количество налогоплательщиков, в состоянии <исключен в связи с ошибкой контроля>	0
Количество налогоплательщиков, в состоянии <неполный состав данных>	0

- Отчет по результатам конвертации




- Детализация ошибок конвертации по



и статпоказател



# Подготовка пользователей в 2018 году



- 3** этапа обучения
- 23** программы обучающих семинаров
- 1-5** вебинаров в семинаре
- 4** часа в день

Обучение проводится по мере готовности подсистем к работе

Направления подготовки распределены по функциональному принципу

90% программ семинаров состоит из одного вебинара

Сбалансированная дневная нагрузка на слушателя (один вебинар)

# Технологическая и проектная документация

## Инtranет-портал ФНС России

<http://portal.tax.nalog.ru/>

АИС «Налог-3»	Статистические данные	Нормативно-правовые документы	Электронная библиотека
Контактные данные координаторов и ответственных за внедрение ТП в рамках ФБ №3		Эксплуатации ФБ № 3 АИС «Налог-3»	
<b>Документы АИС «Налог-3»</b>		Регламентирующие документы	
Обучающие материалы		> Паспорта функций и типовых процедур	
Вопросы-ответы по применению программного обеспечения		Инструкции на рабочие места	
План совершенствования АИС «Налог-3»		Квартальные планы выпуска версий	
Реестр ролей и шаблонов доступа в АИС Налог-3		Концепция Автоматизированной информационной системы ФНС России - АИС «Налог-3»	
Личный кабинет		Основные группы компонентов прикладного программного обеспечения АИС «Налог-3»	
> Управление данными		Переход на единую технологию обработки документов	
Подготовка данных к конвертации в АИС «Налог-3»		ФБ АИС «Налог-3»	
Полезная информация		<b>Документация для комплексной опытной эксплуатации ФБ № 3 АИС «Налог-3»</b>	
> Статистика			

- Перечень технологических процессов
- Паспорта функций
- Инструкции на рабочие места
- Реестр ролей и шаблонов доступа
- Описания постановки задач
- Сценарии проверки
- ИР «Конвертация»
  - Организационно-распределительная документация;
  - Документация по ТП 1-й очереди;
  - Документация по ТП 2-й очереди;
  - Документация по ТП 3-й очереди;
  - Документация по ТП 4-й очереди;
  - Документация по ТП 5-й очереди;
  - ИР Конвертация

## Решения

1. **Внедряемся.**
2. **Стратегия поэтапного внедрения.**
3. **Персональная ответственность руководителей УФНС по субъектам за готовность данных в соответствии с установленными интегральными показателями, готовность плательщиков – 100% к 01.10.2018.**
4. **Персональная ответственность начальников структурных подразделений ЦА ФНС России за готовность технологических процессов, эксплуатационной документации, соблюдение сроков внедрения.**
