



**Проект: Внедрение унифицированной системы управления
ресурсами предприятия на базе
«1С ERP»**

Стартовое совещание по проекту

Москва

07.09.2022


Текущее состояние системы (as is)



- Текущий контур программных продуктов был запущен в 2010 году
- Управленческий, производственный и оперативный учет автоматизирован на конфигурации 1С:УПП
- Регламентированный, кадровый учет автоматизированы в конфигурации 1С:БП и 1С:ЗУП
- Реализовано большое количество бизнес-процессов
- Полноценно не запущена в эксплуатацию система 1С:Документооборот 8




- С 2010 года выполнено большое количество доработок. Часть доработок потеряла актуальность.
- Реализованы сложные доработки интеграционных потоков.
- Трудности электронного документооборота с Заказчиками и Поставщиками.
- В конфигурации УПП не считается корректно себестоимость. При включении аналитики Характеристика в конфигурации УПП возникает ошибка «недостаточно памяти».
- 1С объявила о прекращении поддержки 1С:УПП
- Нет единого информационного пространства:
 - Засорённость НСИ
 - Дублирование элементов Номенклатуры и Контрагентов

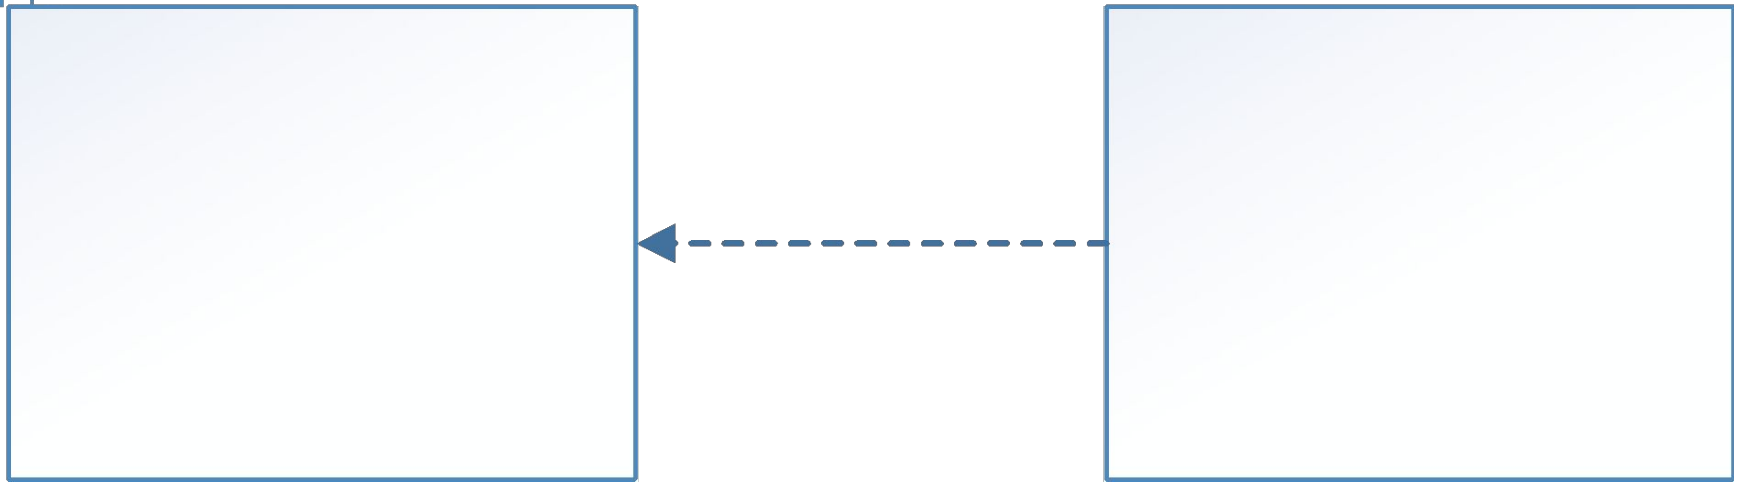


Варианты и обоснование выбора информационных систем

Отдельная база 1С:ERP для каждого ЮЛ

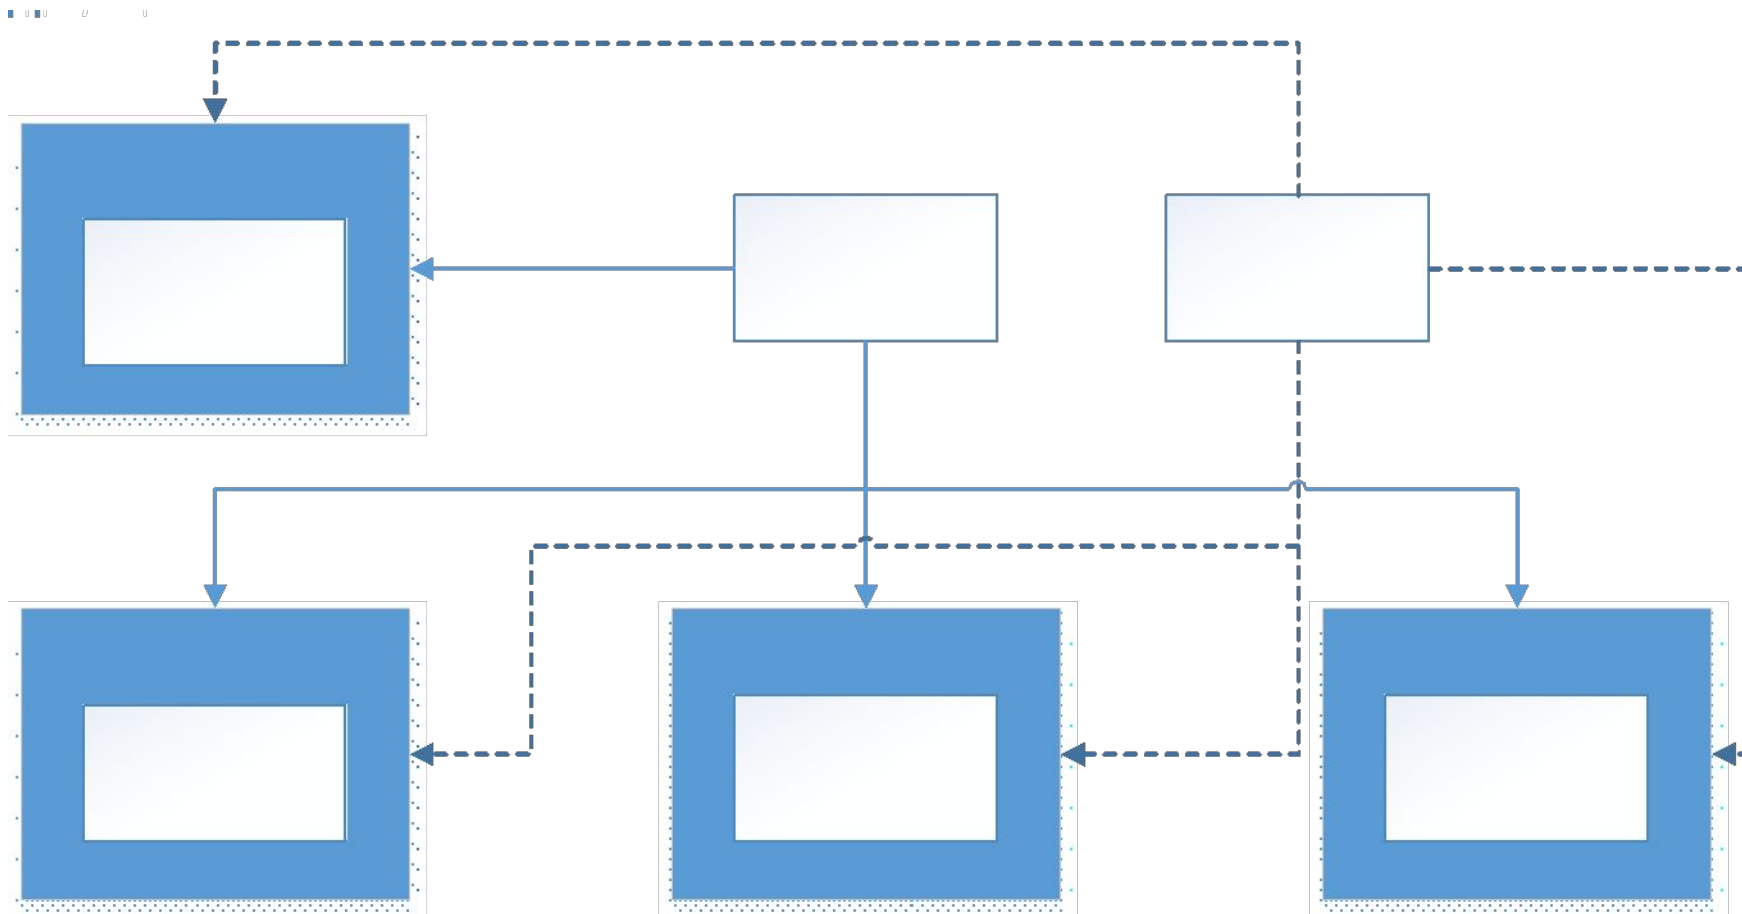

Варианты и обоснование выбора информационных систем

Разделение конфигураций по видам учета

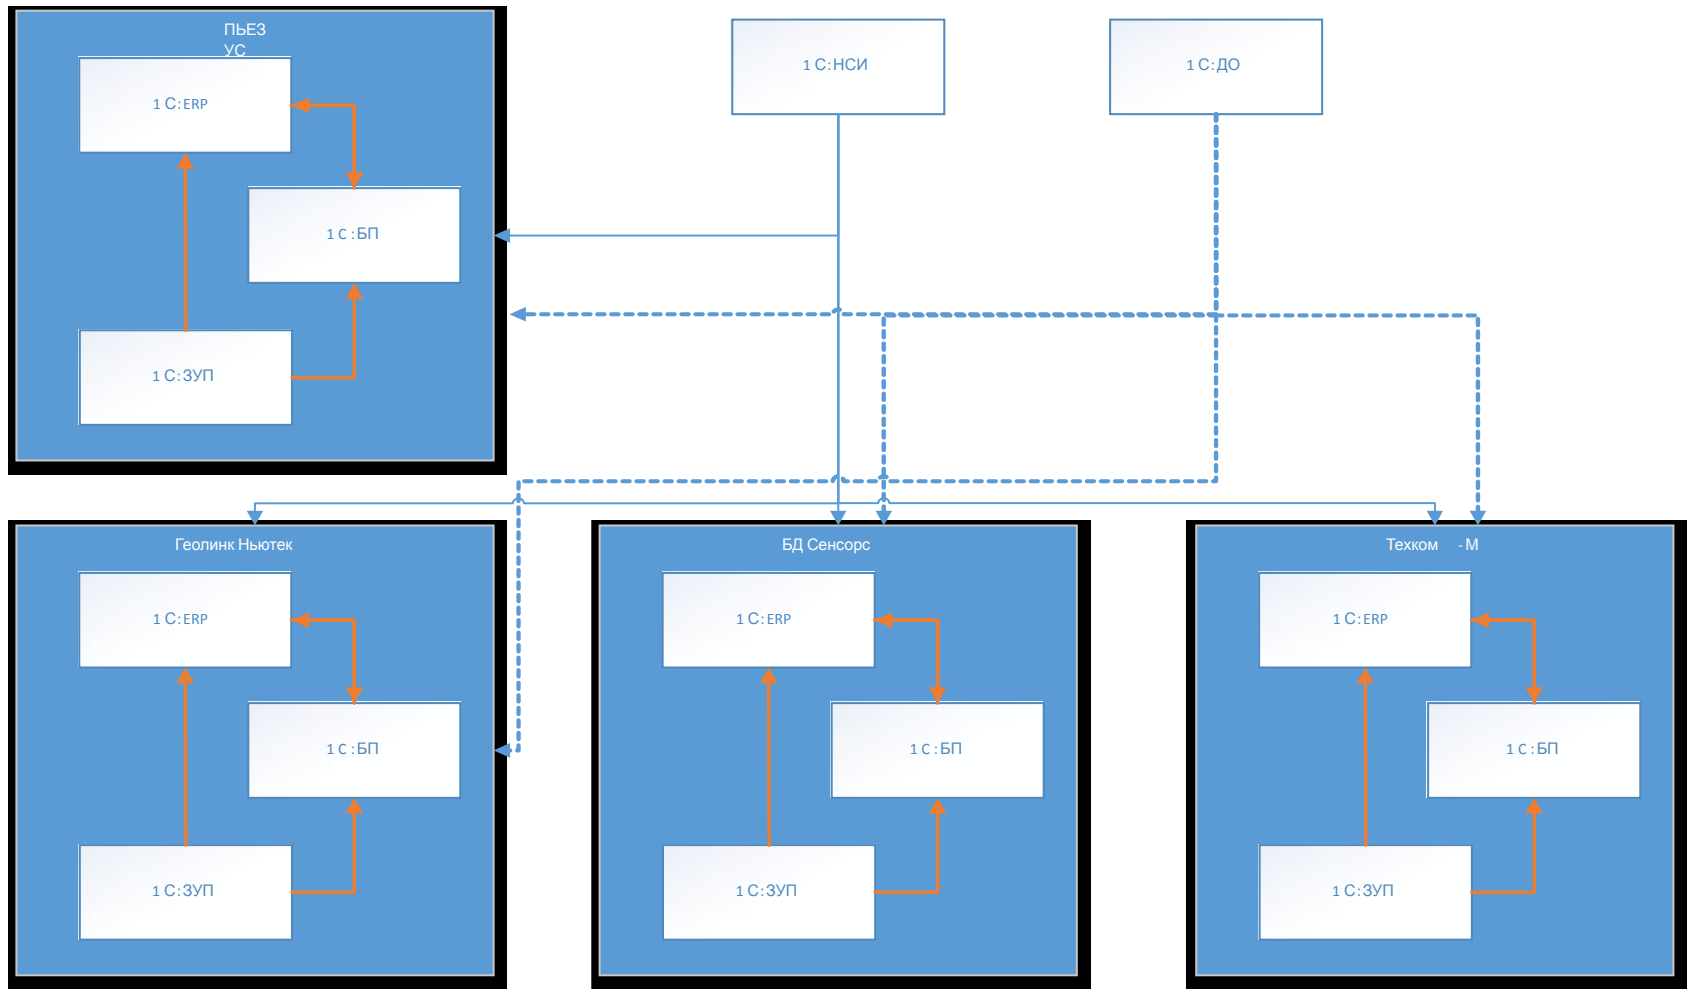

Преимущества и недостатки вариантов



- Единая конфигурация для Оперативного, Управленческого, Производственного Регламентированного учета (1С:ERP)
 - + Совпадение регламентированного и управленческого учета
 - + Уменьшение количества систем в контуре Предприятия
 - Регламентированный учет неотделим от управленческого
- Разделение конфигураций по видам учета (1С:ERP + 1С:БП + 1С:ЗУП)
 - + Упрощение регламентированного учета
 - + Доработки 1С:ERP не тормозят процессы обновления регламентированного контура (1С:БП и 1С:ЗУП)
 - /+ Раздельный учет влечет за собой различный финансовый результат
 - + Возможность ведения «управленческих» операций, которые не следует отражать в регламентированном учете
 - + При аудите нет необходимости дополнительно чистить конфигурацию
 - Сложность поддержки интеграционных механизмов

Варианты миграции данных



- Перенос исторических данных:
 - + Вся история Предприятия доступна из целевой системы. Упрощение формирования отчетности
 - Высокая трудоемкость работ
- Перенос только остатков на дату начала внедрения:
 - + Возможность убрать «мусорные данные»
 - + Значительно ниже трудозатраты на проведение миграции данных
 - Необходимо заходить в историческую систему для анализа данных за предшествующий период

Дополнительные бонусы



- Возможность рассчитать себестоимость с учетом Характеристики.
- Доступность системы по интернету (через веб клиент)
- Реализация тонкого клиента (уменьшение нагрузки на компьютеры пользователей)
- Бесшовная интеграция с 1С:Документооборотом
- Гибкие возможности планирования ресурсов и формирования бюджетных форм
- В перспективе переход на Unix платформу (Linux, PostgreSQL)
- Система 1С:ERP – флагманский продукт фирмы «1С», её поддержка будет осуществляться как минимум в течении 10-15 лет
- Продукт содержит большое количество дополнительных подсистем (модулей), которые можно будет задействовать «из коробки» при возникновении потребности в них

Этап обследования и проектирования



- Обследование
 - Проведение интервью с ключевыми пользователями системы
 - Анализ доработок исторических информационных систем
 - Реестр актуальных доработок систем
- Проектирование
 - Разработка функциональных требования к целевой системе
 - Анализ источников для миграции данных
 - Разработка технических требований к целевой системе
 - Разработка проектного решения
 - Разработка технических заданий на доработку

Сроки и оценка этапа

- Срок: 4 месяца
- Трудозатраты: 730 часов
- Стоимость: 2 190 000 руб.

Последующие этапы реализации проекта



- **Разработка**
 - Срок: 01 марта 2023 – 30 сентября 2023
 - Ориентировочная стоимость: от 5 млн руб.

- **Обучение пользователей**
 - Срок: 01 сентября 2023 – 30 сентября 2023
 - Ориентировочная стоимость: от 500 тыс. руб.

- **Проведение тестовой эксплуатации**
 - Срок: 01 октября 2023 – 31 декабря 2023
 - Ориентировочная стоимость: от 1 млн. руб.

- **Проведение опытно-промышленной эксплуатации**
 - Срок: 01 января 2024 – 31 марта 2024
 - Ориентировочная стоимость: от 1,5 млн. руб.

Почему БалансПроф?



- 12 лет плодотворного сотрудничества, всегда доводим до результата
- Отлично понимаем специфику учета и текущие проблемы
- Компетенции в 1С:ERP
- Отличное соотношение цена-качество



Спасибо за внимание!

Группа компаний «БалансПроф»

Телефон: 8 (499) 350 13 05

Телефон: 8 800 350 13 05

E-mail: info@balanceprof.ru
