Разработка ИС для администрации школы

Федотов Ф.Е.

Содержание

- 1.) Базовый календарь
- 2.) Виды работ
- 3.) График работ
- 4.) Зависимость работ
- 5.) Таблица ресурсов с назначениями

1.)Базовый календарь

- Пятидневная рабочая неделя, восьми-часовой рабочий день с 8 до 17:00 с перерывом на обед с 12 до 13
- Время проекта С 12.02.16 до 04.03.16 т.е. 17, 5 дней.

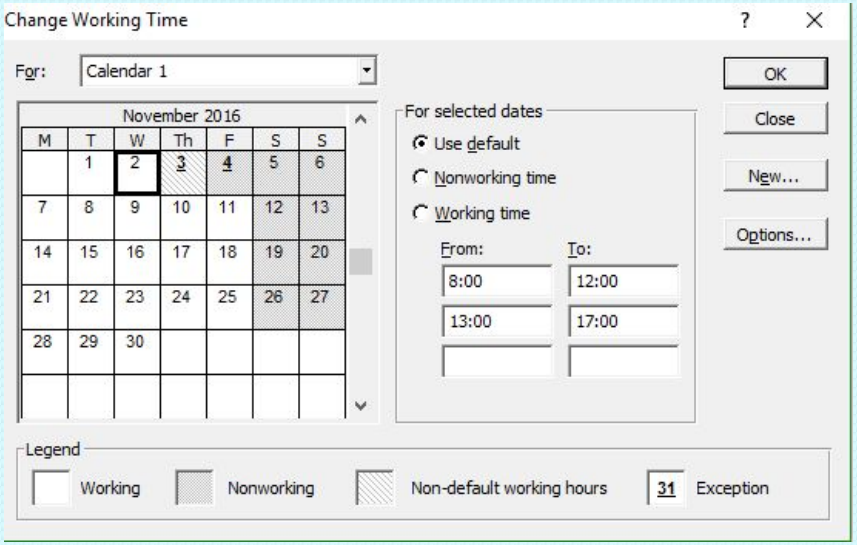

2.) Виды работ

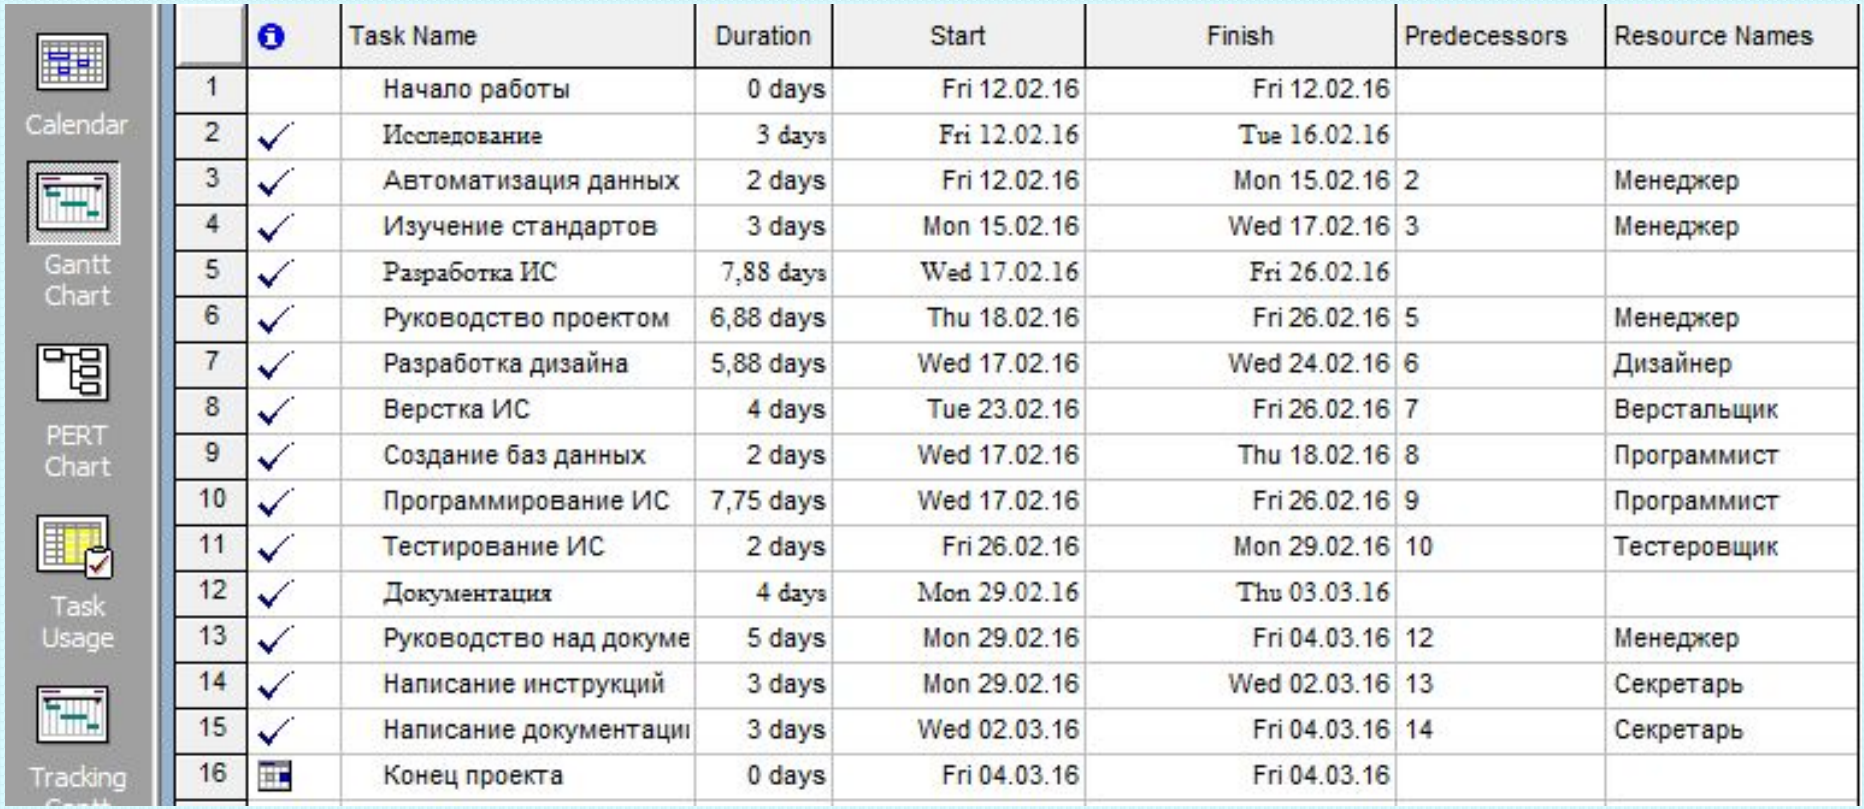

	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	Начало работы	0 days	Fri 12.02.16	Fri 12.02.16		
2	Исследование	3 days	Fri 12.02.16	Tue 16.02.16		
3	Автоматизация данных	2 days	Fri 12.02.16	Mon 15.02.16	2	Менеджер
4	Изучение стандартов	3 days	Mon 15.02.16	Wed 17.02.16	3	Менеджер
5	Разработка ИС	7,88 days	Wed 17.02.16	Fri 26.02.16		
6	Руководство проектом	6,88 days	Thu 18.02.16	Fri 26.02.16	5	Менеджер
7	Разработка дизайна	5,88 days	Wed 17.02.16	Wed 24.02.16	6	Дизайнер
8	Верстка ИС	4 days	Tue 23.02.16	Fri 26.02.16	7	Верстальщик
9	Создание баз данных	2 days	Wed 17.02.16	Thu 18.02.16	8	Программист
10	Программирование ИС	7,75 days	Wed 17.02.16	Fri 26.02.16	9	Программист
11	Тестирование ИС	2 days	Fri 26.02.16	Mon 29.02.16	10	Тестеровщик
12	Документация	4 days	Mon 29.02.16	Thu 03.03.16		
13	Руководство над докуме	5 days	Mon 29.02.16	Fri 04.03.16	12	Менеджер
14	Написание инструкций	3 days	Mon 29.02.16	Wed 02.03.16	13	Секретарь
15	Написание документаци	3 days	Wed 02.03.16	Fri 04.03.16	14	Секретарь
16	Конец проекта	0 days	Fri 04.03.16	Fri 04.03.16		

3.) График работ

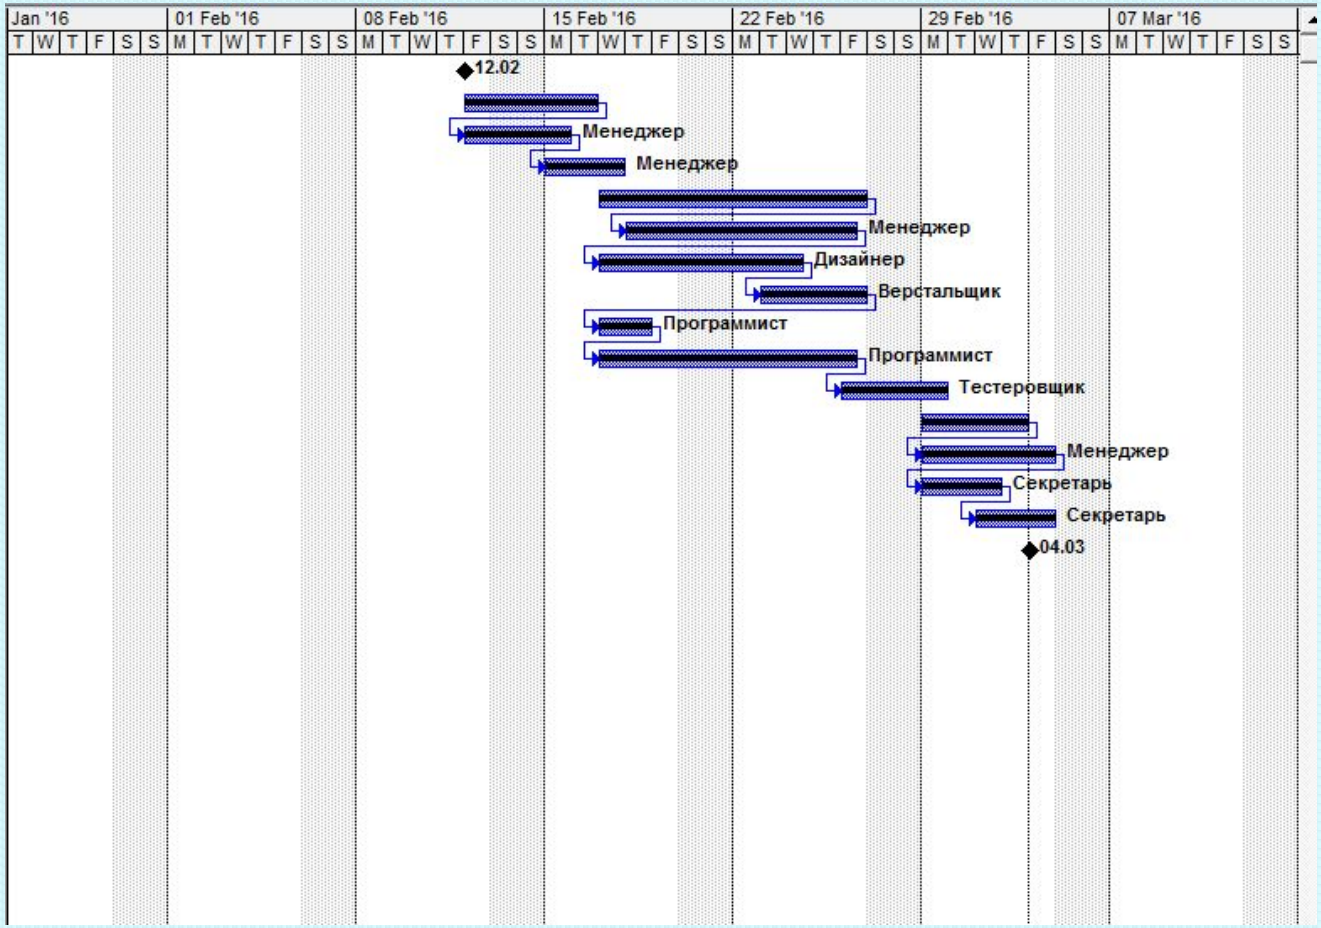

4.) Зависимость работ

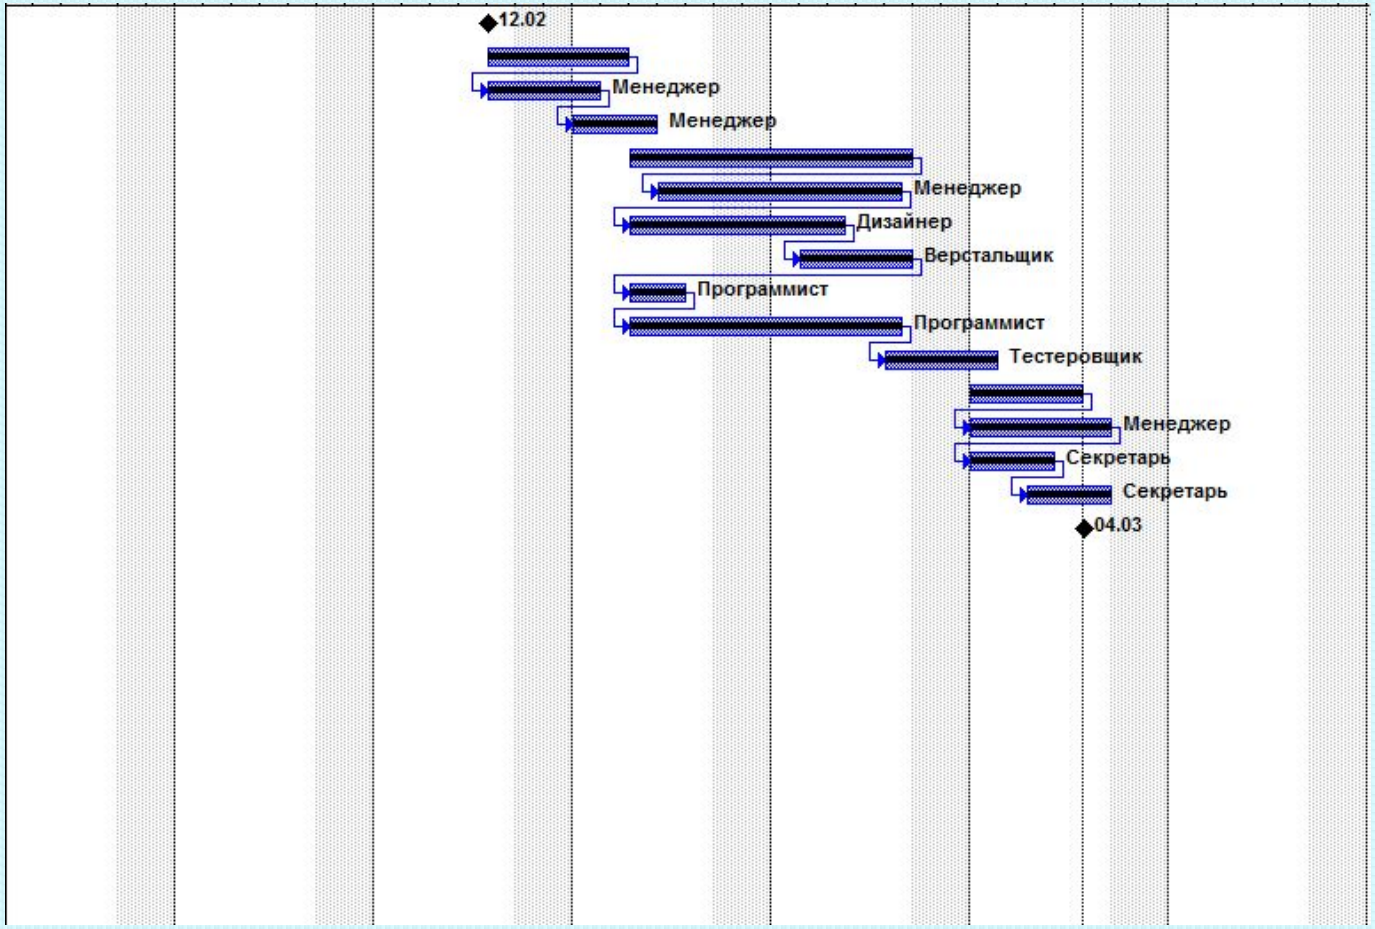

5.) Таблица ресурсов с назначениями

	Название	Работа	Продолжительность		Окон	Стоимость
1	Начало работы	0 часов	0 дней	12.02.16	12.01.2016	0 руб.
2	**(+) Исследование пре**	32 часов	3,5 дней	**12.02.16**	**17.02.2016**	11200 руб.
3	Автоматизация проект	16 часов	*2 дней*	12.02.16	16.02.2016	5600 руб.
	Менеджер	16 часов	*2 дней*	12.02.16	16.02.2016	5600 руб.
4	Изучить стандарты	16 часов	*2 дней*	15.02.16	17.02.2016	5600 руб.
	Менеджер	16 часов	*2 дней*	15.02.16	17.02.2016	5600 руб.
5	**(+) Разработка ИС**	368 часов	9,45 дней	**17.02.16**	**29.02.2016**	82640 руб.
6	Руководство проектом	56 часов	*7 дней*	17.02.16	26.02.2016	19600 руб.
	Менеджер	56 часов	*7 дней*	17.02.16	26.02.2016	19600 руб.
7	Разработка дизайна	48 часов	*6 дней*	17.02.16	25.02.2016	12000 руб.
	Дизайнер	48 часов	*6 дней*	17.02.16	25.02.2016	12000 руб.
8	Верстка ИС	24 часов	*3 дней*	23.02.16	26.02.2016	4080 руб.
	Верстальщик	24 часов	*3 дней*	23.02.16	26.02.2016	4080 руб.
9	Создание баз данных	8 часов	*1 день*	17.02.16	18.02.2016	1600 руб.
	Программист	8 часов	*1 день*	17.02.16	18.02.2016	1600 руб.
10	Программирование ИС	210 часов	*7 дней*	17.02.16	26.02.2016	44800 руб.
	Программист	210 часов	*7 дней*	17.02.16	26.02.2016	44800 руб.
11	Тестирование ИС	8 часов	*1 день*	26.02.16	29.02.2016	560 руб.
	Тестировщик	8 часов	*1 день*	26.02.16	29.02.2016	560 руб.
12	**(+) Документация**	60 часов	4,5 дней	**29.02.16**	**04.03.2016**	16320 руб.
13	Руководство над докум	28 часов	4 дней	29.02.16	04.03.2016	11200 руб.
	Менеджер	28 часов	4 дней	29.02.16	04.03.2016	11200 руб.
14	Написание инструкций	16 часов	2 дней	29.02.16	02.03.2016	2560 руб.
	Секретарь	16 часов	2 дней	29.02.16	02.03.2016	2560 руб.
15	Написание документа	16 часов	2 дней	02.03.16	04.03.2016	2560 руб.
	Секретарь	16 часов	2 дней	02.03.16	04.03.2016	2560 руб.
16	Конец проекта	0 часов	0 дней	04.03.16	04.03.2016	0 руб.
