

Участковая больница г. Иваново

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«СОЗДАНИЕ ХОСПИСА»**

**Руководитель проекта – главный врач
участковой больницы Иванов И.И.**

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Всего в области
онкологических
больных –
36 264 чел.

Ежегодно вновь
диагностировано –
6030 чел.

Из них IV стадия
заболевания –
у 19 %
больных

Из них получают
паллиативную
медицинскую
помощь в
стационаре -
7% больных

**93 % больных
в
терминально
й стадии
заболевания
находятся
дома**

**Больные в
терминальной
стадии заболевания
нуждаются в:**

- паллиативной медицинской помощи
- приеме обезболивающих (наркотических) препаратов
- химиотерапии
- лучевой терапии
- иммунотерапии
- сбалансированном питании
- комплексной социальном уходе
- психологической помощи
- удовлетворении духовных потребностей

**Семья, ухаживающая за
больным в терминальной
стадии, испытывает:**

- финансовые трудности (обеспечение больного необходимым лечением, средствами реабилитации, продуктами питания, предметами первой необходимости и личной гигиены);
- бытовые трудности (обеспечение больному необходимого ухода, организация быта семьи в целом, сохранение профессиональной активности членов семьи);
- юридические трудности (получение пособий, льгот и других форм социальной поддержки для больного, решение вопросов собственности и ее наследования в случае смерти больного).


Цель и результат проекта

1. Измеримая цель проекта:	Организовать к 1 января 2017 года предоставление хосписной помощи гражданам области размещением не менее 10 тяжелобольных граждан одновременно в условиях стационара		с
1. Способ достижения цели:	Создание хосписа проектной мощностью не менее 10 коек на базе участковой больницы г. Иваново		
1. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:	
	К 1 января 2017 года организовано оказание хосписной помощи не менее 10 тяжелобольным гражданам области	Приказ департамента здравоохранения об открытии хосписа. Утвержденный порядок организации предоставления хосписной помощи населению области.	
1. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:	
	Проведена реконструкция здания и помещений общей площадью не менее 550 кв.м.	Акт приемки-сдачи ремонтных работ	
	Оборудовано не менее 10 индивидуальных комнат для проживания пациентов	Акт приемки-сдачи работ	
	Оборудован 1 каминный зал	Фотоотчет	
	Оборудована 1 молельная комната	Фотоотчет	
	Утвержден устав хосписа	Устав	
	Создано не менее 20 новых рабочих мест	Штатное расписание	
	Организовано оказание специализированной паллиативной помощи	Приказ главного врача	
	Организовано оказание психологической помощи	Приказ главного врача	
1. Пользователи результата:	Население области		


ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Технический план здания

до реконструкции

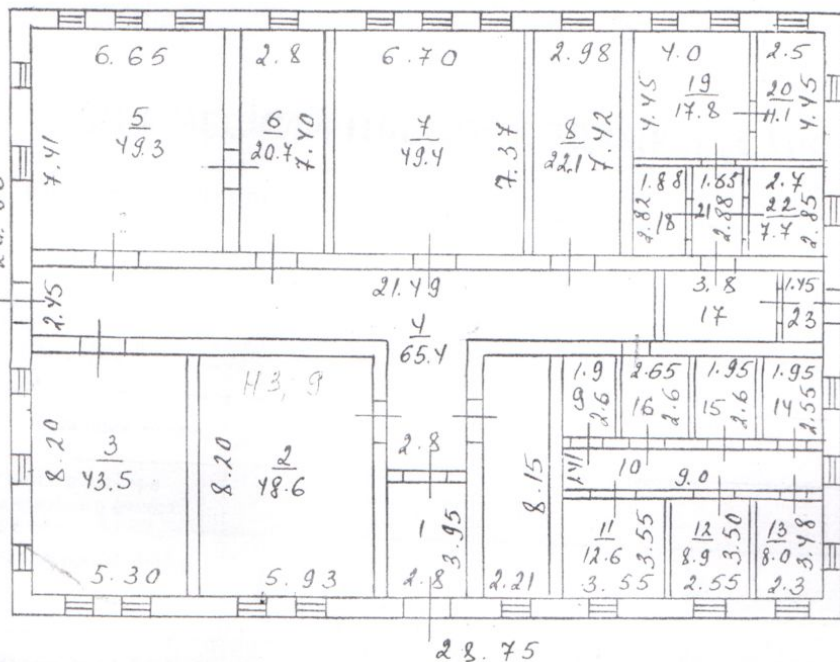

после реконструкции

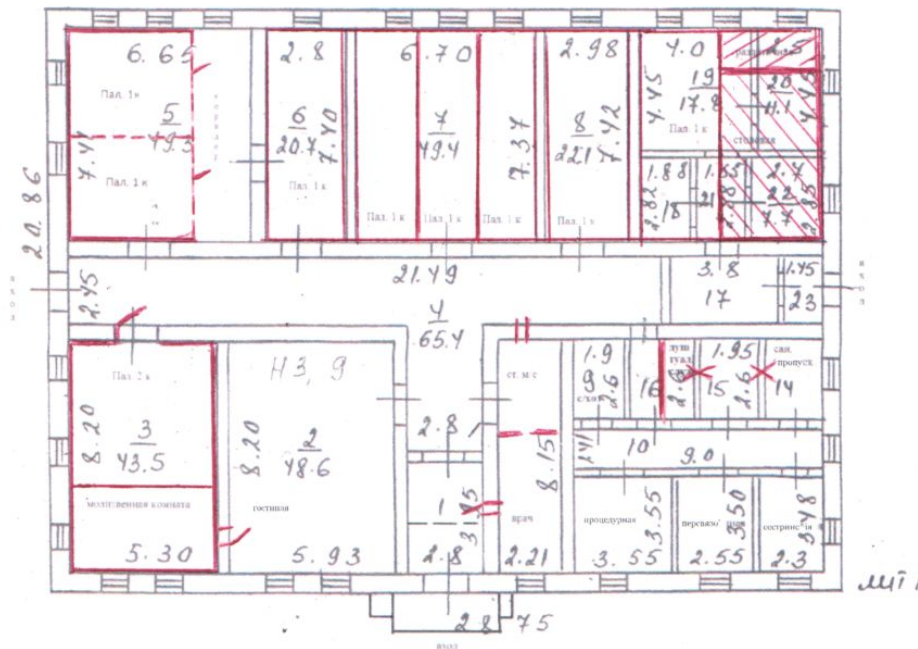

**Общая площадь
здания – 599,7 кв.м**

- жилые комнаты - 9
- столовая - 1
- каминный зал (гостиная) - 1
- молельная комната - 1
- душевая комната - 1
- ритуальная комната - 1
- кабинеты медперсонала - 5

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»

Возможность для временного пребывания родственников

Специальные кровати для пациентов



Каминный зал с библиотекой



Индивидуальные консультации психолога для пациентов и родственников



Прилегающая территория с зоной отдыха, оборудованной пандусами



Молитвенная комната



**Идеология
хосписа:**

**«Не так важно, сколько дней в твоей жизни,
важно, сколько жизни в твоих днях».**



Основные принципы работы хосписа:

Уважение пациента как личности

Открытость диагноза при условии пациента принять его

Гуманное отношение к страданиям пациентов и их родственников

Максимальное приближение условий пребывания в стационаре к домашним

Максимальное удовлетворение физических, психологических и духовных потребностей пациентов

Доступность паллиативной помощи, работа междисциплинарной команды специалистов

Предложение пациенту такой поддержки, которая позволит ему жить максимально активно до момента ухода из жизни

Основные блоки работ проекта

№	Наименование	Начало	Окончание	2018 год												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Реконструкция здания и помещений	10.01.2018	01.06.2018	■	■	■	■	■	■							
1.1	Демонтаж и монтаж внутренних стен и перегородок	10.01.2018	01.03.2018	■	■	■										
1.2	Установка внутренних сетей водопровода, канализации, отопления	10.02.2018	01.04.2018		■	■	■									
1.3	Электромонтажные работы	10.02.2018	01.04.2018		■	■	■									
1.4	Внутренняя отделка помещений	10.03.2018	01.06.2018			■	■	■								
1.5	Устройство пожарной сигнализации	10.05.2018	01.06.2018					■	■							
2.	Благоустройство территории (организация «доступной среды», установка пандусов, оборудование зоны отдыха)	10.05.2018	01.08.2018					■	■	■	■					

Бюджет проекта

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Реконструкция здания и помещений	500				500		
2.	Благоустройство территории (организация «доступной среды», установка пандусов, оборудование зоны отдыха)	300				300		
4.	Оснащение оборудованием, мебелью, медицинским расходным материалом	200				200		
7.	Обеспечение текущего финансирования учреждения (коммунальные услуги)	100				100		
Всего:		1100				1100		

Команда проекта

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1	Авилов Авил Авилович	Министр здравоохранения	Куратор проекта
2	Иванов Иван Иванович	Главный врач	Руководитель проекта
3	Петров Петр Петрович	Заместитель главного врача по медицинский части	Администратор проекта
4	Сидоров Сидор Сидорович	Заместитель главного врача по административной работе	Оператор мониторинга проекта
5	и т. д.		Ответственный за блок работ проекта
6			Член рабочей группы

Показатели эффективности проекта

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	10
1.2	Новые рабочие места	Ед.	5
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	25
1.4	Месячный ФОТ	Тыс. руб.	125
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	1,5
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника		
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки ¹⁴	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли ¹⁴	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность ¹⁴	%	
3.4	Срок окупаемости проекта * после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность	Лет	11
