

Ведение претензионной работы по контрактам, расчёт неустойки, расторжение контракта



**Батурина
Полина
Артуровна**

**Зам. начальника отдела
экспертно-аналитической
работы комитета
государственного заказа
Правительства
Хабаровского края**



Поставщик отказался от исполнения/ заключения контракта

Претензии о возмещении
причинённых убытков
(с приложением расчётов)



В случае неисполнения
требований в добровольном
порядке – обращение в суд



**+ обязательное направление
в Хабаровское УФАС России
информации для решения
вопроса о включении в РНП**



**Недостаточное финансирование
из бюджета не является
обстоятельством,
свидетельствующим об
отсутствии вины в нарушении
обязательства, и основанием
для освобождения от
ответственности**




Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063

«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»



Неустойка разделяется на пению (считается за каждый день просрочки) и штраф (фиксированная сумма)

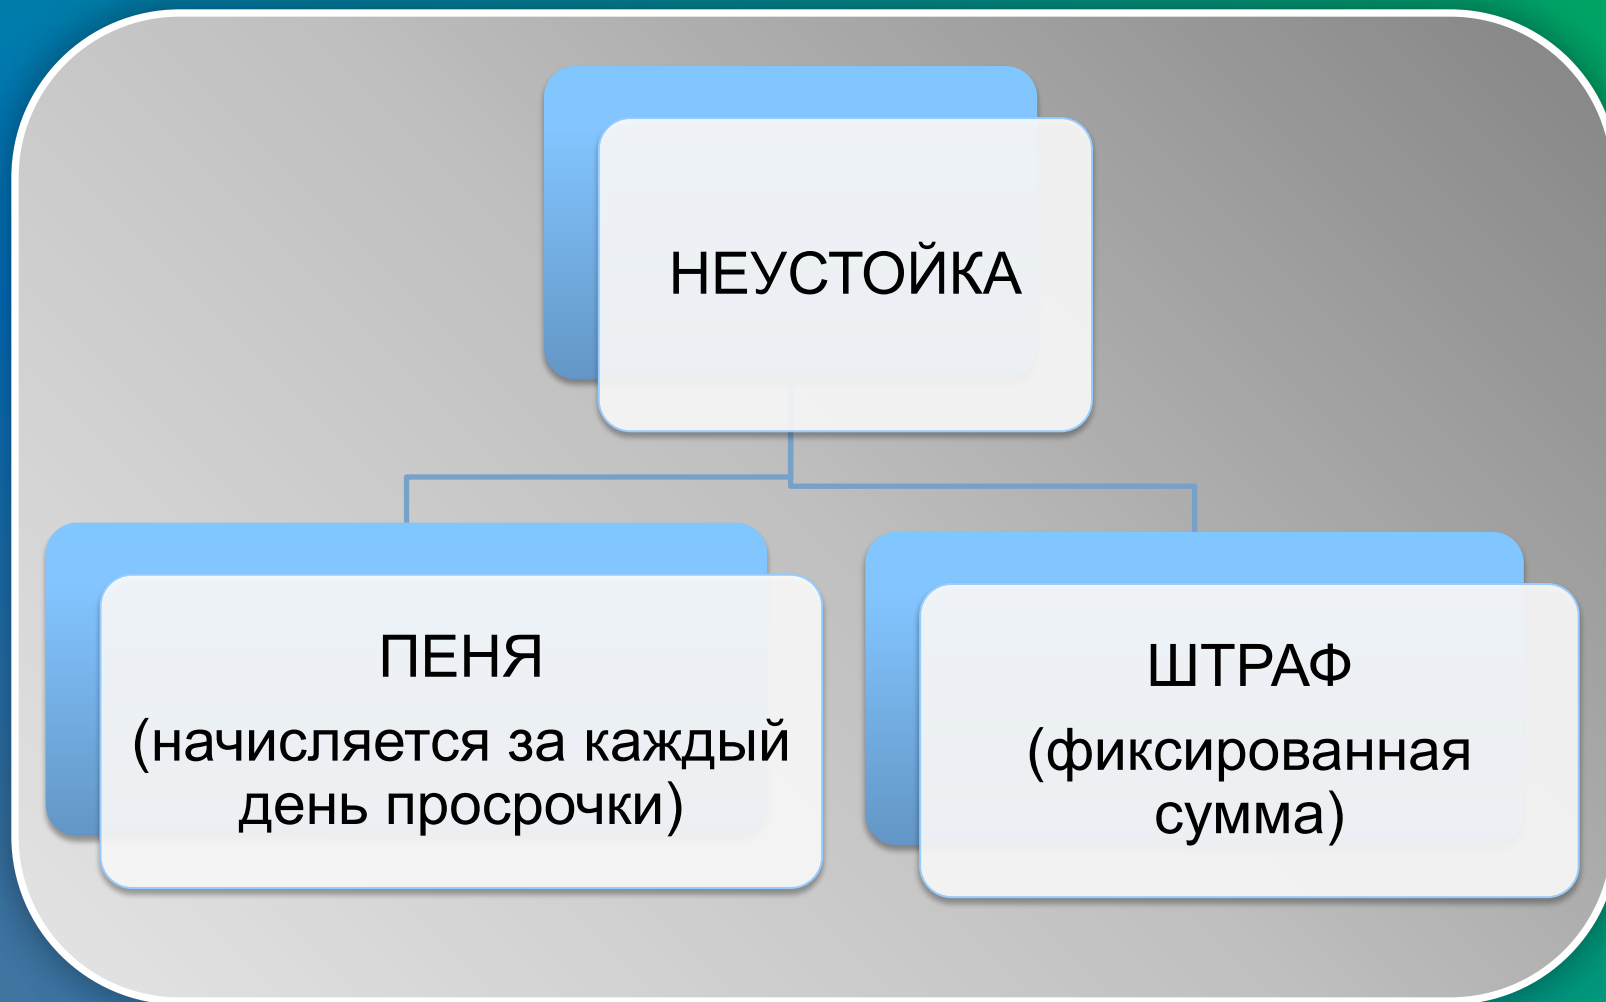

Просрочка исполнения обязательства



- нарушение должником предусмотренных законом или договором сроков исполнения обязательства (начальных и конечных, общих и частных, промежуточных, специальных и т.п.) независимо от того, каким документом эти сроки установлены



Термин "просрочка исполнения обязательства" обычно применяется к случаю выполнения обязательства по количеству с нарушением срока. В свою очередь термин "ненадлежащее исполнение обязательства" свидетельствует о нарушении качества выполнения



Термин "просрочка исполнения обязательства" обычно применяется к случаю выполнения обязательства по количеству с нарушением срока. В свою очередь термин "ненадлежащее исполнение обязательства" свидетельствует о нарушении качества выполнения



Формулировка п.5 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ и Правила определения штрафа исключают возможность привлечения к ответственности в виде штрафа в фиксированной сумме за просрочку исполнения обязательства.

У подрядчика возникло право на привлечение заказчика к ответственности за просрочку оплаты работ в виде неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.



Рассмотрим начисление пени на конкретных примерах:

С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату (с 19.09.2016 – 10 %, Информация ЦБ РФ от 16.09.2016).

1

Исходные данные:

- Цена контракта - 10 000 000 руб.
- Сумма факт. исполненных обязательств в срок - 9 000 000 руб.
- Заключение контракта - 01 марта
- Срок поставки – 30 дней

- Дата поставки по контракту – 31 марта
- Фактически поставка – 11 апреля
- Просрочка поставки – 10 дней
- Ставка рефинансирования – 10,0%

Пеня начисляется:

- $P = (10\,000\,000 - 9\,000\,000) * 1\% = 10\,000$ тыс.
- $C = 0,1\% * 10 = 1$

- $K = 10 / 30 * 100\% = 0,33$ поэтому размер ставки принимаем 0,01% от ставки рефинансирования (при K 0-50%)
- 0,01 от 10,0% = 0,1%



Исходные данные:

- Цена контракта - 100 000 руб.
- Заключение контракта – 01.02.2017
- Срок поставки – в течение 10 дней со дня заключения контракта = 11.02.2017
- Поставка товара:
 1. 09.02.2017 – на сумму 50 000 руб. (часть товара поставлена в срок);
 2. 15.02.2017 – на сумму 25 000 руб. (3 дня просрочки на сумму 50 000) отсчёт с 12.02.2017;
 3. 25.02.2017 - на сумму 25 000 руб. (10 дней просрочки на сумму 25 000) – отсчёт с 15.02.2017.

Пеня начисляется:

- Просрочки по поставке 1 части товара нет.
 - По 2 поставке: $K = 3 / 10 * 100\% = 30\%$, поэтому $K = 0,01$ (При $K 0 - 50\%$).
 - По 3 поставке $K = 10 / 10 * 100\% = 100\%$, поэтому $K = 0,03$ (При $K = 100\%$ и более).
- 0,01 от 10,00% = 0,1%
- 0,03 от 10,00% = 0,3%
- С по 2 поставке = 0,1% * 3 = 0,3%
- С по 3 поставке = 0,3% * 10 = 3%
- $P = (Ц - В) * С$
 - $P = (100\ 000 - 50\ 000) * 0,3\% = 150$
 - $P = (100\ 000 - 75\ 000) * 3\% = 750$
 - $P = 150 + 750 = 900$

Определение Верховного Суда РФ от 09.01.2017 № 309-ЭС16-17509 по делу № А76-22373/2015, Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 5467/14 по делу № А53-10062/2013, 6 ААС постановление от 20 апреля 2015 г. № 06АП-951/2015).



Начисление неустойки на общую сумму обязательства без учета надлежащего исполнения части его (поставки по накладной № от) противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному пунктом 1 статьи 1 ГК РФ, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за неисполненное в срок обязательство, но и за поставку, которая была осуществлена надлежащим образом. Между тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции.



Пример начисления штрафа по контракту

Поставщик обязан предоставить тех. паспорт совместно с товаром, но не представил

штраф начисляется:

$H(M)ЦК = 15\ 000\ 000$ руб.

5 % от цены контракта (при цене
3-50 млн. руб.) = 500 000 рублей



5 % от ЦК =

конкретный размер штрафа в контракте



Понятие "в виде фиксированной суммы" в отношении порядка установления размера штрафа не означает, что в проекте контракта следует указать конкретную сумму штрафа в денежном выражении.

Судом апелляционной инстанции верно указано, что установление заказчиком в проекте контракта размера штрафа, выраженного в конкретных процентах от цены контракта, является достаточным для целей соблюдения требования Федерального закона N 44-ФЗ, поскольку такое определение размера штрафа свидетельствует о том, что штраф установлен в виде фиксированной суммы, так как позволяет сторонам контракта однозначно определить сумму такого штрафа путем умножения цены контракта на установленный процент (напр. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.03.2015 № Ф09-733/15 по делу № А71-6214/2014).



Размер неустойки по контрактам на оказание услуг газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, услуг по передаче электрической энергии.

Энергоснабжение

Газоснабжение

Теплоснабжение

Водоснабжение и водоотведение

Размер неустойки составляет $1/130$ (а не $1/300$) ставки рефинансирования ЦБ РФ



Расторжение контракта (ч.8 ст.95).



Одностороннее расторжение контракта

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Существенные нарушения договора поставки



Поставщиком (п.2 ст. 253 ГК РФ)

- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
- Неоднократное нарушение сроков поставки товаров.

Покупателем (п.3 ст. 253 ГК РФ)


- Неоднократное нарушение сроков оплаты товаров;
- Неоднократной невыборки товаров.



Механизм одностороннего расторжения контракта

Шаг 1:

Уведомление размещается в ЕИС (не позднее 3 рабочих дней с даты принятия)

ИНФОРМАЦИЯ О КонтРАКТЕ	ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЖАХ И ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ (РАСТОРЖЕНИИ) КонтРАКТА	ДокуМЕНТЫ	ЖурНАЛ СобыТИЙ
ИНФОРМАЦИЯ О КонтРАКТЕ № 0117300025514000027				
 ISS Размещено 14.07.2014 16:16 (MSK+3 (UTC+7) Новосибирск) По местному времени заказчика				
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
Реестровый номер контракта	01173000255 14 000027			
Статус контракта	Исполнение прекращено			
Номер извещения об осуществлении закупки	0317300301914000735			
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Электронный аукцион			
Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	23.05.2014			
Дата размещения (по местному времени)	14.07.2014 16:16 (МСК+3)			
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта	Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от 23.05.2014 №0317300301914000735			
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КонтРАКТА				
Причина изменения условий контракта				
Реквизиты документа, являющегося основанием изменения условий контракта	Уведомление об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 11.07.2014 №07-20/853			
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ				
Полное наименование заказчика	администрация Ленинского района города Барнаула			
Сокращенное наименование заказчика	АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА			
Дата постановки на учет в налоговом органе	21.02.1994			
ИНН	2223011842			
КПП	222301001			
Код организационно-правовой формы	75404			
Код ОКПО	04018474			



 [Отобразить недействующие редакции документов](#)

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАКТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНТРАКТА



Информация об изменении
контракта №01173000255 14 000027
от 14.07.2014

Размещено
Действующая редакция

14.07.2014 13:16



[Контракт-площадь
Мира](#)



[Смета-Гранд Строй](#)



[Решение заказчика
об одностороннем
отказе от
исполнения
контракта от
03.06.2014
№2014 116001-лист1](#)



[Решение заказчика
об одностороннем
отказе от
исполнения
контракта от
03.06.2014
№2014 116001-лист2](#)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ (О РАСТОРЖЕНИИ) КОНТРАКТА



Информация о расторжении
контракта №01173000255 14 000027
от 25.08.2014

Размещено Август 2014
Действующая редакция

25.08.2014 17:50



[Решение заказчика
об одностороннем
отказе от
исполнения
контракта от
03.06.2014
№2014 116001-лист2](#)



[Решение заказчика
об одностороннем
отказе от
исполнения
контракта от
03.06.2014
№2014 116001-лист1](#)

Август 2014

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ

Отсутствуют записи о документах



Шаг 2:

- Направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
(не позднее 3 рабочих дней с даты принятия)

Шаг 3:

- Направляется поставщику телеграммой либо факсимильной связью, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки
(не позднее 3 рабочих дней с даты принятия)

Одностороннее расторжение контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика.



Шаг 4:

В ЕИС размещается информация о расторжении контракта:

а) в течение одного рабочего дня (ч.26 ст.95) + письмо Казначейства России от 10.03.2015 № 05-07-05/11

б) в течение трех рабочих дней (ч.3 ст.103)



ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАКТЕ № 0117300025514000027

ISS ?

Размещено 14.07.2014 16:16 (MSK+3 (UTC+7) Новосибирск)
По местному времени заказчика

ИНФОРМАЦИЯ О
КОНТРАКТЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЖАХ
И ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
(РАСТОРЖЕНИИ) КОНТРАКТА

ДОКУМЕНТЫ

ЖУРНАЛ
СОБЫТИЙ

Цена контракта **3 842 500,00** в российских рублях

Фактически оплачено **0,00** в российских рублях

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

Фактически оплачено заказчиком (в российских рублях)	0,00
Основание расторжения контракта	Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
Документ, являющийся основанием расторжения контракта	№ от
Дата вступления в силу решения суда/ дата уведомления поставщика, уведомления заказчика	
Дата расторжения контракта	23.08.2014
Причина расторжения контракта	Уведомление от 11.07.2014 №07-20/853 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 03.06.2014 №2014.116001





ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАКТЕ № 0117300025514000027

ISS ?

Размещено 14.07.2014 16:16 (MSK+3 (UTC+7) Новосибирск)
По местному времени заказчика

ИНФОРМАЦИЯ О
КОНТРАКТЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЖАХ
И ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
(РАСТОРЖЕНИИ) КОНТРАКТА

ДОКУМЕНТЫ

ЖУРНАЛ
СОБЫТИЙ

[Отобразить недействующие редакции документов](#)

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАКТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНТРАКТА

	Информация об изменении контракта №01173000255 14 000027 от 14.07.2014	Размещено Действующая редакция	14.07.2014 13:16		Контракт-площадь Мира
					Смета-Гранд Строй
					Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 03.06.2014 №2014.116001-лист1
					Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 03.06.2014 №2014.116001-лист2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ (О РАСТОРЖЕНИИ) КОНТРАКТА

	Информация о расторжении контракта №01173000255 14 000027 от 25.08.2014 Август 2014	Размещено Август 2014 Действующая редакция	25.08.2014 17:50		Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 03.06.2014 №2014.116001-лист2
					Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 03.06.2014





Официальный сайт

ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

ЗАКАЗЧИКАМ ПОСТАВЩИКАМ

24

Служба поддержки

8 495 811-03-33 8 800 333-81-11

Обратная связь Вопросы и ответы

Ваш субъект РФ

Хабаровский край

Сменить



Личный кабинет

ПОИСК

0117300025514000027

С учетом всех форм слов Строгое соответствие

ЗАКУПКИ

КОНТРАКТЫ

ДОГОВОРЫ

ПЛАНЫ ЗАКУПОК (44-ФЗ)

ПЛАНЫ-ГРАФИКИ ЗАКУПОК (44-ФЗ) ПЛАНЫ ЗАКУПОК (223-ФЗ)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКУПОК

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ

Установленные параметры

Уточнить параметры поиска

Расширенный поиск

Свернуть фильтр

Закон: № 44-ФЗ

Цена контракта, в рублях: от 0 до 200 000 000 000

Сортировать по: Дате обновления Дате размещения Цене Релевантности

Показывать по: 10

Всего записей: 1



ISS

Исполнение прекращено

3 842 500,00 Российский рубль

№ 0117300025514000027

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА БАРНАУЛА

Размещено: 03.06.2014 Обновлено: 25.08.2014

Контракт: № 2014.116001 от 03.06.2014

Идентификационный код закупки(ИКЗ):

Реквизиты заказа: Электронный аукцион №0317300301914000735

Срок исполнения: август 2014

Карточка контракта / Документы / Сведения закупки / Сведения о заказчике



КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Одностороннее расторжение контракта

Одностороннее
расторжение
контракта





Сайт комитета: **gz.khabkrai.ru**
Телефон: **(4212) 402-102**

