



# Коммерческое предложение по строительству стандартных деревянных домиков для отдыха

NOVAстрой

Проект 2010 г.



ЦЕЛЬ: Подписание контракта на строительство стандартных деревянных домиков для отдыха


ЗАДАЧА: Разработка календарного плана строительства при максимально сниженной цене

УСЛОВИЯ:

1. Длительность строительства – не более 6 недель (30 рабочих дней)
2. Бюджет первых трех недель – 8000 у.е.



# Диаграмма Ганта

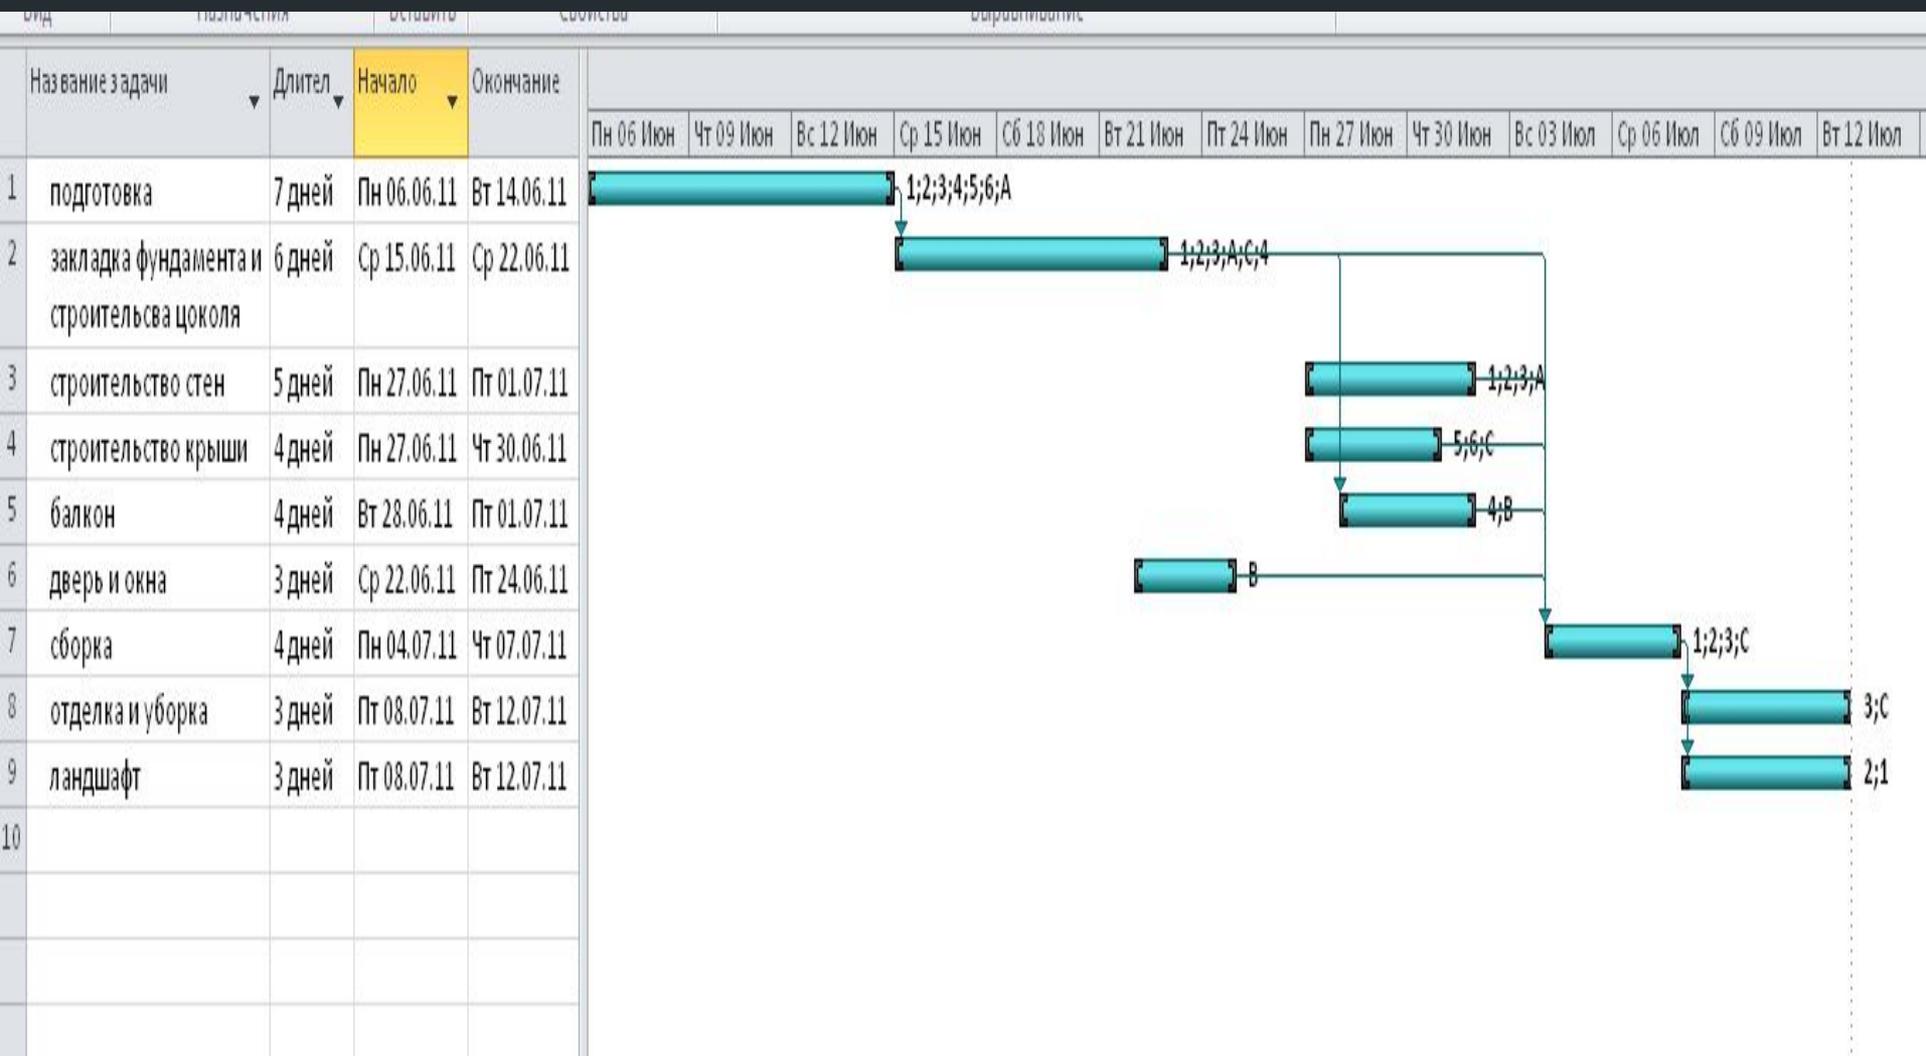

# Прайс - лист материалов

Наименование	Кол-во	Поставщик 1	Поставщик 2
Большие бревна	10	200	180
Маленькие бревна	10	100	90
Гвозди	50	25	20
Болты	10	40	35
Гравий	1	50	40

# Затраты


## Стоимость материалов

Этапы строительства	Цена
фундамент	2390
стены	1535
крыша	1195
балкон	505
дверь	220
сборка	255
ландшафт	980
<b>ИТОГО</b>	<b>7080</b>

## Оплата труда работников

Работник	Кол-во, чел/нед.	Оклад, у.е.	Сумма
Квалифицированный (4-6 нед)	8	200	1600
Квалифицированный	2	240	480
Неквалифицированный	28	120	3360
		Итого:	5440

# Резюме



## Инвестиции в первые три недели:

1. Зарплата работникам – 3160 у.е.
2. Материалы – 2610 у.е.

ИТОГО: 5770 у.е.

Сроки реализации проекта: 27 дней

Полная стоимость проекта:

15650 у.е.



# Спасибо за внимание

Докладчик: Председатель Совета директоров  
группы компаний NOVAстрой  
Коблова Елена Геннадьевна
